

RONDA DE DALT

TRAM 1. FASE 2




Juny 2025



ACTUACIONS A LA RONDA DE DALT DE BARCELONA

ACTUACIÓ: Cobertura i urbanització de la Ronda de Dalt

TRAM 1: AV. VALLCARCA – AV. JORDÀ

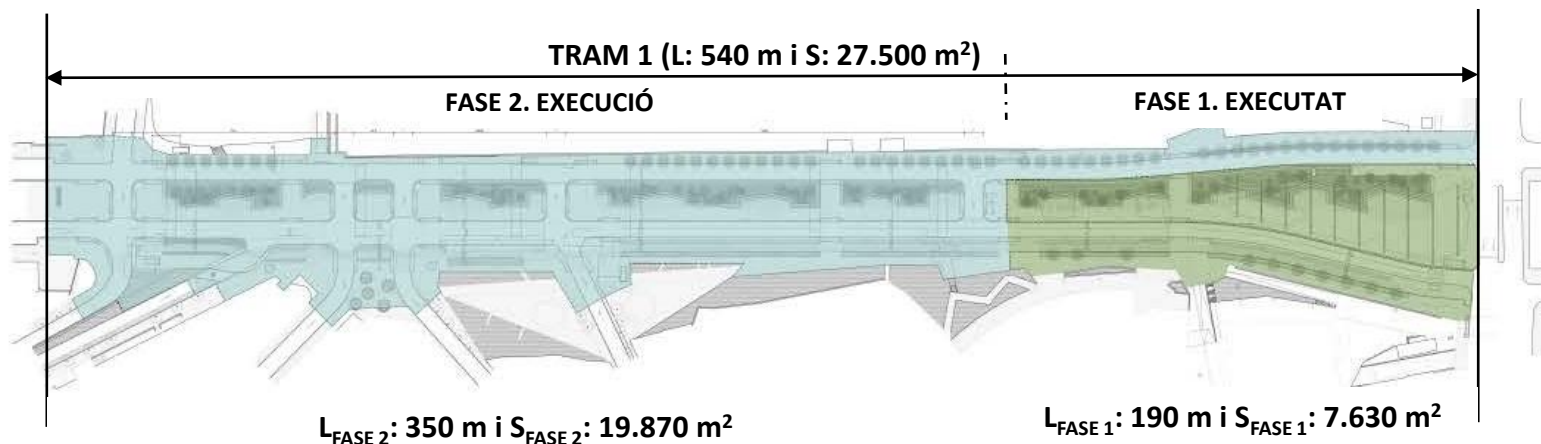

FASE 2

3 “OBRES” DIFERENCIADES:

- ESTRUCTURA MUR I SORTIDES EMERGÈNCIA. **OBRES**
- COBERTURA I INSTAL·LACIONS. **EN PROCÉS D'ADJUDICACIÓ.**

INICI PREVIST TARDOR 2025.

- URBANITZACIÓ. PROJECTE EN REDACCIÓ

FASE 1

OBRA DE COBERTURA FINALITZADA (INV. 12,04M€)

OBRA D'URBANITZACIÓ FINALITZADA (INV. 5,28M€)

LONGITUD ≈ 190 M

INVERSIÓ REALITZADA: 17,32 M€



➤ **PRESSUPOSTOS:**

- **PCA : 11.331.091,09 €**
INCLOU SERVEIS ADDICIONALS DE:
 - **AUSCULTACIÓ**
 - **CONTROL QUALITAT**
 - **DESVIAMENT SERVEIS AFECTATS COMPANYIES**

➤ **TERMINI D'EXECUCIÓ OBRES FASE 2A: 21 MESOS**

- **DATA INICI: JUNY 2024**
- **DATA FINALITZACIÓ : MARÇ 2026**

➤ **AGENTS:**


- **GESTOR: BIMSA**
- **DIRECCIÓ D'OBRA : MASTERPLAN**
- **CONTRACTISTA: UTE MJ GRUAS – CONTRATAS VILOR**

➤ **SINGULARITATS:**

- **GRAN QUANTITAT DE SSAA:** AGBAR, NEDGIA, ENDESA, TELEFÓNICA, JAZZTEL, TELECOMUNICACIONS (CMC I IMI), XARXA ITS MOBILITAT, ENLLUMENAT, SEMAFORITZACIÓ, CLAVEGUERAM,....
- **REQUERIMENTS:** AUTORITZACIÓ DGIM (L3 METRO) I SEGUIMENT ADCOGASE (GALERIA)
- **IMPORTANT AFECCIÓ MOBILITAT TRONC CENTRAL RONDA:** TALLS CARRILS ESQUERRES PER CONSTRUCCIÓ MUR, CARRILS DRETS PER EMBOCAMENT SORTIDES EMERGÈNCIA. ALS ESTIUS.
- **TREBALLS NOCTURNS TRONC CENTRAL:** ACTIVITATS MENYS SOROLLOSES
- **TALL TOTAL DE LA RONDA NITS PUNTUALS**

 SORTIDES QUE NO ES CONSTRUIRAN EN AQUESTA FASE, PER IMPOSSIBILITAT DE DESVIAMENT DE SERVEIS.

 SORTIDES EN EXECUCIÓ. FINALITZACIÓ ESTIU '25

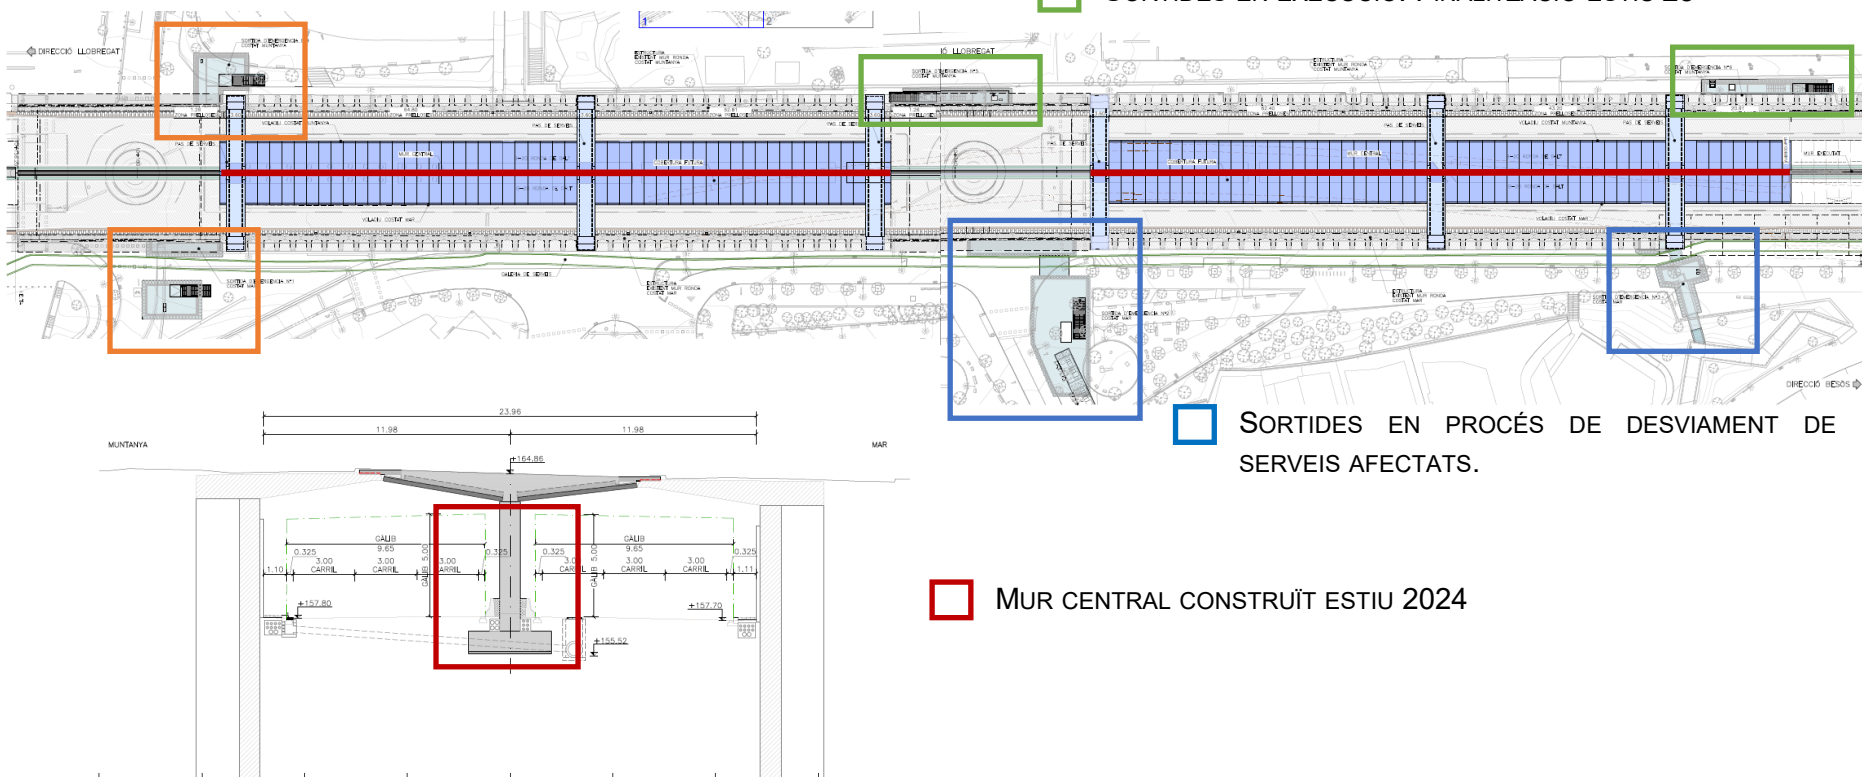

 SORTIDES EN PROCÉS DE DESVIAMENT DE SERVEIS AFECTATS.



 MUR CENTRAL CONSTRUÏT ESTIU 2024

ACTUACIÓ ESTIU '25 - TRONC

QUE FAREM: TALLS CARRIL DRETS TRONCALS D'AMBDÓS SENTITS. ENTRE SORTIDES 5 I 6.


QUAN HO FAREM: DEL 14/07 AL 04/09.

PERQUÈ HO FAREM: PER CONSTRUIR ELS PRISMES DE SERVEIS, LES NOVES VORERES I REALITZAR LES PORTES DE LES SORTIDES D'EMERGÈNCIA

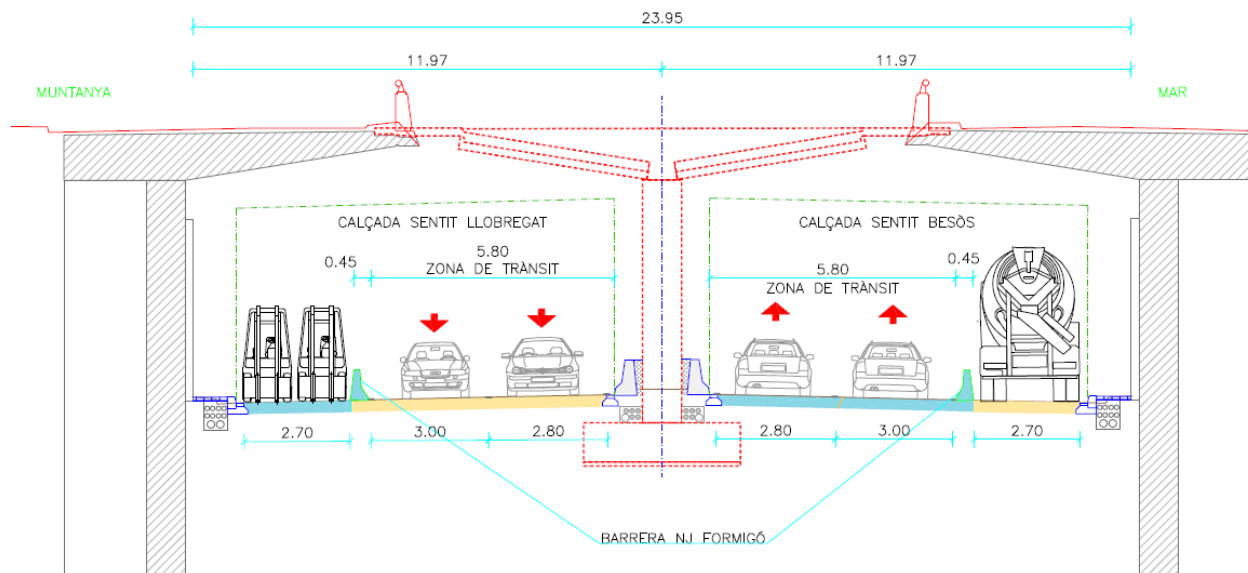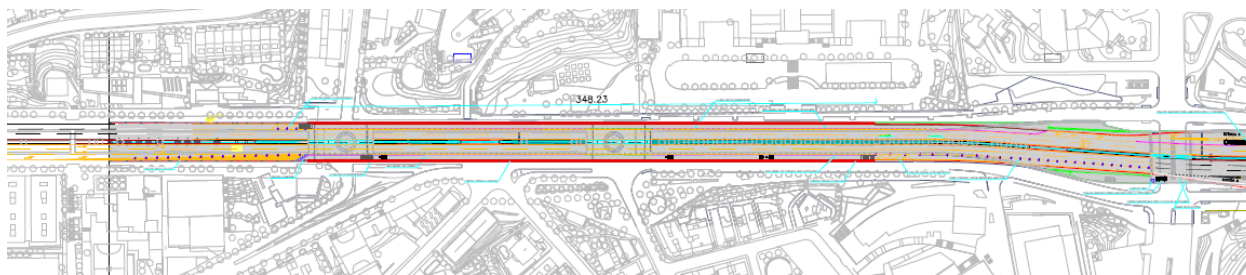


ACTUACIÓ ESTIU '25 - LATERALS


- PER MILLORAR EL TRÀNSIT EN ELS LATERALS SUPERIORS, ES RESTABLIRAN ELS 2 CARRILS LATERAL MUNTANYA
- ES RESTABLIRÀ LA VORERA DEL COSTAT MUNTANYA
- ES REOBRIRÀ LA ROTONDA DEL C/ARENYS, ACTUALMENT TANCADA.

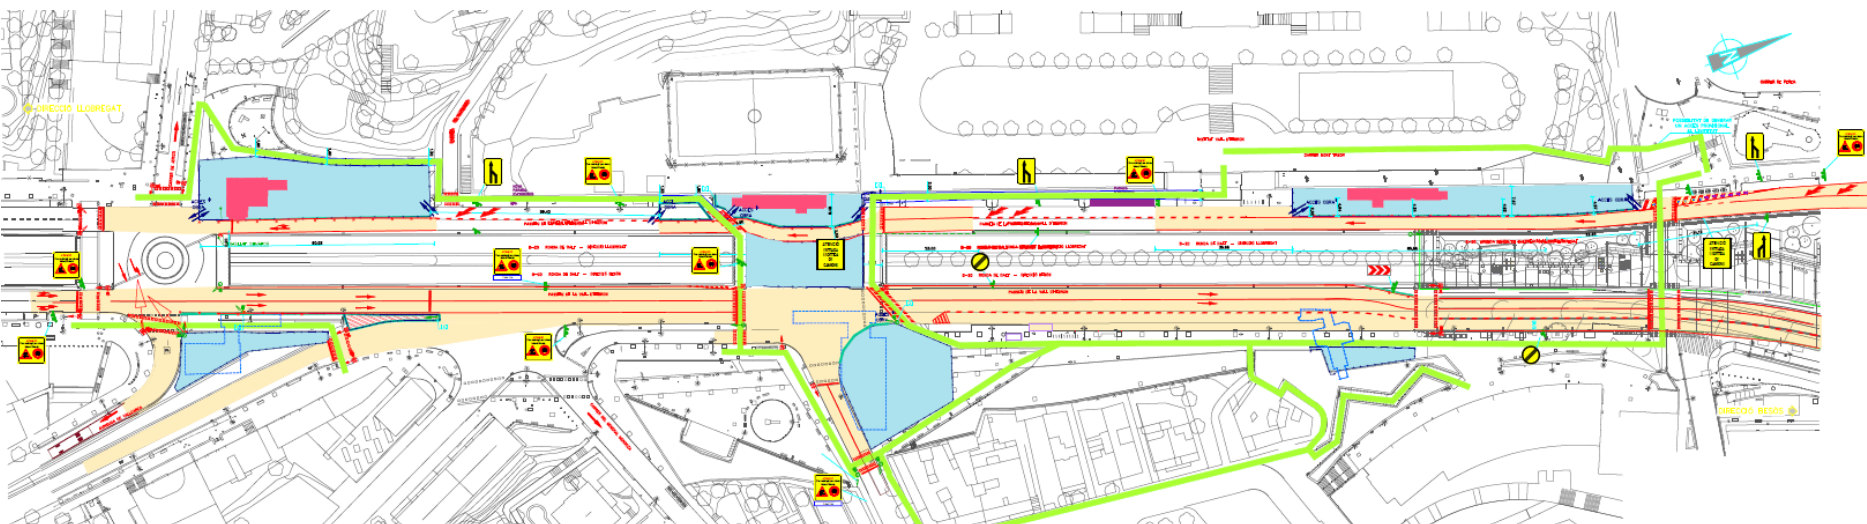

SORTIDES EMERGÈNCIA COSTAT MAR. FINS MARÇ 2026

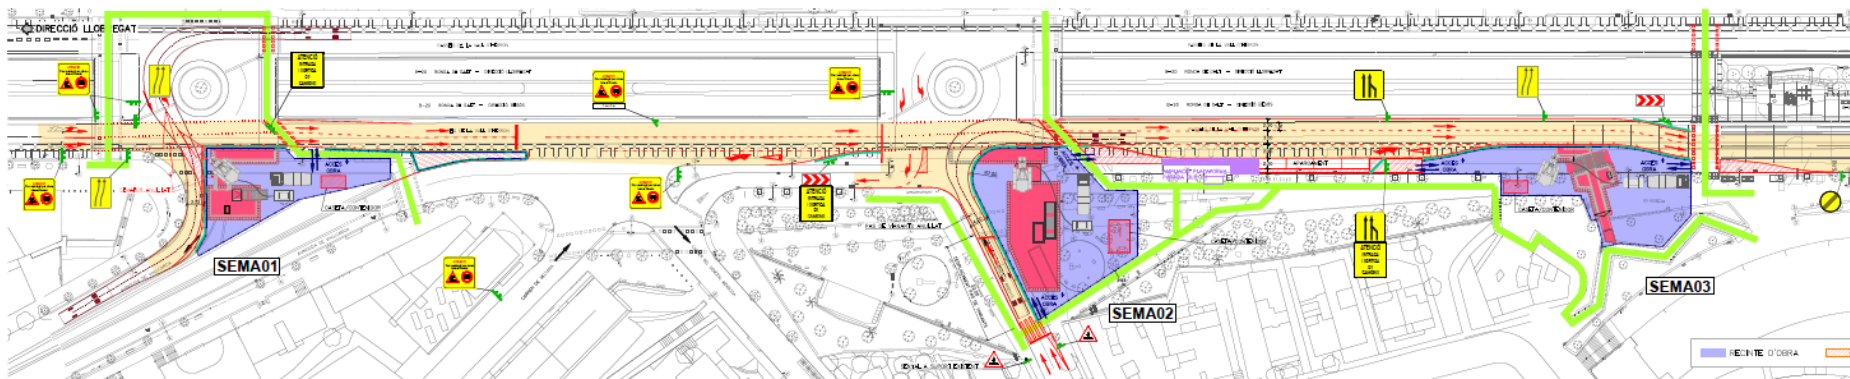

SECCIÓ TRANSVERSAL REPRESENTATIVA

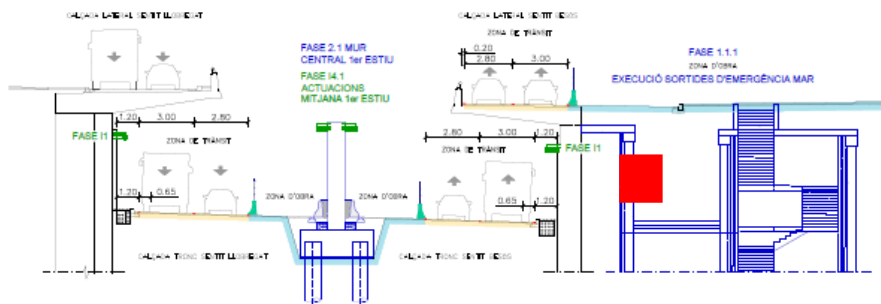

COM HO FAREM?



DESVIAMENTS TRANSIT I VIANANTS.

DESVIAMENTS SERVEIS.

PANTALLES I PILOTS


EXCAVACIÓ RECINTE

ESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS INTERIORS

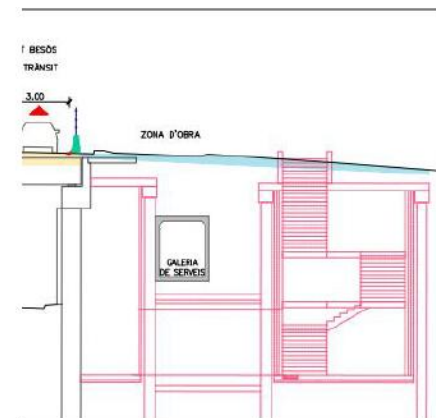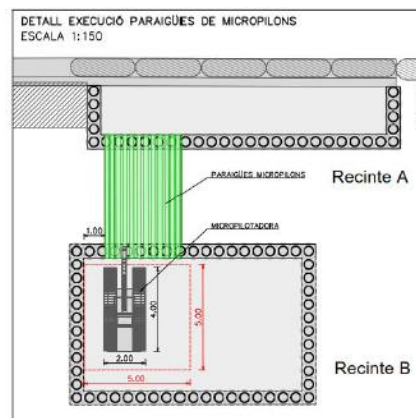





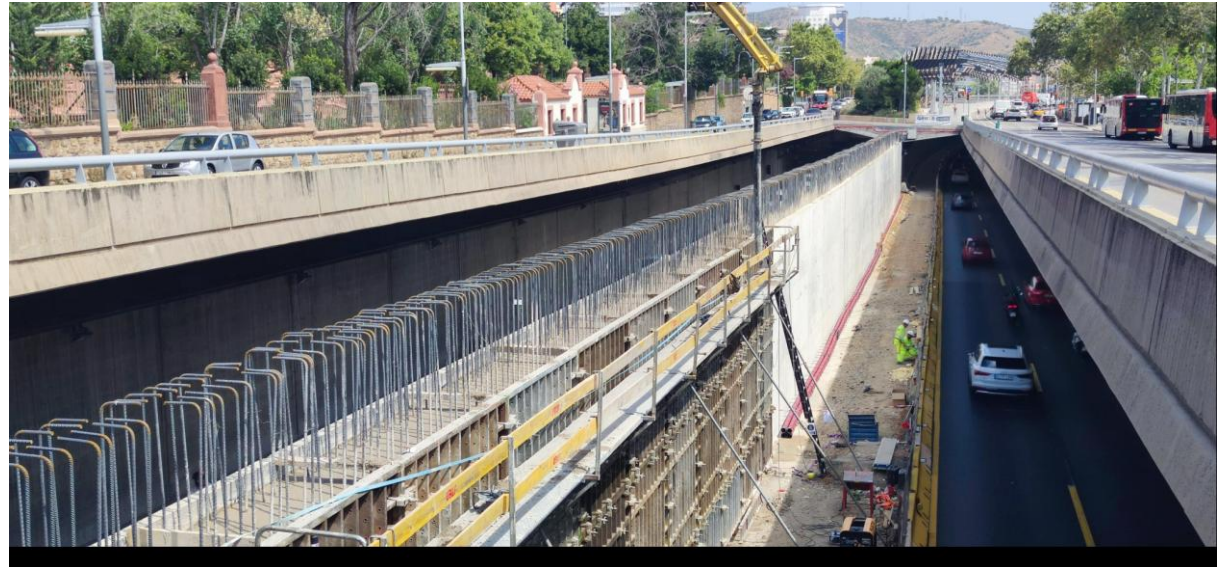





3 feb 2025 12:30:31
88° E

SE06 Ejecucion micropilotes
Número de índice: 1122





Ajuntament
de Barcelona

OBRA ESTRUCTURA RONDA DE DALT. TRAM 1. FASE 2A






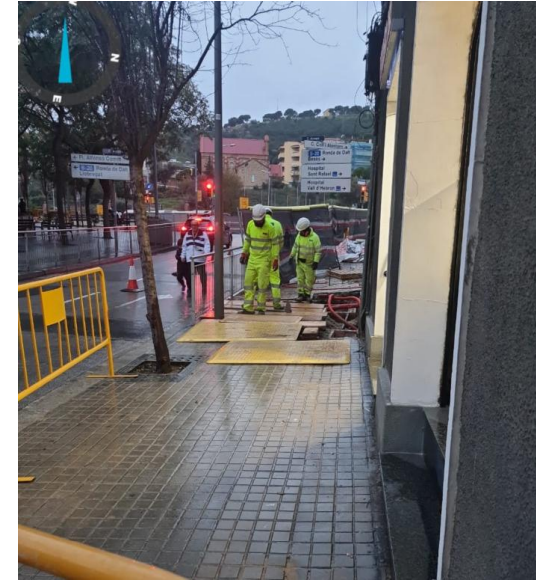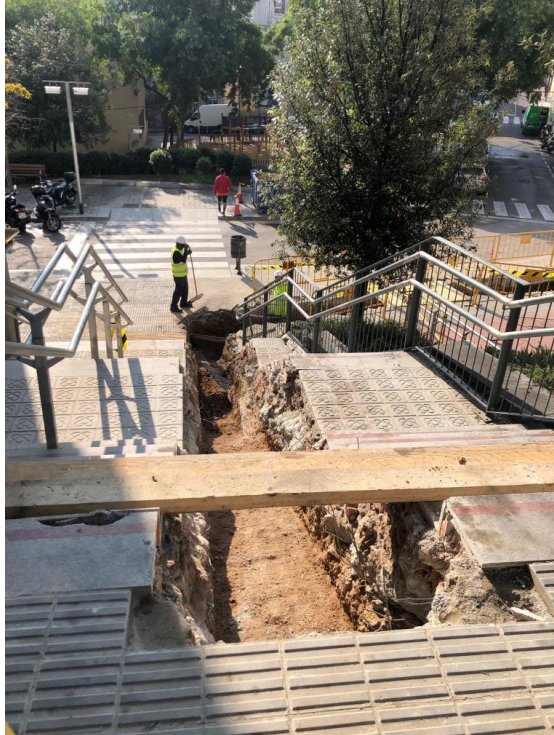

ESTAT DE L'ACTUACIÓ: PROJECTE APROVAT. LICITACIÓ OBRA FASE 2B: EN ADJUDICACIÓ

OBRA FASE 2B: INICI SETEMBRE 25. DURADA 21 MESOS (JUNY 27)


PRESSUPOST: 20M EUR

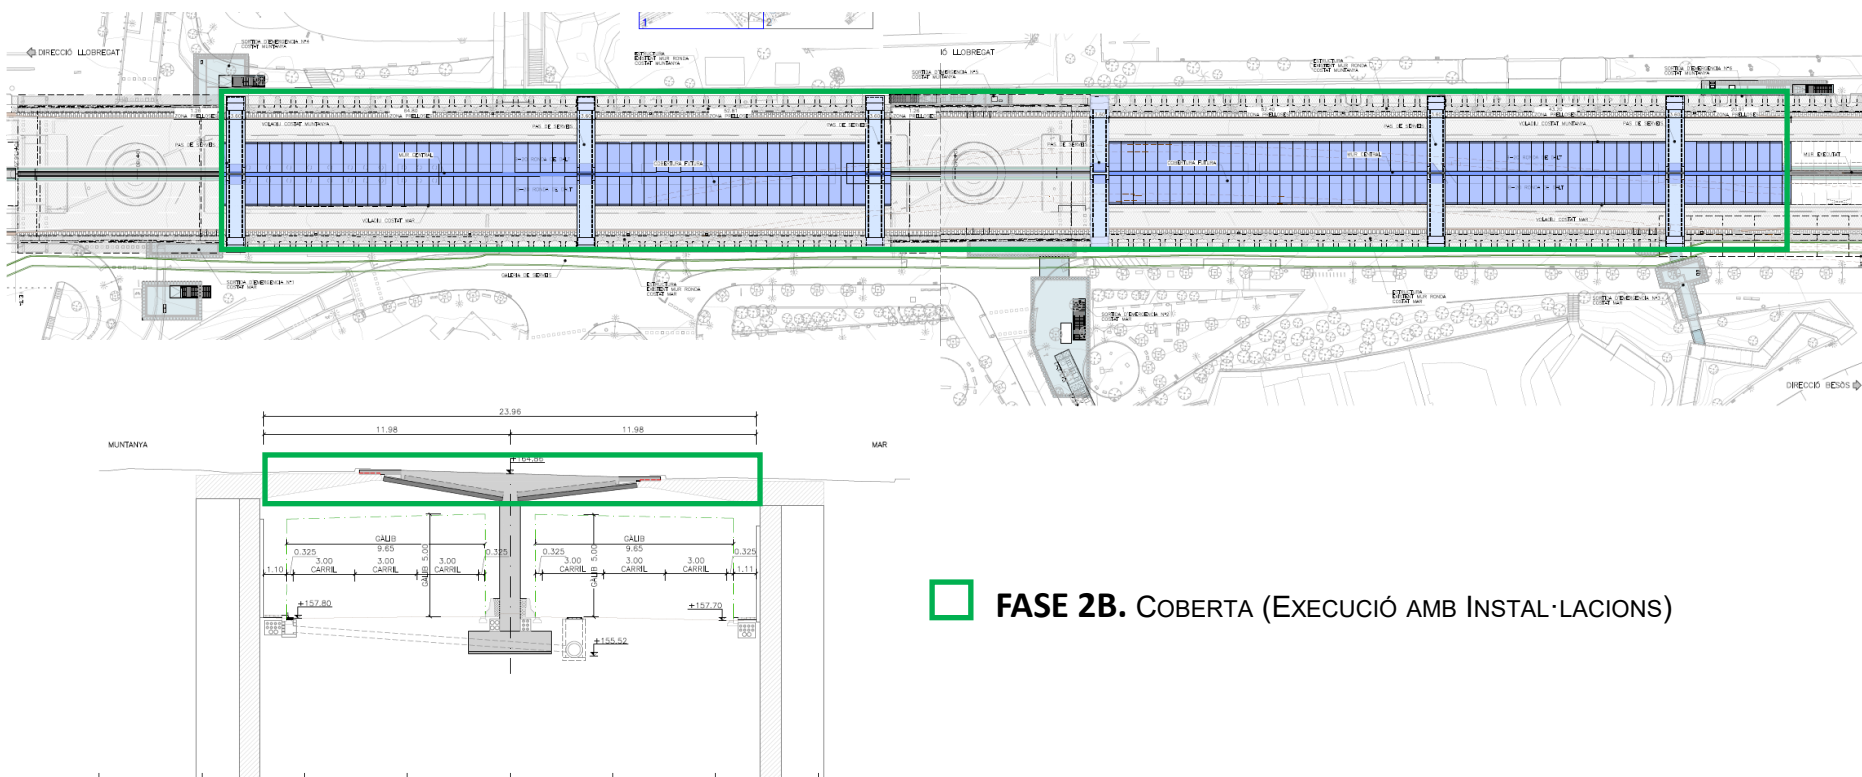


[illegible]

- FASE 1.- AV. JORDÀ – IES VALL D'HEBRON (OBRA EXECUTADA)
- FASE 2.-
 - ESTRUCTURA: IES VALL D'HEBRON – AV. VALLCARCA
 - INSTAL·LACIONS: AV. JORDÀ – AV. VALLCARCA

COSTAT MAR




COSTAT MAR

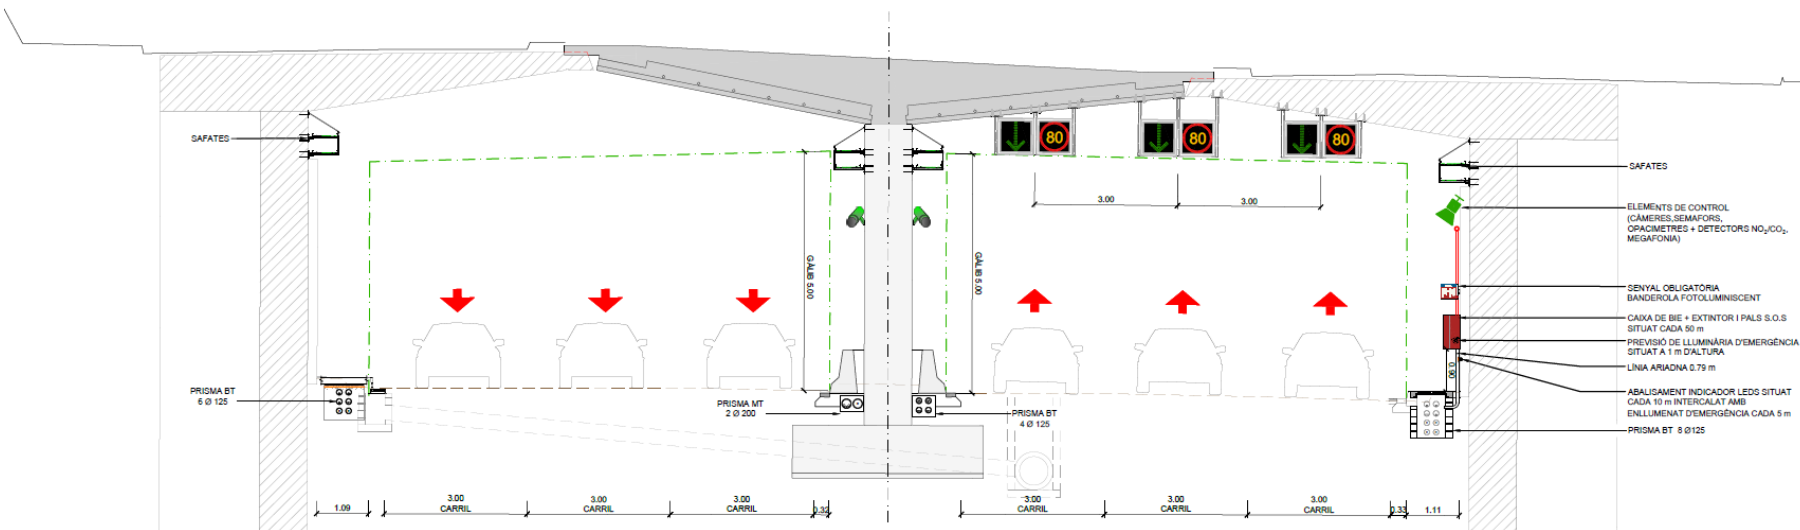

ACTUACIÓ: Cobertura + instal·lacions.

EXEMPLE DESVIAMENTS

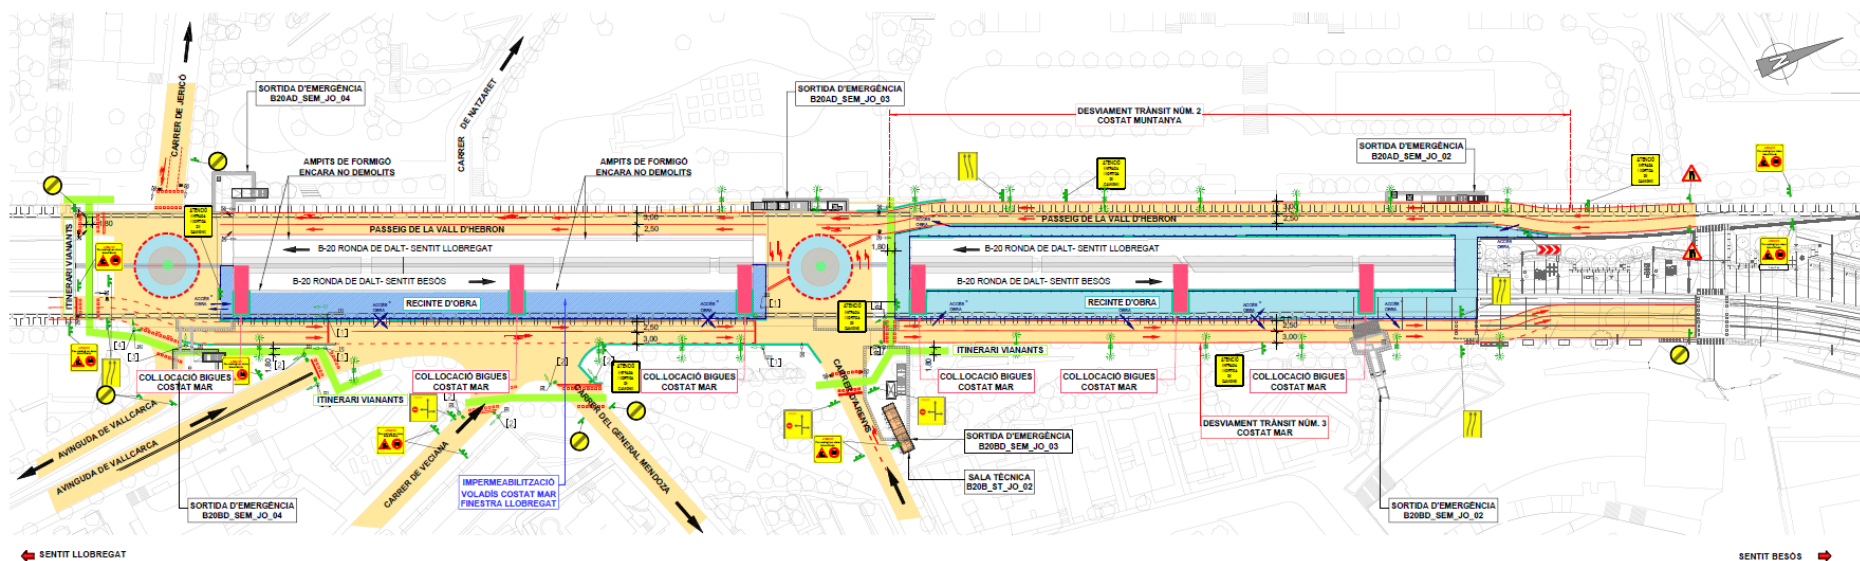

ACTUACIÓ: Urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

ESTAT DE L'ACTUACIÓ: PROJECTE EN REDACTAT. EN ACTUALITZACIÓ PER RECOLLIR LES PETICIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU VEÏNAL / ENTITATS. **LICITACIÓ OBRA URBANITZACIÓ:** PREVISIÓ DESEMBRE 26.

INICI OBRA URBANITZACIÓ: JUNY 27 I DURADA 12 MESOS (JUNY 28)



Gràcies per la vostra col·laboració!



**Ajuntament
de Barcelona**
