

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**

Comissió de Seguiment de l'Eixample 24/10/22





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Sistema de valoració de l'execució**
- 3. Estat dels projectes i properes reunions**





1. Benvinguda

OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre els l'estat i contingut dels projectes que no tenen promotores.
- Detectar actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions



2. Sistema de valoració de l'execució

Enquestes de valoració amb dos blocs:

Bloc 1: Valoració de les accions participatives de la fase d'execució.

Bloc 2: Valoració de l'obra en sí

El període d'execució dels projectes de pressupostos participatius no és uniforme

→ Diferents itineraris de l'enquesta segons l'estat d'execució

EXECUTAT COMPLETAMENT

Enquesta sencera

NO EXECUTAT COMPLETAMENT

L'EXECUTIU APROVAT

Enquesta Bloc 1

OBRA EXECUTADA

Enquesta Bloc 2



3. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte	Barri
Fem els parcs més accessibles per a tots els infants	300.000 €	La Sagrada Família
Obrim carrils bici a plaça de Catalunya	600.000 €	La Dreta de l'Eixample
Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada	341.642 €	Eixample
Pacifiquem els entorns escolars del carrer d'Entença	270.000 €	L' Esquerra de l'Eixample
Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi	310.000 €	L' Esquerra de l'Eixample
Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els Llorers i L'Arbret de l'Eixample	120.000 €	L' Esquerra de l'Eixample
Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample	380.000 €	L' Esquerra de l'Eixample
Pacifiquem el carrer Rosselló	875.000 €	L' Esquerra de l'Eixample




3. Estat dels projectes

Títol	Fem els parcs més accessibles per a tots els infants
Import	300.000 €
Operador	BIMSA
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Novembre 2021 – Juny 2022 Juny 2022 – gener 2023 Gener – juny 2023 Juny – Setembre 2023
Previsió finalització	Setembre 2023
Previsió participació	No es preveuen més accions
Estat actual	Redacció projecte executiu
Percentatge d'execució	30%



Fem els parcs més accessibles per a tots els infants

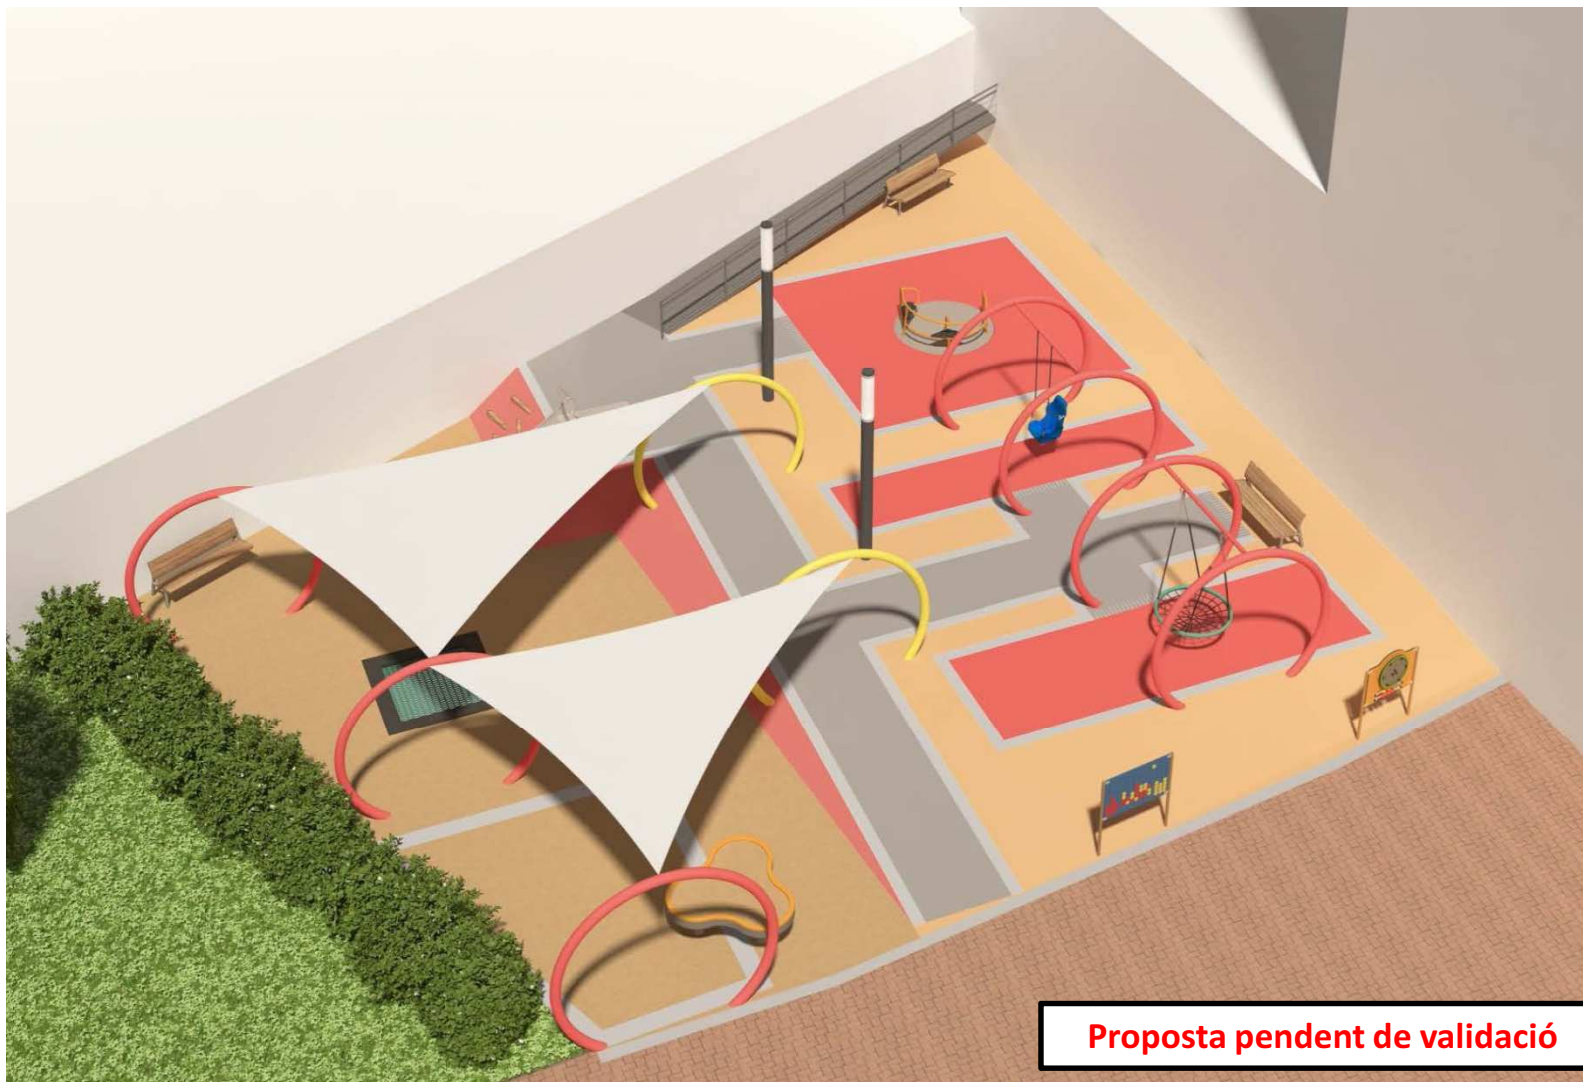

Proposta pendent de validació




3. Estat dels projectes

Títol	Obrim carrils bici a plaça de Catalunya
Import	600.000 €
Operador	BIMSA
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	No té Febrer – Desembre 2022 Gener – Abril 2023 Abril – Juliol 2023
Previsió finalització	Juliol 2023
Previsió participació	07 novembre: Contrast projecte executiu
Estat actual	Redacció projecte executiu
Percentatge d'execució	30%



Obrim carrils bici a plaça de Catalunya

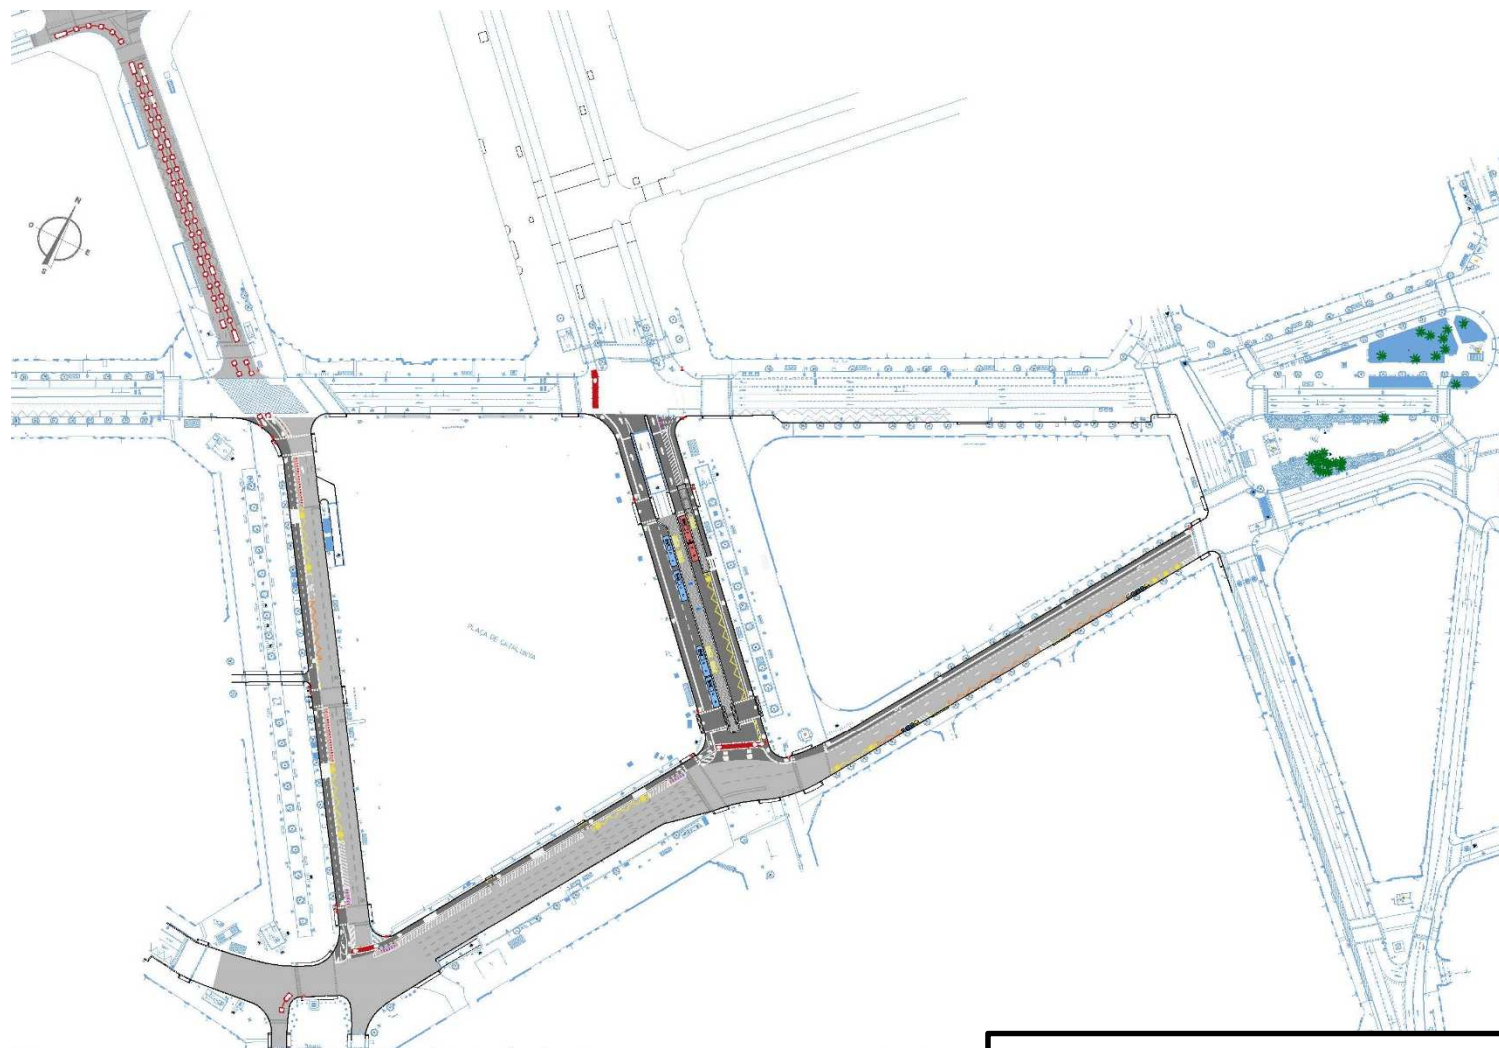

Ajuntament de Barcelona

BIMSA Barcelona d'Infraestructures Municipals

REDACCIÓ DEL PROJECTE
EJEA MARTÍN | AMARCA PÉREZ

TÍTOL DEL PROJECTE
PROJECTE EXECUTIU DEL CARRIL BICI A LA PLAÇA DE CATALUNYA I AL CORREDE
FONTANIL·LA, ALS DISTRICTES DE L'EISAMPLEI I DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA

ESCALES
A1- 1:100
A2- 1:500
ORIENTACIÓ

Proposta pendent de validació




3. Estat dels projectes

Títol	Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada
Import	341.642 €
Operador	BIMSA
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Gener – Maig 2022 Juny – Octubre 2022 Desembre 2022 – Març 2023 Abril – Juny 2023
Previsió finalització	Juny 2023
Previsió participació	No es preveuen més accions
Estat actual	Tancament projecte executiu
Percentatge d'execució	30%



Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada

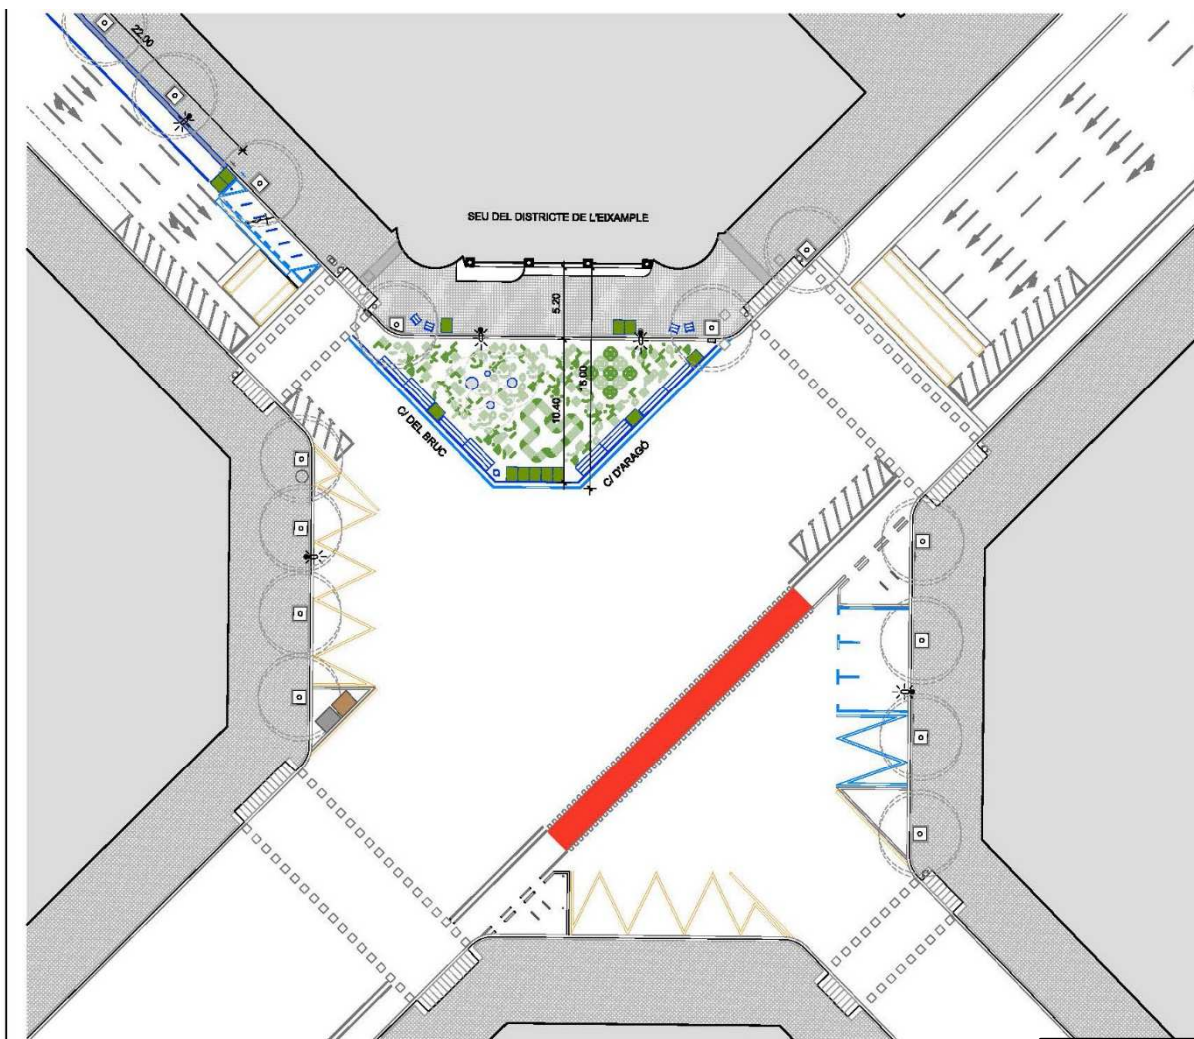

Proposta pendent de validació


	Ajuntament de Barcelona	BIMSA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE	TÍTOL DEL PROJECTE	ESCALES 1:300 ORIGINAL A3	DATA JULIOL 2023	NOM DEL PROJECTE ECOXAMFRANS ARAGÓ-BRUC PROPOSTA PLANTA GENERAL	REVISOR/ORA	POWERS/IBEL
			OSCAR MAGRENYÀ arquitecte	EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE 5 ESCOLES I 5 ECOXAMFRANS, INCLOSOS AL PROGRAMA "PRESSUPOSTOS PARTICIPATIU" A DIVERSOS DISTRICTES DE BARCELONA. PS.2021.0284				OSCAR MAGRENYÀ	OSCAR MAGRENYÀ



3. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem els entorns escolars del carrer d'Entença
Import	270.000 €
Operador	BIMSA
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Gener – Maig 2022 Juny – Novembre 2022 Novembre – Desembre 2022 1a Fase: Gener – febrer 2023; 2a Fase: Abril 2023
Previsió finalització	Abril 2023
Previsió participació	No es preveuen més accions
Estat actual	Redacció projecte executiu
Percentatge d'execució	30%

Pacifiquem els entorns escolars del carrer d'Entença

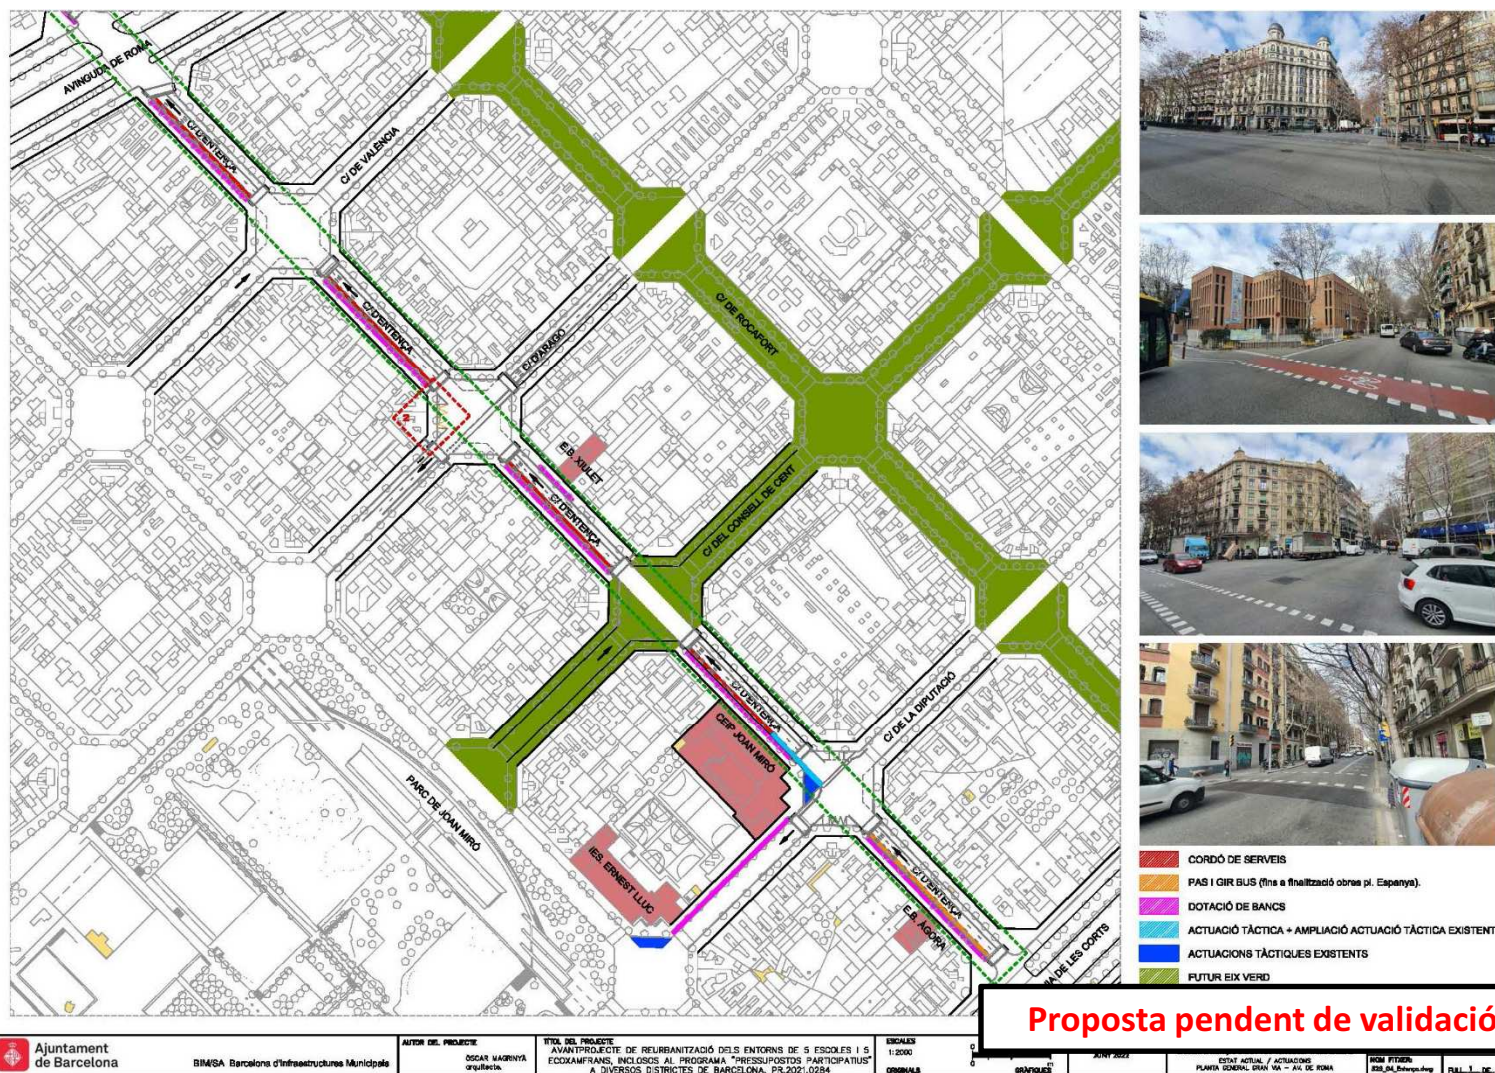



3. Estat dels projectes

Títol	Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi
Import	310.000 €
Operador	BIMSA
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Novembre 2021 – Març 2022 Abril – novembre 2022 Novembre 2022 – Febrer 2023 Març – Juny 2023
Previsió finalització	Finals juny 2023
Previsió participació	Es valora la possibilitat de presentar el projecte executiu
Estat actual	Tancament projecte executiu
Percentatge d'execució	30%



Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi






3. Estat dels projectes

Títol	Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els Llorers i L'Arbret de l'Eixample
Import	148.393 €
Operador	Districte Eixample
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Gener – Abril 2022 Maig – Octubre 2022 Novembre 2022 – Gener 2023 Febrer – Maig 2023
Previsió finalització	Maig 2023
Previsió participació	No es preveuen més accions
Estat actual	Tancament projecte executiu
Percentatge d'execució	30%



Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els Llorers i L'Arbret de l'Eixample

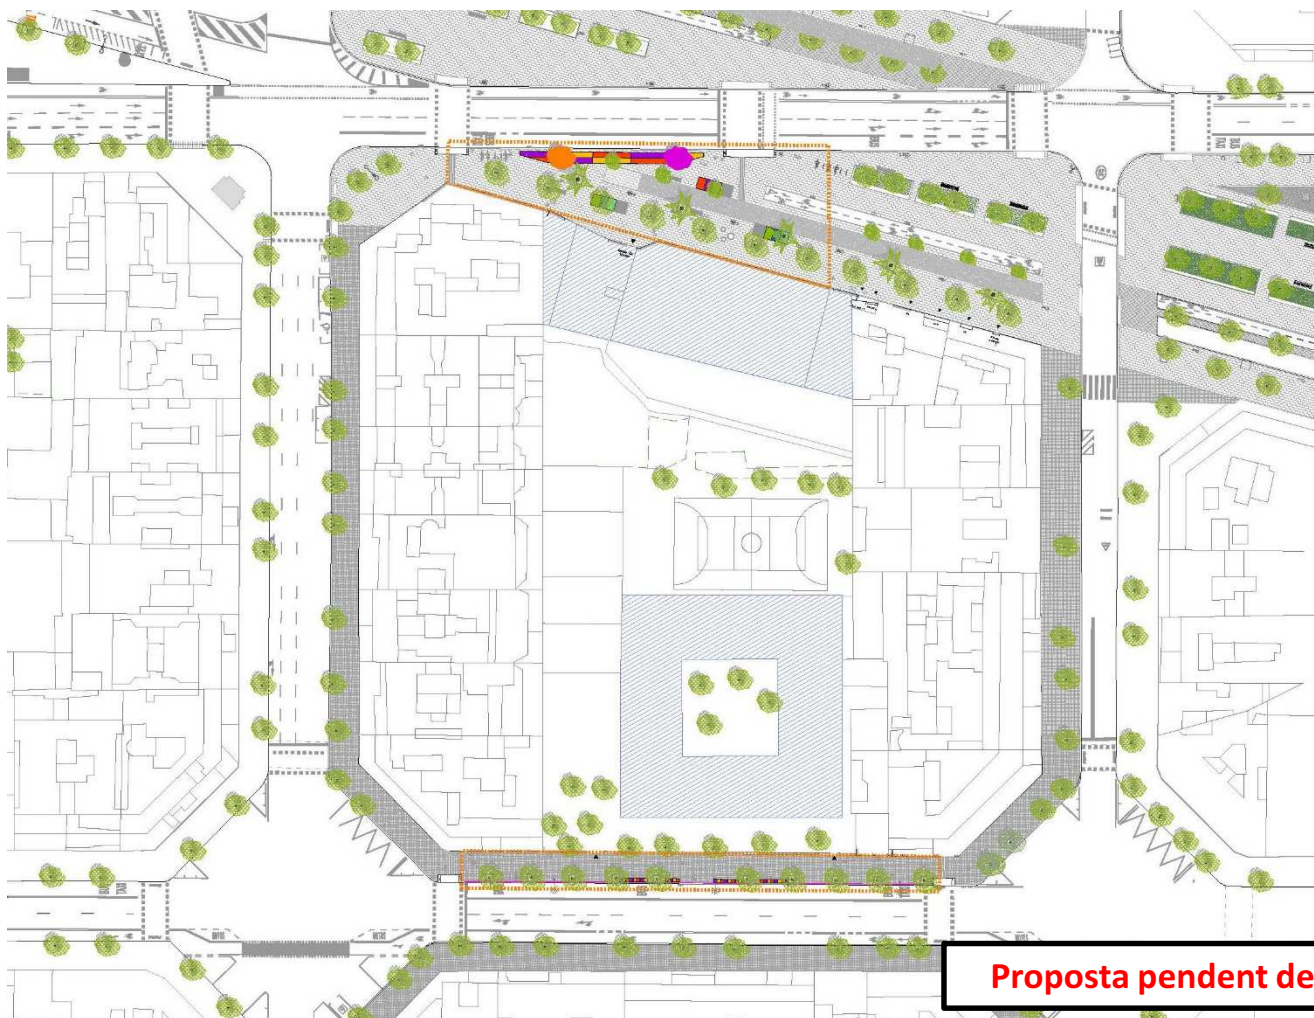

Proposta pendent de validació




3. Estat dels projectes

Títol	Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample
Import	380.000 €
Operador	BIMSA
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Desembre 2021 – Juny 2022 Març – Novembre 2022 Novembre – Desembre 2022 Gener – Febrer 2023
Previsió finalització	Febrer 2023
Previsió participació	No es preveuen més accions
Estat actual	Redacció projecte executiu
Percentatge d'execució	30%



Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample

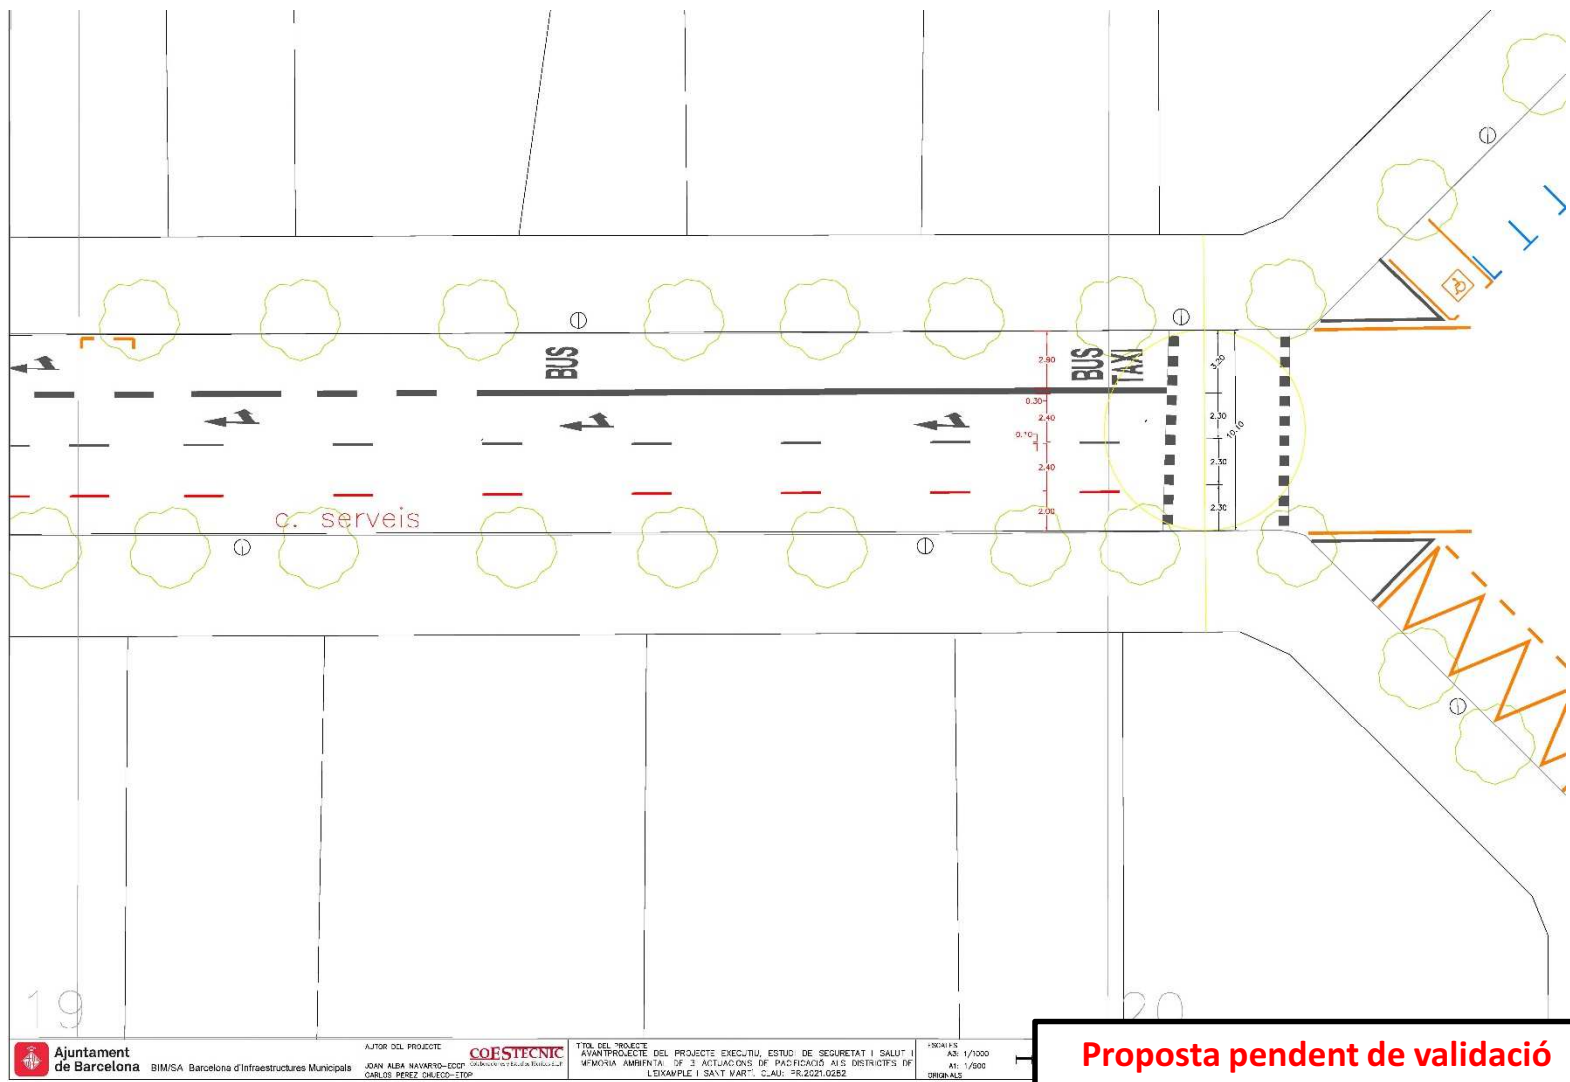




3. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem el carrer Rosselló
Import	875.000€
Operador	BIMSA
Previsió execució Redacció avantprojecte Redacció projecte Licitació de l'obra Període d'obres	Gener – Novembre 2022 Desembre – Febrer 2023 Març – Juny 2023 Juliol – Octubre 2023
Previsió finalització	Octubre 2023
Previsió participació	Desembre: Presenta promotors maqueta
Estat actual	Tancament avantprojecte
Percentatge d'execució	25%



Pacifiquem el carrer Rosselló

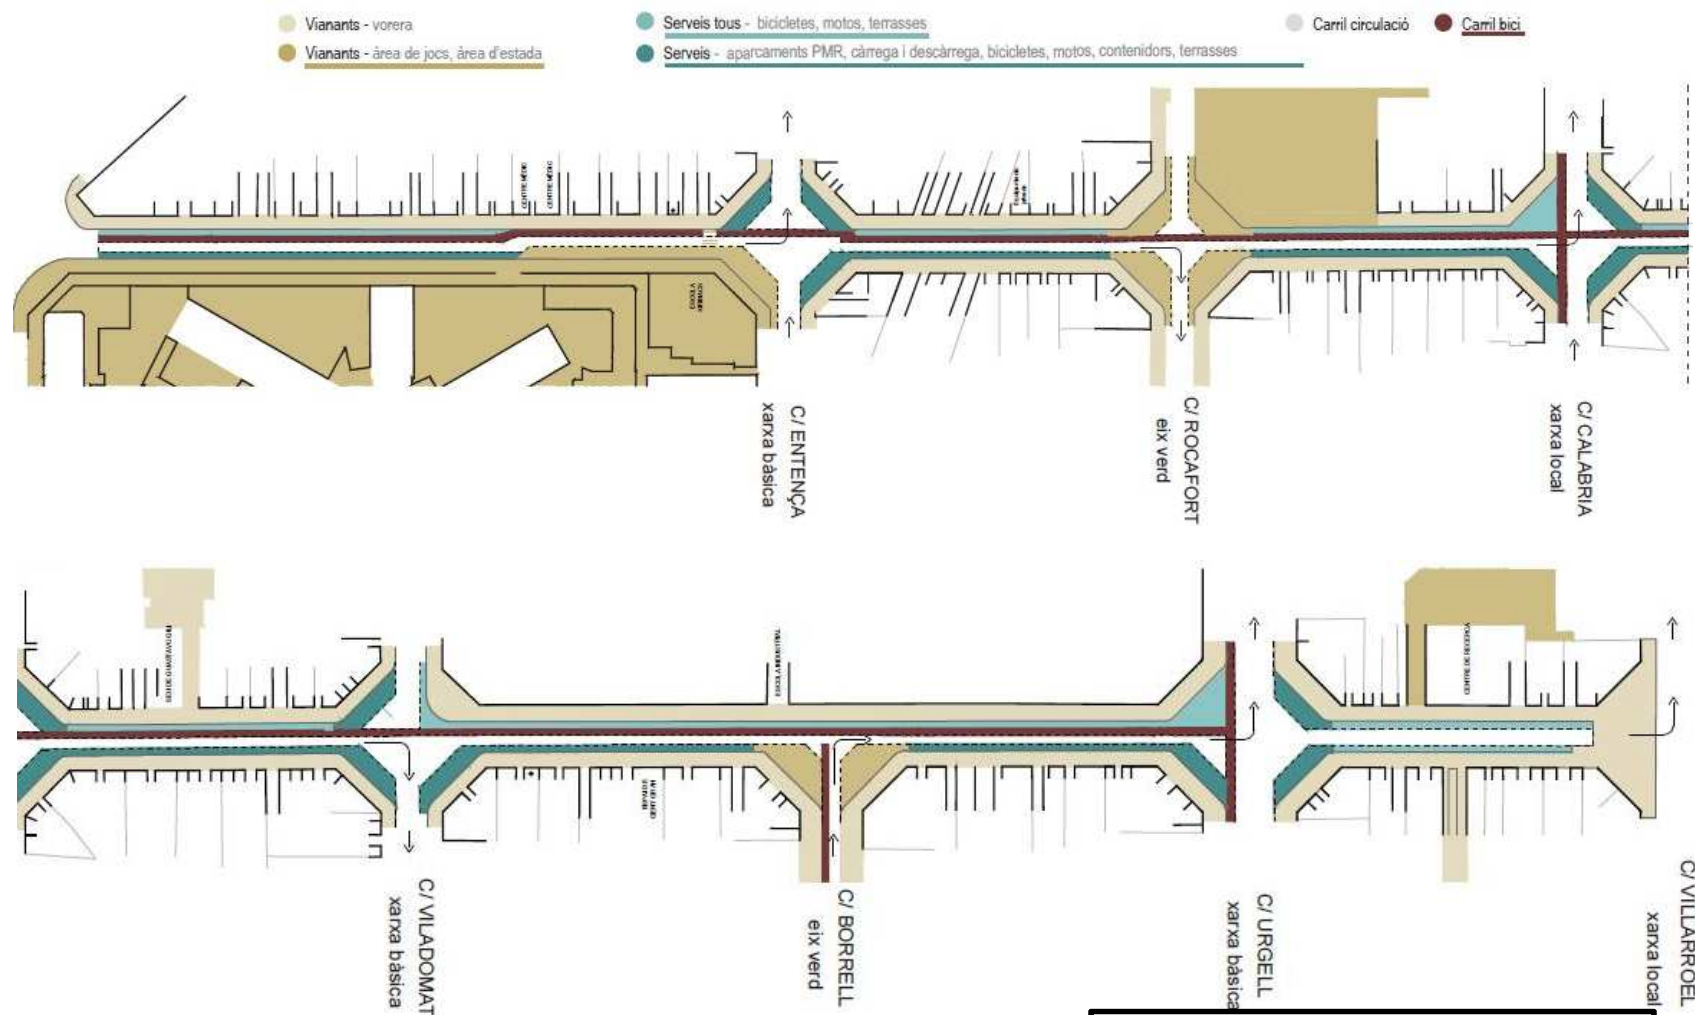

Proposta pendent de validació

Gràcies per la vostra participació



Ajuntament
de Barcelona
