

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment**
- 4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes**
- 5. Estat dels projectes**





2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre els l'estat i contingut dels projectes que no tenen promotores.
- Detectar actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions



2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI






3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.






4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos • Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7
Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
[Veure les fases](#)

[QUÈ ÉS?](#) [RESULTATS VOTACIÓ](#) [MÉS INFORMACIÓ](#)

Estat d'execució global



11,7%

[Descarregar dades en CSV](#)



Ciutat Vella



0%

9 Projectes



Eixample



11,3%

8 Projectes



Gràcia



12,5%

8 Projectes



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos - Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

Impuls i seguiment dels projectes
04-07-2021 - 31-12-2022
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Àmbits: Tots Ciutats Ciutats Vella Eixample Santa-Monja Hortes-Guinardó Gràcia Sant Martí-Sant Gervasi Les Corts Nou Barris Sant Martí Sant Andreu

Execució global: 12,6%

8 RESULTATS

✓	Fem una Gràcia més verda Inici: 2021-07-01 PI: 2022-07-01 Estat: Gestió Interna	10%
✓	Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola Inici: 2021-07-01 PI: 2022-11-30 Estat: Redacció Inicial	15%
✓	Acabem amb els espais foscos a Gràcia Inici: 2021-07-01 PI: 2022-12-31 Estat: Trobada amb els promotors	10%
✓	Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll Inici: 2021-07-01 PI: 2022-08-30 Estat: Redacció Inicial	15%
✓	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri Inici: 2021-07-01 PI: 2022-09-30 Estat: Redacció Inicial	15%
✓	Renovem l'àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn Inici: 2021-07-01 PI: 2022-04-30 Estat: Redacció Inicial	15%
✓	Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36 Inici: 2022-02-01 PI: 2022-02-31 Estat: Gestió Interna	5%
✓	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució Inici: 2021-07-01 PI: 2022-04-30 Estat: Redacció Inicial	15%

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos - Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

Impuls i seguiment dels projectes
04-07-2021 - 31-12-2022
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Execució global: 12,6% - Espais de joc infantil: 14,2%

⑥ Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució

Inici: 2021-07-01
FI: 2022-04-30
Estat: Redacció Inicial
Descripció: Redacció inicial del projecte. Inclou les següents actuacions: Estudi previ, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.

Progrés: **15%**

Descripció breu: Ampliar i millorar l'àrea de joc infantil d'aquesta plaça. Per això, es planteja incorporar elements de joc per als infants de totes les edats, així com elements que facin ombra, per tal que la plaça esdevingui un espai més agradable i jugable.

Descripció ampliada: L'actual àrea de joc infantil d'aquesta plaça és molt petita i està en mal estat. A més a més, les estructures de joc són antigues i no s'adapten a les necessitats de les diferents edats dels infants.

El projecte pretén ampliar l'espai jugable i deixar-lo sense tancar, però incorporant-hi elements que protegeixin els infants dels vehicles. La remodelació preveu incloure-hi elements de joc més moderns i diversos per a infants d'edats diferents.

D'altra banda, el projecte inclou buscar alguna solució que permeti crear espais ombrívols, en especial durant els mesos d'estiu. La plaça està damunt d'un pàrquing, raó per la qual no és possible plantar-hi més arbres.

Incorporació de la perspectiva de gènere: Pensar el projecte amb una mirada inclusiva on nens i nenes de diferents edats puguin jugar.

Persones o entitats impulsores: Dones de la Plaça Romani

Espais de joc infantil: la Vila de Gràcia


EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 2021-10-10 Reunió de llançament del projecte amb els promotors
- 2021-11-09 Sessió participativa amb infants a Pl. Revolució
- 2021-12-02 Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte

PROJECTES INCLOSOS EN AQUEST RESULTAT

✓ Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució


4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

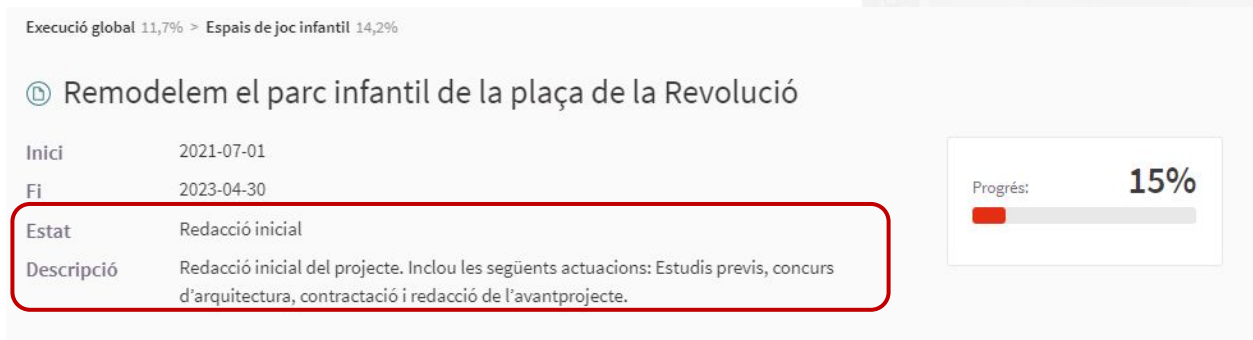

ESTATS D'EXECUCIÓ:

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat

4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 1 2021-10-19
Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2 2021-11-05
Sessió participativa amb infants a Pl. Revolució
- 3 2021-12-20
Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte

DOCUMENTS RELACIONATS

[Retorn sessió participativa amb infants pdf 1 MB](#)
[Retorn sessió participativa amb infants \(13 de novembre de 2021\)](#)



5. Estat dels projectes

Projectes Nou barris	Import del projecte
Reforestem Collserola	50.000 €
Creem un parc inclusiu a Can Dragó	578.000€
Instal·lem bancs adaptats per la gent gran	50.000 €
Obrim un carril bici al Passeig de Fabra i Puig	650.000 €
Fem un parc agrari urbà de Can Valent	700.000 €
Obrim aules informàtiques a Trinitat Nova	50.000 €
Millorem les voreres de l'Avd Rio de Janeiro (entre Vèlia i ciutat de Mallorca)	270.000 €
Salvem Can Valent	1.175.000 €
Iniciem el procés per adequar la terrassa de la cosa nostra en un espai jove	50.000€



5. Estat dels projectes

Títol	Reforestem Collserola
Import	50.00
Previsió execució	2022 – Finalitzada execució
Previsió finalització	2022 finalitzada execució
Òrgan executor	Consorci de Collserola
Estat actual	Actuació finalitzada: Restauració paisatgística del Torrent de Canyelles - retirada de canya - retirada de deixalles - retirada d'estructures en runa - Revegetació de l'àmbit - arranament de la font vella de canyelles - arranament de l'antiga mina de Canyelles - arranament de camins



5. Estat dels projectes

Títol	Creem un parc inclusiu a Can Dragó	
Concreció projecte	Millorar l'espai esportiu i lúdic limitat pels carrers AV Meridiana, Av Rio de Janeiro i camp de futbol. • Estudi de l'entorn • Pista de jocs esportius • Jocs infantils grans • Aparells d'esport per a gent gran • Zona de running amb aparells de calistènia • Adequació de les instal·lacions per a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda	
Import	578.000€	
Previsió execució	<i>Contractació del projecte:</i> Març - Abril 2022 <i>Redacció de l'Avantprojecte:</i> Maig - Juny 2022 <i>Redacció del Projecte Executiu:</i> Juliol – Octubre 2022 <i>Tramitació tècnica del PE:</i> Novembre- Desembre 2022 <i>Aprovació inicial del projecte:</i> Gener 2023 <i>Licitació de les obres:</i> Febrer 2023 – Juny 2023 Pendent confirmar calendari	
Previsió finalització	Execució de les obres: Juliol 2023-Octubre	
Estat actual	S'ha fet una primera reunió amb els promotors però no es va poder concretar l'actuació. Pendent resposta de Dte sobre àrea de Gossos	



5. Estat dels projectes

Títol	Instal·lem bancs adaptats per a gent gran
Import	50.000€
Previsió execució	2022 executada
Previsió finalització	2022 finalitzada execució
Òrgan executor	Districte de Nou barris
Estat actual	El projecte inicial demanava el canvi dels bancs de la via Júlia per bancs adaptats. En el moment de l'execució els bancs de la Via Júlia feia poc que s'havien canviat i es va escollir la zona de Can Dragó per fer el canvi. S'han renovat 45 bancs. El model instal·lat aèrgonòmic.



5. Estat dels projectes

Títol	Obrim un carril bici al carrer Fabra i Puig
Concreció projecte	Creació d'un carril bici unidireccional entre Avd Meridiana i pl Virrei Amat pels carrers de Fabra i Puig (en sentit Llobregat) i escòcia (sentit Besos)
Import	650.00€
Previsió execució	Equip redactor contractat. <i>Redacció del projecte</i> març 2022-Juny 2022 <i>Possible inici d'obres</i> desembre 2022 Pendent de confirmar calendari
Previsió finalització	2022 finalitzada execució
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	Queda pendent convocar les reunions amb els promotors i l'equip redactor durant la redacció del projecte. Queda pendent fixar la data de sessió informativa al comerciants de la zona (data probable mes de maig)



5. Estat dels projectes

Títol	Fem un parc agrari urbà de Can valent	
Import	700.000€	
Concreció projecte	Avant projecte de la totalitat de l'àmbit + projecte executiu de la part corresponent al 20% de la pastilla. ·Horts urbans, comunitari i parcel·les individuals ·Bosc comestible i hort terapèutic ·Zona àgora ·Esplanada verda per activitats lúdiques	
Previsió execució	<i>Contractació del projecte:</i> <i>Redacció de l'Avantprojecte:</i> <i>Redacció del Projecte Executiu:</i> <i>Tramitació tècnica del P E:</i> <i>Aprovació inicial del projecte:</i> <i>Licitació de les obres:</i>	Març - Abril 2022 Maig -Juny 2022 Juliol – Octubre 2022 Novembre 2022 – Desembre2022 Gener 2023 Febrer 2022 – Juny 2023
Previsió finalització	<i>Execució de les obres:</i>	Juny 2023 – Juliol 2023
Òrgan executor	BIMSA	
Estat actual	Consell de barri de Porta es presenta la proposta final del procés. Un cop contractat l'equip redactor és convocaran reunions conjuntes amb els promotors.	

5. Estat dels projectes

Títol	Obrim aules informàtiques a Trinitat Nova
Import	50.000€
Previsió execució	Novembre 2021- març 2022 concreció del llistat de material Març 2022 – setembre2022 execució de la compra
Previsió finalització	Setembre del 2022
Òrgan executor	Districte de Nou Barris
Estat actual	Es va fer una primera reunió amb els promotors que van aportar la llista de material a comprar per adequar les aules informàtiques. DSPi T i el departament d'administració estan treballant en la viabilitat de la comprar de tot el material i han seguit en contacte amb els promotors per anar concretant. Queda pendent el tema del manteniment del material, fora de l'àmbit dels pressupostos participatius



5. Estat dels projectes

Títol	Millorem les voreres de l'Avd Rio de Janeiro (entre Velia i Ciutat de Mallorca)	
Concreció Projecte	Treure els cordons d'aparcament, ampliar la vorera, crear plataformes sobre l'escala actual.	
Import	270.000	
Previsió execució	Contractació del projecte:	Març 2022
	Redacció de l'Avantprojecte:	Abril-Març 2022
	Redacció del Projecte Executiu:	Juny- Agost 2022
	Tramitació tècnica del PE:	Octubre 2022- Novembre 2022
	Aprovació inicial del projecte:	Desembre 2022
	Licitació de les obres:	Gener 2023 – Maig 2023
	Execució de les obres:	Juny 2023 – Juliol 2023
Previsió finalització	Execució de les obres:	Juny 2023 – Juliol 2023
Òrgan executor	BIMSA	
Estat actual	A l'espera de la contractació de l'equip redactor per fer calendari de reunions amb promotors	



5. Estat dels projectes

Títol	Salvem Can Valent
Concreció del Projecte	Consolidació i sanejament de la masia de Can Valent. Inclou desmuntar coberta i rellotge de sol i restaurar-lo
Import	1.175.000€
Previsió execució	<i>inici d'obres</i> marc 2022
Previsió finalització	Setembre 2022
Òrgan executor	Dte de Nou barris i BIMSA
Estat actual	Es va fer una reunió inicial amb els promotors que tenen accés als dibuixos del projecte. Previst en aquest mesos d'obres calendari de visites



5. Estat dels projectes

Títol	Iniciem el procés per adequar la terrassa de la cosa nostra en un espai jove
Concreció del Projecte	Redacció d'un Pla especial per concedir un increment d'edificabilitat a l'equipament. Es planteja la redacció de l'avant projecte i el planejament derivat.
Import	50.000€
Previsió execució	<i>inici d'obres</i>
Previsió finalització	Setembre 2022
Òrgan executor	Dte de Nou barris
Estat actual	Es va fer una reunió inicial amb els promotors. Es va demanar als promotors que facin arribar funcionalitats futures de l'espai. Resta fer calendari de reunions amb promotors i redactors.

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**
