

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment**
- 3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment**
- 4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes**
- 5. Estat dels projectes**



2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment


OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment** del desenvolupament dels projectes.
- Estar **informat/des** sobre els l'estat i contingut dels projectes que no tenen promotores.
- **Detectar** actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les **obres**
- Estar informat sobre la planificació de les **inauguracions**



2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI

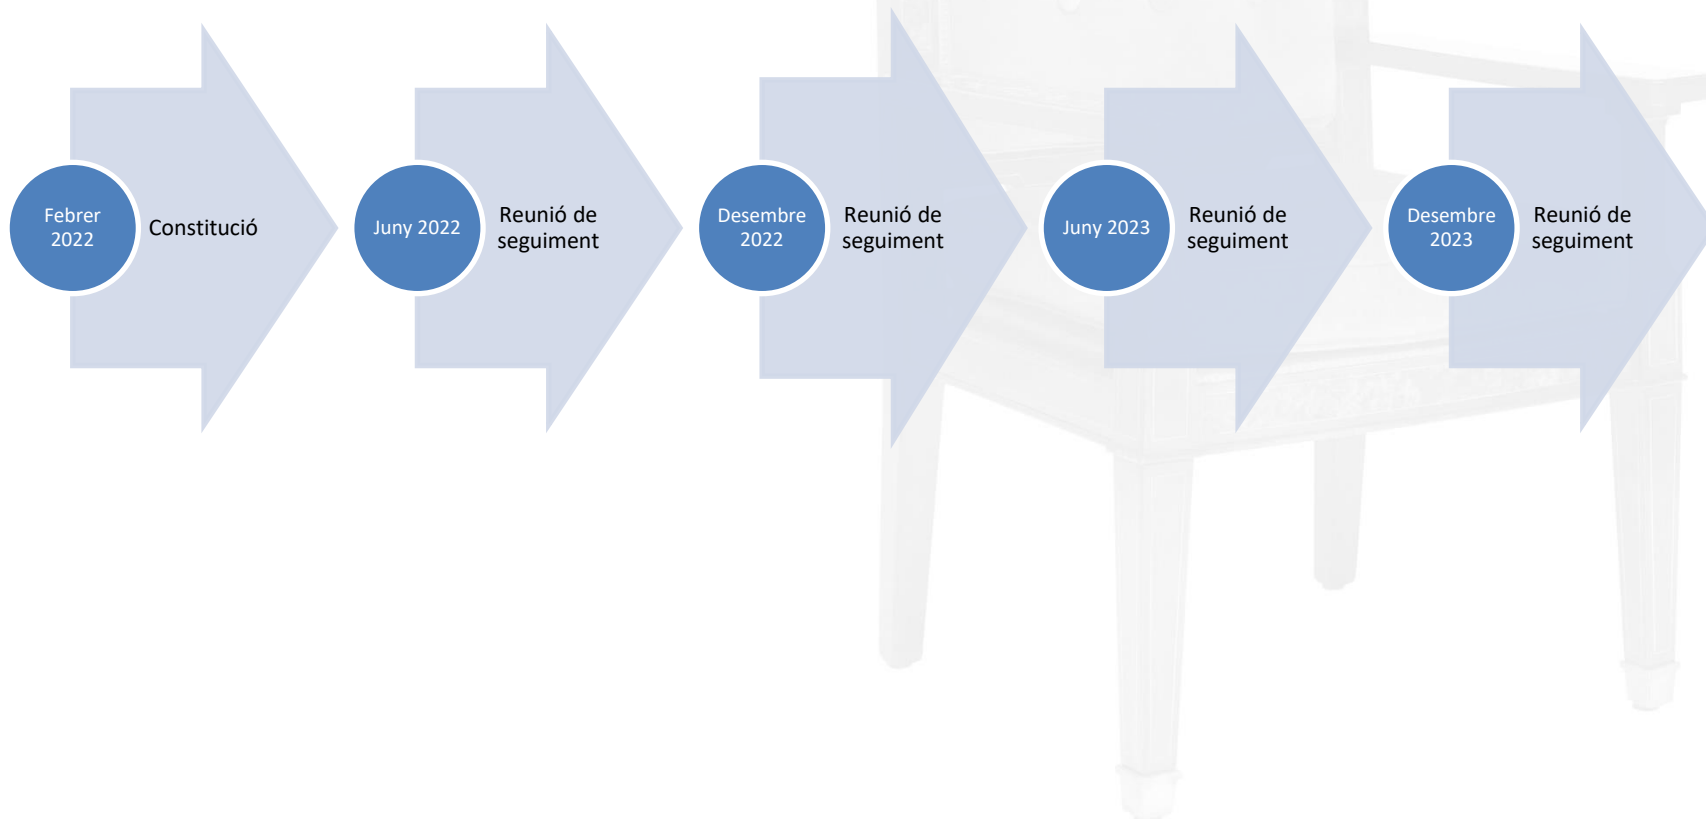



3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Estat d'execució global




15,7%

[Descarregar dades en CSV](#)



Ciutat Vella




11,1%

9 Projectes



Eixample




11,3%

8 Projectes



Gràcia




12,5%

8 Projectes



Horta - Guinardó




22,1%

7 Projectes



Les Corts




10%

8 Projectes



Nou Barris



19,4%

9 Projectes





4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Execució global 22,1%

7 RESULTATS

✓	Rehabilitem la part històrica del parc del Guinardó	10%
	Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Trobada amb els i les promotores	
✓	Millorem el pati de l'Escola de les Aigües	20%
	Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Redacció inicial	
✓	Carril bici a la Ronda del Guinardó	80%
	Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Desenvolupament de les obres (iniciat)	
✓	Millorem el llac dels jardins del Baix Guinardó	10%
	Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Trobada amb els i les promotores	
✓	Fem el Casal Font d'en Fargues més ecològic i sostenible	10%
	Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Trobada amb els i les promotores	
✓	Renovem el Poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre	20%
	Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Redacció inicial	
✓	Renovem l'enllumenat del carrer de Sorolla	5%
	Inici 2021-07-01 Fi 2023-12-31 Estat Gestió interna	

📍 Millorem el llac dels jardins del Baix Guinardó


Inici 2021-07-01

Fi 2023-12-31

Estat Trobada amb els i les promotores

Descripció Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.

Progrés: 10%



Descripció breu: El projecte planteja canviar els usos del llac del parc del Baix Guinardó. L'objectiu consisteix a transformar-lo en un espai de joc i d'estada, adreçat, sobretot, als infants i a la gent jove.

Descripció ampliada: Contempla que aquest llac, a més de trencar la permeabilitat del parc a causa de les seves dimensions, s'utilitza d'una manera molt més intensiva quan està buit, ja que els infants i la gent jove el fan servir com a espai de joc.

Per tant, planteja reduir les dimensions del llac, de manera que només ocupi una tercera part de l'espai, i que durant els mesos de calor (del juny al setembre, aproximadament), es buildi i s'hi instal·lin brolladors o jocs d'aigua per als infants.

La resta de l'espai creat amb aquesta proposta acollirà una zona per patinar-hi (superfície plana) i per practicar-hi skate (rampes, esglaons, etc.).

Persones o entitats impulsores: Anna

Espais de joc infantil el Baix Guinardó

Versió 3 (de 3)

[veure altres versions](#)

EDITAT PER ÚLTIMA VEGADA PER

Andreu Parera

DARRERA ACTUALITZACIÓ EL

11/01/2022 12:58

Referència: BCN-RESU-2021-07-11143

[Compartir](#)

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

1

2021-10-04

Reunió amb promotors/es per consensuar l'objecte de l'actuació

2

2022-01-31

Inici redacció del projecte



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

📄 Millorem el llac dels jardins del Baix Guinardó


Inici 2021-07-01

Fi 2023-12-31

Estat Trobada amb els i les promotores


Descripció Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.

Progrés: 10%



% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat

4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 1** 2021-10-04
Reunió amb promotors/es per consensuar l'objecte de l'actuació
- 2** 2022-01-31
Inici redacció del projecte
- 3** 2022-10-31
Previsió Lliurament del Projecte Executiu definitiu
- 4** 2023-04-30
Possible inici d'obra
- 5** 2023-10-31
Possible final d'obra





5. Estat dels projectes d'Horta

Projecte	Import del projecte
Renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre	100.000 €
Millorem el pati de l'Escola de les Aigües	185.000 €
El Casal Font d'en Fargues pel Clima	100.000 €
Renovem l'enllumenat del carrer Sorolla	52.000 €
Carril bici a la ronda del Guinardó	650.000 €
Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó	1.600.000 €
Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó	300.000 €



5. Estat dels projectes

Títol	Renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre
Import	100.000 €
Previsió execució	2021 novembre - Contractació equip redactor 2022 febrer – Avantprojecte juny – inici obres
Previsió finalització	2022 setembre – finalització obres
Òrgan executor	Consorci d'Educació de Barcelona
Òrgans municipals implicats	Consorci d'Educació de Barcelona
Previsió participació	Comissió de Seguiment del projecte
Estat actual	Presentació de l'avantprojecte als/les promotors/es



Títol	Millorem el pati de l'Escola de les Aigües
Import	185.000 €
Previsió execució	2021 novembre – Contractació de l'equip redactor desembre – Presentació avantprojecte 2022 Juny – Inici d'obres
Previsió finalització	2022 setembre
Òrgan executor	Consorci d'Educació
Òrgans municipals implicats	Consorci d'Educació
Previsió participació	Comissió Seguiment del projecte
Estat actual	Pendent inici obres



Títol	El Casal Font d'en Fargues pel Clima
Import	100.000 €
Previsió execució	2021 – 3 reunions de la Comissió de Seguiment 2022 – Pendent concretar intervencions
Previsió finalització	2022 desembre
Òrgan executor	Serveis Tècnics Districte Horta
Òrgans municipals implicats	Serveis Tècnics Districte Horta, Agència de l'Energia de Barcelona
Previsió participació	Comissió de Seguiment del projecte
Estat actual	Es demanarà a l'empresa SIEMENS un pressupost per revisar i millorar el sistema de control i per l'actualització del programa de domòtica de l'edifici. Des dels Serveis Tècnics del Districte es prepararà una proposta de projecte tècnic per a la millora de l'entrada (doble cancel·la). Des dels Serveis Tècnics del Districte es farà una proposta de millores dels sistemes passius (sensores moviments, substitució de la il·luminació halògena,...) amb la col·laboració del Casal. Des de l'AEB es recull la necessitat de tirar endavant amb el projecte de fotovoltàica que tenen previst a la teulada de l'edifici.



Títol	Renovem l'enllumenat del carrer Sorolla
Import	52.000 €
Previsió execució	2021 desembre – Reunió Comissió Seguiment 2022 Febrer – Resultats estudi lumínic
Previsió finalització	2022 desembre
Òrgan executor	Departament Enllumenat
Òrgans municipals implicats	Serveis Tècnics Districte Horta, Departament Enllumenat
Previsió participació	Comissió Seguiment del projecte
Estat actual	Enllumenat havia realitzat un estudi lumínic del carrer i està per sobre dels nivells reglamentaris. Tot i així, es pot mirar de millorar l'eficiència canviant a LED. També s'estudiaran reforçar els punts més foscos. A part d'això, l'AAVV farà recopilació dels punts foscos de la zona, ens els passarà per mail i nosaltres li passarem a enllumenat per tal que aquests facin l'estudi lumínic i possible proposta de millora. Encara no ha arribat aquest mail. Pel pressupost que tenim potser no serà possible encabir-los tots.



Títol	Carril bici a la ronda del Guinardó
Import	650.000 €
Previsió execució	2021 Novembre – Inici obres
Previsió finalització	2022 abril
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	BIMSA, Serveis Tècnics municipals
Previsió participació	No
Estat actual	Juliol 2021 aprovació inicial del projecte Setembre 2021 aprovació definitiva del projecte Novembre 2021 inici de l'obra Abril 2022 previsió finalització d'obra La intervenció donarà continuïtat a l'actual carril bici de la Ronda Guinardó



Títol	Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó
Import	1.600.000 €
Previsió execució	2022 gener – Contractació equip redactor 2023 juliol – inici d'obres (10 mesos)
Previsió finalització	2024 maig
Òrgan executor	BIMSA / Mònica Vila Arquitectura & Project Management SL.
Òrgans municipals implicats	BIMSA
Previsió participació	Comissió de Seguiment
Estat actual	A punt de començar la redacció de l'Avantprojecte. S'està convocant la reunió de llançament.



Títol	Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó
Import	300.000 €
Previsió execució	2021 novembre – Contractació equip redactor del projecte executiu 2022 febrer – Presentació de la proposta als promotors 2023 abril – inici obres (6 mesos)
Previsió finalització	2023 octubre
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Serveis Tècnics Districte Horta, Model Urbà, BCASA i BIMSA
Previsió participació	Comissió de Seguiment del projecte
Estat actual	Actualment l'Avantprojecte està en redacció. El 23.12.21 es va celebrar la Reunió de Llançament de la redacció de l'Avantprojecte El 18.01.22 es va sol·licitar el Llistat REP de l'actuació al Departament d'Inf. de Proj. i Recep. d'Obres. El 19.01.22 es va obtenir el Llistat REP (Nivell II) que inclou: Projectes Urbans, Parcs i Jardins, BCASA, El 25.01.22 es va celebrar la 2a Reunió de Seguiment de la Redacció projecte amb l'objectiu de veure la proposta.



Properes reunions



15 de febrer de 2022 – Millora pati Escola de les Aigües
Concreció de l'avantprojecte



14 de març de 2022 – Rehabilitem la part Històrica i Urbana del Parc del
Guinardó
Concreció de l'avantprojecte

Gràcies per la vostra participació



Ajuntament
de Barcelona
