

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment**
- 3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment**
- 4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes**
- 5. Estat dels projectes**



2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre els l'estat i contingut dels projectes.
- Detectar actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions

2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI






3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.






4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona
#DecidimPressupostos • Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7
Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
[Veure les fases](#)

[QUÈ ÉS?](#) [RESULTATS VOTACIÓ](#) [MÉS INFORMACIÓ](#)

Estat d'execució global



11,7%

[Descarregar dades en CSV](#)



Ciutat Vella



0%

9 Projectes



Eixample



11,3%

8 Projectes



Gràcia



12,5%

8 Projectes



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona

#DecidimPressupostos - Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

PAGE 7 DE 7

Impuls i seguiment dels projectes

04-07-2021 - 31-12-2022

Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Àmbits

Tots Ciutats Ciutats Vella Eixample Santa Monja Hortes Guinardó Gràcia Sant Martí Sant Gervasi Les Corts Nou Barris Sant Andreu

Execució global 12,6%

8 RESULTATS

✓	Fem una Gràcia més verda	10%
✓	Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola	15%
✓	Acabem amb els espais foscos a Gràcia	10%
✓	Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll	15%
✓	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri	15%
✓	Renovem l'àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn	15%
✓	Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36	5%
✓	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució	15%

Pressupostos participatius de Barcelona

#DecidimPressupostos - Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

PAGE 1 DE 1

Impuls i seguiment dels projectes

04-07-2021 - 31-12-2022

Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Execució global 11,7% - Espais de joc infantil 14,2%

Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució

Inici 2021-07-01

Fi 2023-04-30

Estat Redacció inicial

Descripció Redacció inicial del projecte. Inclou les següents actuacions: Estudi previ, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avançprojecte.

Progrés: 15%

Descripció breu: Ampliar i millorar l'àrea de joc infantil d'aquesta plaça. Per això, es planteja incorporar elements de joc per als infants de totes les edats, així com elements que facin ombra, per tal que la plaça esdevingui un espai més agradable i jugable.

Descripció amplada: L'actual àrea de jocs infantils d'aquesta plaça és molt petita i està en mal estat. A més a més, les estructures de joc són antigues i no s'adapten a les necessitats de les diferents edats dels infants.

El projecte pretén ampliar l'espai jugable i deixar-lo sense tancar, però incorporant-hi elements que protegeixin els infants dels vehicles. La remodelació preveu incloure-hi elements de joc més moderns i diversos per a infants d'edats diferents.

D'altra banda, el projecte inclou buscar alguna solució que permeti crear espais ombrívols, en especial durant els mesos d'estiu. La plaça està damunt d'un pàrquing, per la qual cosa no és possible plantar-hi més arbres.

Incorporació de la perspectiva de gènere: Pensar el projecte amb una mirada inclusiva on nens i nenes de diferents edats puguin jugar.

Persones o entitats impulsores: Dones de la Plaça Romani

Espais de joc infantil La Vila de Gràcia

Versió 5 (de 5)

Veure altres versions

EDITAT PER ÚLTIMA VEGADA PER Dinamització Democràcia Activa

DIÀLEG D'ACTUALITZACIÓ EL 30/12/2021 10:52

Referència: BCI-REGU-2021-07-11159

Compartir

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 2021-10-10 Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2021-10-10 Sessió participativa amb infants a PL Revolució
- 2021-10-10 Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avançprojecte

PROJECTES INCLOSOS EN AQUEST RESULTAT


✓ Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució

Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes






4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

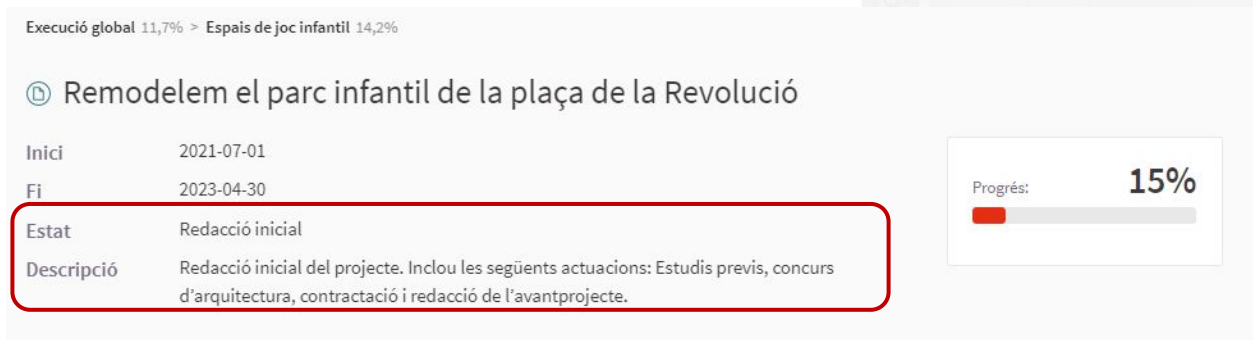

ESTATS D'EXECUCIÓ:

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat

4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 1 2021-10-19
Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2 2021-11-05
Sessió participativa amb infants a Pl. Revolució
- 3 2021-12-20
Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte

DOCUMENTS RELACIONATS

[Retorn sessió participativa amb infants pdf 1 MB](#)
[Retorn sessió participativa amb infants \(13 de novembre de 2021\)](#)



5. Estat dels projectes

Projectes	Import
Iniciem carril bici per Travessera de les Corts	345.000 €
Pacifiquem l'entorn de Vallespir amb Travessera!	120.000 €
Fem créixer el verd a Les Corts	472.500 €
Ampliem recursos per a entitats juvenils	52.000 €
Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància	260.000 €
Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts	70.000 €
Millorem el parc de la Colònia Castells	150.000 €
Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras	500.000 €



5. Estat dels projectes

Títol	Iniciem carril bici per Travessera de les Corts
Import	345.000 €
Previsió execució	2022 – Equip redactor contractat per fer projecte executiu. Avantprojecte febrer 2022 Redacció del projecte: març 22-setembre 22 Execució de les obres: gener -abril 23
Previsió finalització	
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Mobilitat
Previsió participació	
Estat actual	• L'àmbit de l'actuació. (GV Carles III fins a Numancia) Ho redactarem tot en 2 àmbits, doncs amb la dotació de pressupostos participatius es pot fer la primera part. Fase 1 execució GV Carles III fins a Joan Güell



5. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem l'entorn de Vallespir amb Travessera!
Import	120.000 €
Previsió execució	Projecte executiu auditat i aprovat: Abril 22-set 22 Aprovació administrativa: desembre 22 Licitació de les obres: setembre 22-gener 23 Execució de les obres: febrer 23-maig 23
Previsió finalització	
Òrgan executor	BIMSA- Entorn escolars
Previsió participació	Comunitat educativa i veïns
Estat actual	2022 – Redacció Avantprojecte: gener 22-abril 22 Març, reunió amb promotors i equip redactor per avantprojecte.



5. Estat dels projectes

Títol	Fem créixer el verd a Les Corts
Import	472.500 €
Previsió execució	Mitgera verda Jardins Josep Goday: Contacte amb comunitat de propietaris per a la signatura de l'acord d'intervenció. Previsió és tenir l'acord firmat i el projecte tancat a finals de març. Mur Pedralbes: Vegetalització de la part del mur de l'edifici més propera a Diagonal: mitjans de març esperem tenir una idea de projecte consensuada amb Generalitat, Patrimoni i Districte.
Òrgan executor	IMPU amb Agencia Energia
Òrgans municipals implicats	Generalitat
Previsió participació	Promotors projecte Abril
Estat actual	Mitgera verda Jardins Josep Goday: Ens trobem en fase de redacció de projecte executiu juntament amb l'Agencia de l'Energia.



5. Estat dels projectes

Títol	Ampliem recursos per a entitats juvenils
Import	52.000 €
Previsió execució	Compra de material (taules, cadires, lones i carpes) Estem treballant per trobar la millor formula de gestionar la compra de material.
Òrgan executor	DISTRICTE i enllumenat
Estat actual	Enllumenat: Nou armari llum a Gandesa. Pendent plànol. • Instal·lació març 2022 • Embrancament d'Endesa setembre 2022 • Gestió CUPS, DR (Declaració Responsable), projecte legalització i acusament de rebuda setembre'22 Adequacions : • plaça Can Rosés: 8 d'abril • plaça Concòrdia : 1 de març



5. Estat dels projectes

Títol	Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància
Import	260.000 €
Previsió execució	2021 – Recull criteris bàsics dels promotors 2022 – Adjudicat redactor projecte Abril avantprojecte Juny-novembre projecte executiu
Previsió finalització	2023 1a fase
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte-Mobilitat.
Previsió participació	
Estat actual	Ampliació de pressupost per part del Districte en 200.000 euros



5. Estat dels projectes

Títol	Instal•lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts
Import	70.000 €
Previsió execució	2022 • Gen-feb: redacció avantprojecte • Feb-abril: redacció executiu • maig-set: licitació obres • octubre-nov :obres
Previsió finalització	
Òrgan executor	DISTRICTE
Previsió participació	
Estat actual	



5. Estat dels projectes

Títol	Millorem el parc de la Colònia Castells
Import	150.000 €
Previsió execució	2021-Definició dels usos (Pla Funcional) de les 11 casetes de memòria històrica 2022-Estudis Previs (IMU) S'està redactant l'avantprojecte, que servirà de base per fer el planejament a partir del qual les casetes que s'hagin de mantenir i rehabilitar estiguin reconegudes urbanísticament. Un cop aprovat el planejament es podrà redactar el projecte executiu i licitar les obres.
Previsió finalització	
Òrgan executor	IMU
Òrgans municipals implicats	Historia, planejament



5. Estat dels projectes

Títol	Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
Import	500.000 €
Previsió execució	Redacció executiu: febrer 22- novembre22 Aprovació administrativa: desembre 22-març 23 licitació: desembre-maig23 Inici obres: abril 23
Previsió finalització	
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Biblioteques
Previsió participació	
Estat actual	El 9.2.22 es va realitzar una visita a les instal·lacions

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**
