

Primera Comissió de Seguiment Pressupostos Participatius 2024-2027

Districte de Les Corts

16 de Juliol de 2025

Projectes finalistes:

1. **Ca la Panarra. Millores per a un equipament jove més versàtil**
 2. **Transformem el pati de l'Escola Barcelona en un espai viu per aprendre, créixer i compartir**
 3. **Un nucli antic de Les Corts més segur amb una millor il·luminació**
 4. **Recuperació del jardí històric de Torre Girona i la seva biodiversitat**
 5. **El camí del Pi de Les Corts. Un recorregut més amable i segur per a tothom**
 6. **Ampliació del carril bici a la Travessera de les Corts (segon tram)**
 7. **Un futur més pacificat dels Jardins Bacardí per facilitar-ne l'ús per a les persones**
 8. **Protecció contra el sol i millora dels jocs infantils del parc de Les Corts**
-

Gestió i Dotació:

DTE	04 LC	Ca la Panarra. Millores per a un equipament jove més versàtil.	60.000 €
CEB	04 LC	Transformem el pati de l'Escola Barcelona en un espai viu per aprendre, créixer i compartir	275.000 €
BIMSA	04 LC	Un nucli antic de Les Corts més segur amb una millor il·luminació	110.000 €
BIMSA	04 LC	Recuperació del jardí històric de Torre Girona i la seva biodiversitat	240.000 €
DTE	04 LC	El Camí del Pi de Les Corts. Un recorregut més amable i segur per a tothom.	145.000 €
BIMSA	04 LC	Ampliació del carril bici a la travessera de Les Corts (segon tram)	430.000 €
DTE-BIMSA	04 LC	Un futur més pacificat dels Jardins Bacardí per facilitar-ne l'ús per a les persones	200.000 €
BIMSA	04 LC	Protecció contra el sol i millora dels jocs infantils del parc de Les Corts	495.000 €
Total 04 LC			1.955.000 €

Fases dels projectes:

1. Reunió impulsors/es
 2. Adjudicació redacció del projecte (Acord marc o Licitació)
 3. Redacció del projecte
 - Avantprojecte
 - Maqueta Executiu
 4. Aprovació tècnica (fase informes REPs/REMs i Auditoria)
 5. Aprovació administrativa i licitació de l'obra
 6. Gestions prèvies inici d'obra
 7. Obra
-


01

Recuperació del Jardí històric de Torre Girona i la seva biodiversitat



01


Àmbit

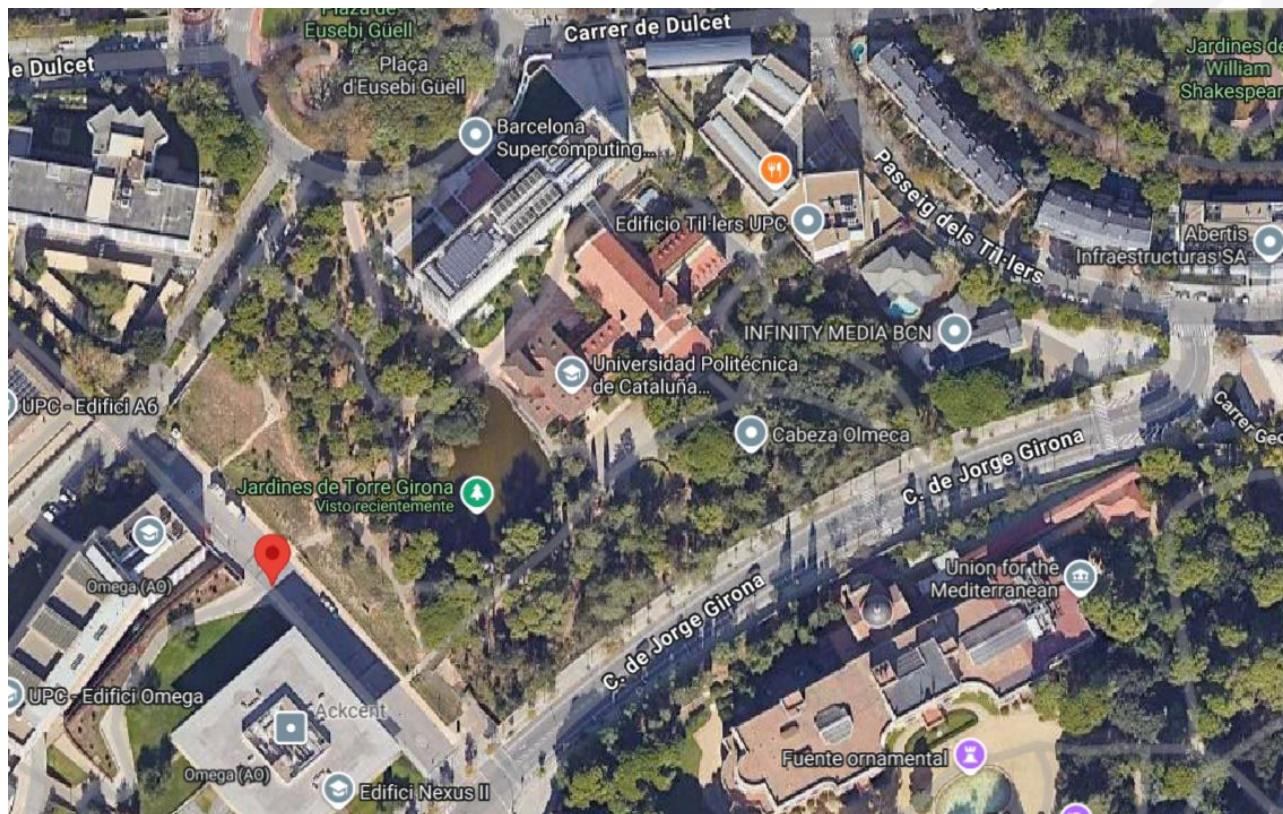

01

Àmbit



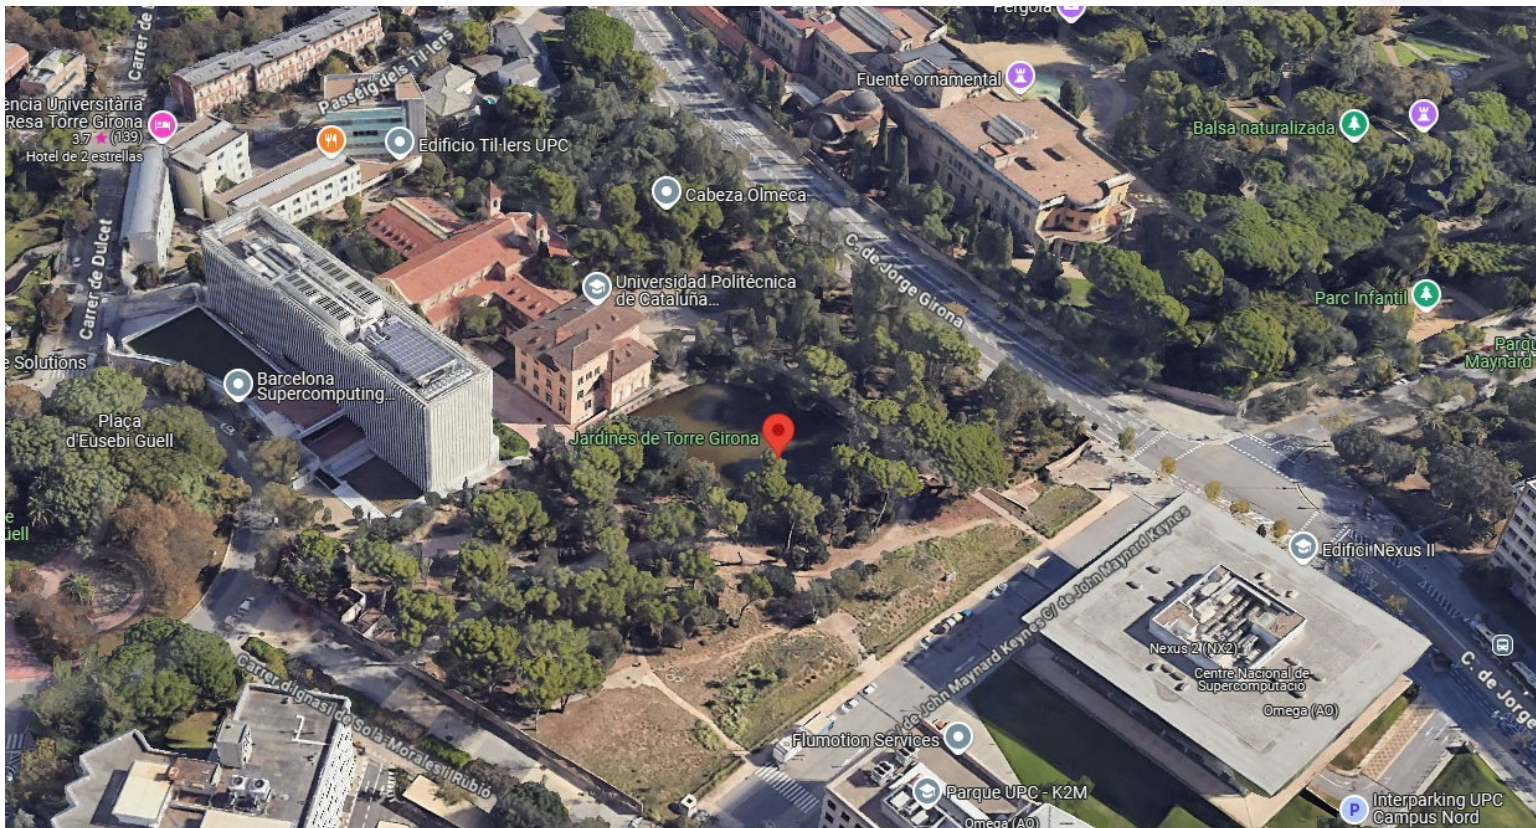

02

Estimació econòmica

Cost total	Comentaris
240.000€ (Avantprojecte, Estudi Històric, Estudis Previs (topogràfic, geotècnic, terres contaminades, renders...) i Projecte Executiu)	El cost estimat de la redacció del Projecte de reforma integral (Avantprojecte, Estudi Històric, Estudis Previs i Projecte executiu) de tot l'àmbit comptabilitzant una superfície d'uns 20.300m2 seria d'uns 240.000€. <u>Accions:</u> • Projecte executiu de reforma integral del Jardí de Torre Girona. • Anàlisi i diagnòstic acurat del verd, vegetació natural, els estanys d'aigua, la fauna (mamífers, invertebrats i aus) i els seus corredors ecològics per tal de mantenir les espècies vegetals i arbòries originals del jardí i potencia les autòctones en els espais malmesos i residuals. • Anàlisi i diagnòstic acurat dels elements històrics i patrimonials del jardí. • Revisar els itineraris i camins, reparar les vores dels camins malmesos, i delimitar els camins en les zones més sensibles limitant l'amplada per conservar el màxim el jardí històric. • Reforç de la presència d'esquirols, mitjançant el estudi de la seva presència, estudiant el corredor ecològic que fan servir per desplaçar-se cap als Jardins del Palau de Pedralbes i viceversa.


03

Estimació de calendari

Reunió impulsors/es		Juliol '25
Contractació i redacció Estudi històric	3 mesos	Setembre '25 - Novembre '25
Preparació plec	1 mes	Desembre '25
Adjudicació redacció del projecte (Acord marc)	2 mesos	Gener '26 – Febrer '26
Redacció del projecte	9 mesos	Març '26 - Gener '27
- Avantprojecte (5 mesos)		
- Maqueta Executiu: fases (4 mesos)		
Aprovació tècnica	6 mesos	Febrer '27 - Juliol '27
Aprovació administrativa i licitació de l'obra	6 mesos	
<i>(Supeditat a la dotació econòmica per a les obres)</i>		
DURADA TOTAL FINS INICI OBRA	27 mesos	

01

**Un futur més pacificat dels Jardins
Bacardí per facilitar-ne l'ús per a les
persones**




01

Àmbit



01

Àmbit

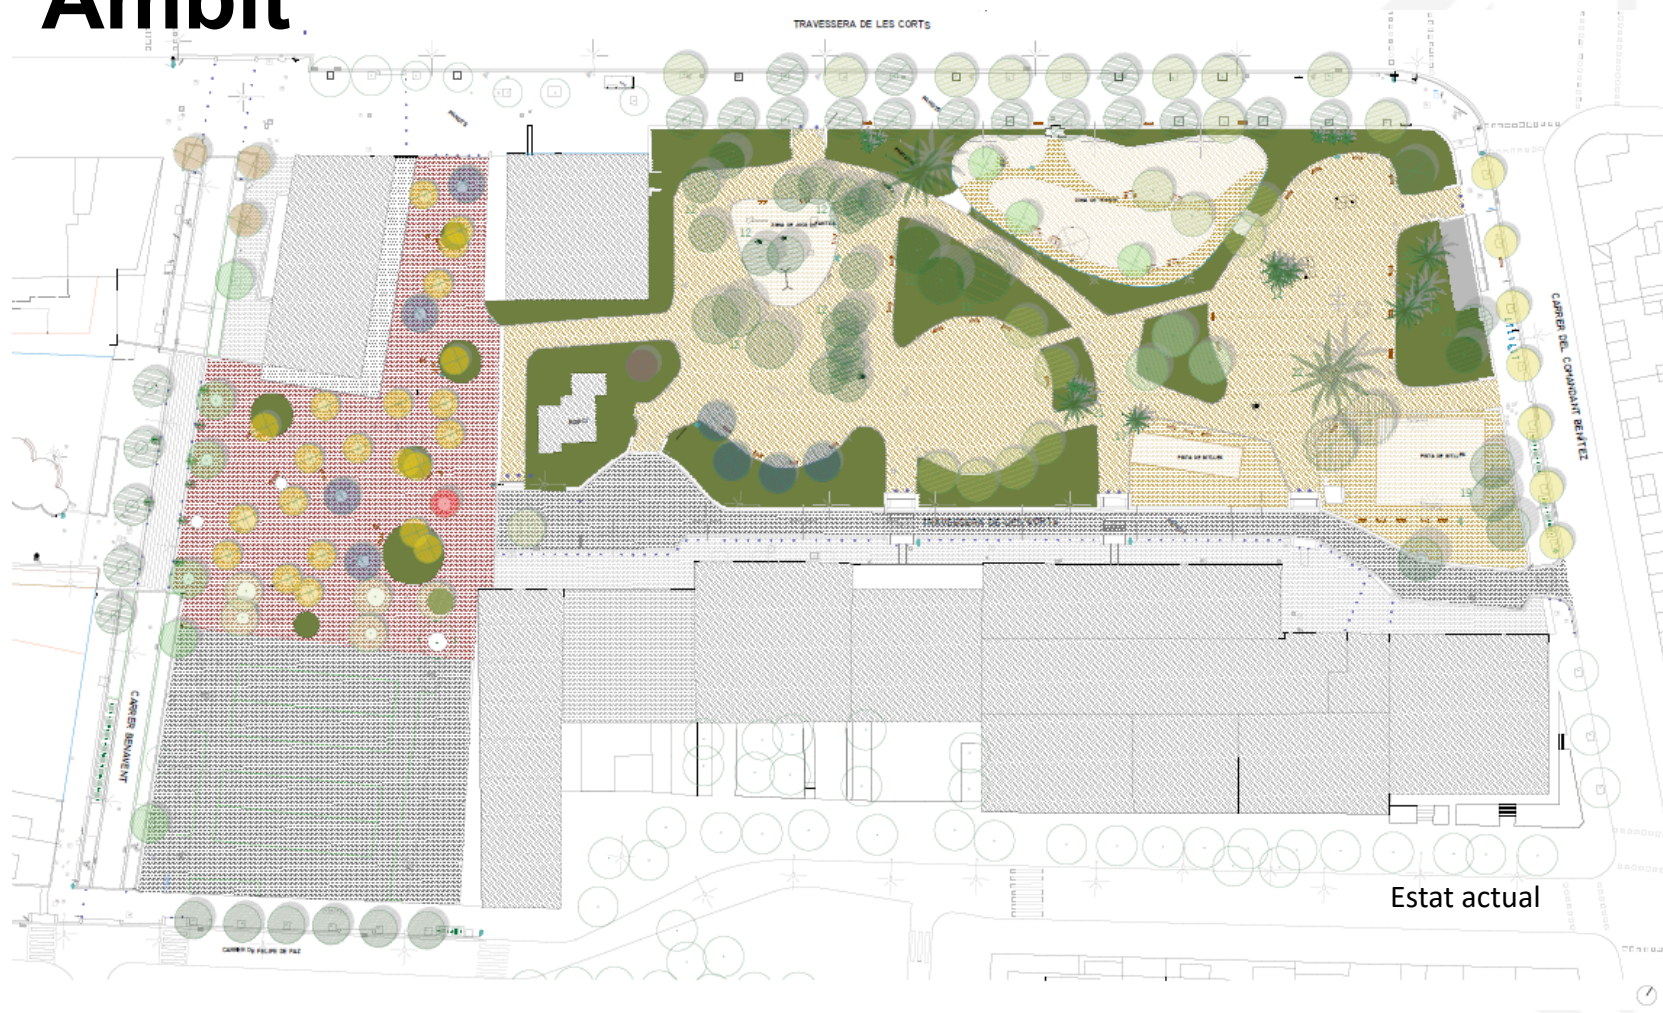



02

Estimació econòmica

Cost total	Comentaris
200.000€ Estudi de mobilitat dels entorns dels Jardins Bacardí - 18.000€ (redacció Mobilitat) + 12.000€ arranjaments puntuals) + 170.000€ per al projecte i Obra de la millora del verd a l'entorn més pròxim, consolidació preexistències i millora de la seguretat	El cost estimat: • Estudi de pacificació de la mobilitat a l'àmbit Riera Blanca / Travessera / Carles III/ Av Madrid, tindria un cost de 18.000€ la redacció del document + 12.000€ d'obres d'arranjaments puntuals. • Millora del verd a l'entorn més pròxim, consolidació de les preexistències i millora de la seguretat de l'entorn seria de 170.000€ (Projecte i Obra). • El cost total estimat de l'actuació seria d'uns 200.000€. Accions: • Millora del verd a l'entorn més pròxim, consolidació de les preexistències i millora de la seguretat de l'entorn. • Estudi de pacificació de la mobilitat a l'àmbit Riera Blanca / Travessera / Carles III / Av Madrid


03

Estimació de calendari



Reunió impulsors/es		Juliol '25
Adjudicació redacció del projecte	2 mesos	Juliol '25 - Agost '25
Redacció del projecte	2 mesos	Setembre '25 - Octubre '25
- Projecte (2 mesos)		
Aprovació tècnica	1 mes	Novembre '25
Aprovació administrativa i licitació de l'obra	6 mesos	Desembre '25 - Maig '26
Gestions prèvies i inici d' obra	1 mes	Juny '26
DURADA TOTAL FINS INICI OBRA	12 mesos	

01

**Protecció contra el sol i millora dels
jocs infantils de la Plaça de Les
Corts**



01 Àmbit

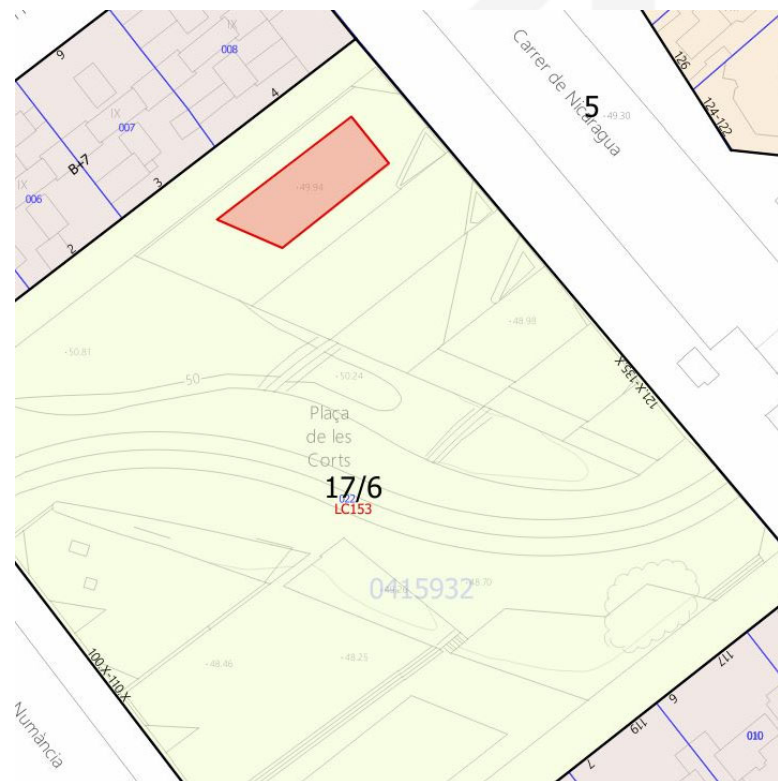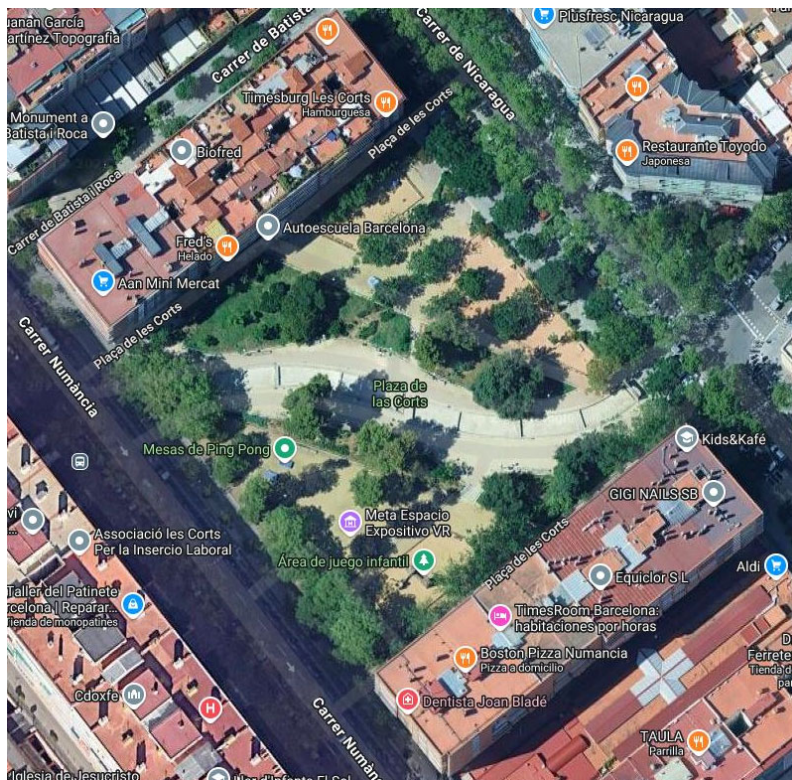



02

Estimació econòmica – Pla Endreça

Cost total

495.000€

(66.000€ tendals amb excavació + 29.000€ incorporació de mobiliari urbà (bancs i papereres) + 400.000€ nova àrea de jocs infantil)

Comentaris

Accions:

- La implantació de tendals considerant en aquest cas la instal·lació de tendals amb una estructura fixe amb excavació per a cobrir l'espai de joc infantil amb sorral (aprox. 165m2) seria de 66.000€.
- La millora del mobiliari urbà, bancs i papereres, seria de 29.000€
- La renovació dels jocs infantils, més inclusius i més moderns, seria de 400.000€

El cost total estimat de l'actuació seria d'uns 495.000€.

03

Estimació de calendari


Reunió impulsors/es	Juliol '25
Redacció Plecs	3 mesos (*)
Licitació redacció Projecte (Lots)	6 mesos (*)
Redacció Memòria valorada	2 mesos
Aprovació tècnica + Auditoria	1 mes
Aprovació administrativa (Única) i adjudicació de l'obra	1 mes
Obra	2 mesos
(*) Pendent de confirmar	
DURADA TOTAL (INCLOSA DURADA DE L'OBRA)	15 mesos

01


**Un nucli antic de Les Corts més segur
amb una millor il·luminació**



01 Àmbit

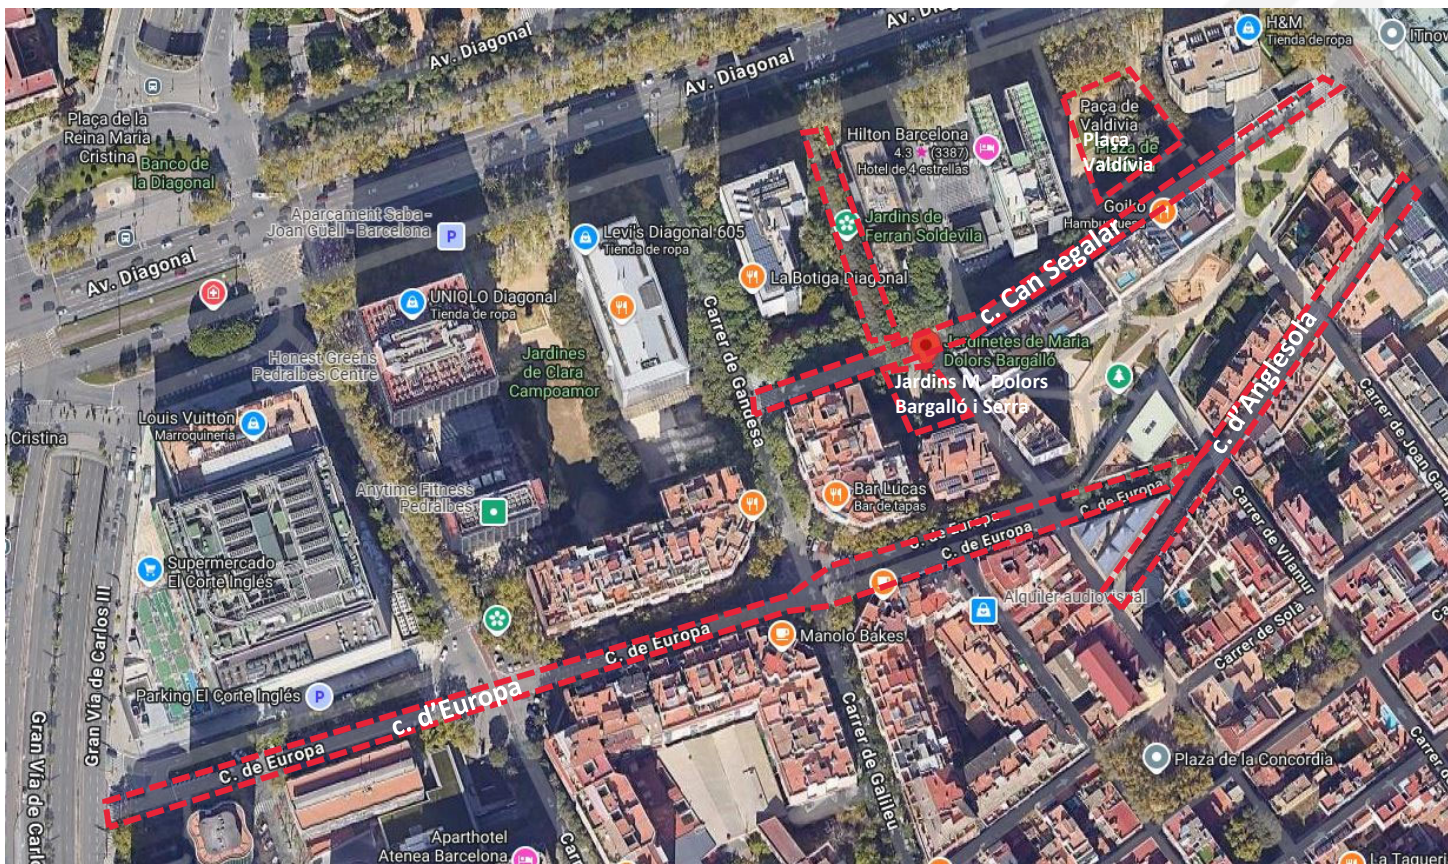

01

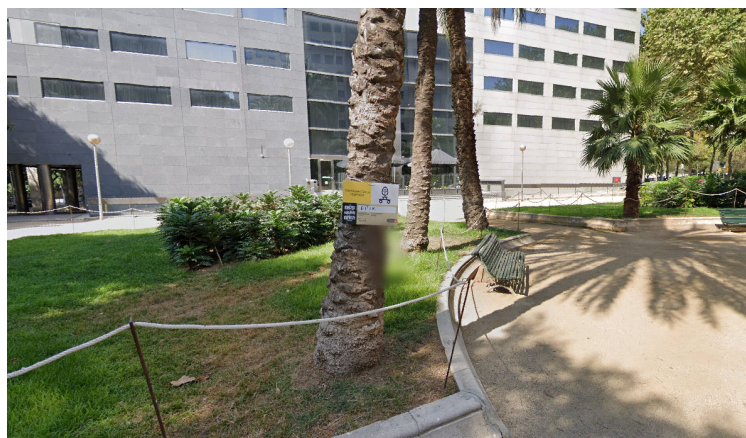



02

Estimació econòmica – Pla Endreça

Cost total	Comentaris
110.000€	<u>Accions:</u> ● Renovació de l'enllumenat de la Plaça Valdivia (es planteja enllumenat nou amb renovació de línies i punts de llum millor distribuïts) ● Reforçar il·luminació i canvi a LED al C/ Can Segalar banda muntanya i mar (canvi a LED de tots els punts de llum de Can Segalar que actualment són amb descàrrega i reforços a vorera especialment costat muntanya) ● Reforçar il·luminació i canvi a LED als Jardins Ferran Soldevilla (tram comprès entre el C. de Can Segalar i l'Avinguda Diagonal) ● Reforçar il·luminació als Jardins Maria Dolors Bargalló (reorientació d'un dels punts de llum per mirar de repartir millor la llum. (Ja són LED)) ● Reforçar il·luminació al Carrer Europa (mirar de fer reprogramació dels drivers per incrementar intensitat. (Ja son LED)) ● Reforçar il·luminació al Carrer d'Anglesola (mirar de fer reprogramació dels drivers per incrementar intensitat. (Ja son LED))


03

Estimació de calendari

Reunió impulsors/es	Juliol '25
Redacció Plecs	3 mesos (*)
Licitació redacció Projecte (Lots)	6 mesos (*)
Redacció Projecte	3 mesos
Aprovació tècnica+Auditoria	1,5 mesos
Aprovació administrativa (Única) i adjudicació de l'obra	1 mes
Obra	4 mesos
(*) Pendent de confirmar	
DURADA TOTAL (INCLOSA DURADA DE L'OBRA)	18,5 mesos

01

**Ampliació del carril bici a la
Travessera de les Corts (segon tram)**



01 Àmbit



02

Estimació econòmica:

Cost total	Comentaris
430.000€	<u>Accions:</u> • Construcció del carril bici de la Travessera de les Corts entre el Carrer Joan Güell fins al carrer de Numància. • Connexió amb els carrils bici dels carrers de Joan Güell i Numància. • Millora de l'entorn escolar.

03

Estimació de calendari

Reunió impulsors/es		Juliol '25
Revalidació ITP + Actualització de preus + nous requeriments REPS + Auditoria	5 mesos	Maig '25 - Octubre '25
Aprovació administrativa i adjudicació de l'obra	4 mesos	Nov. '25 - Febrer '26
Gestions prèvies inici d'obra	1 mes	Març '26
Obra	4 mesos	Abril '26 - Juliol '26
DURADA TOTAL (INCLOSA DURADA DE L'OBRA)	14 mesos	

Gràcies per la vostra col·laboració!

www.ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca



**Ajuntament
de Barcelona**
