



Ajuntament
de Barcelona

DECIDIM.
BARCELONA

Il·lustríssimes veïnes i veïns



Pressupostos participatius 2020-2023

Projectes seleccionats al Districte de Sant Martí

Actualització - Dimarts 8 de febrer de 2022



ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment**
- 3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment**
- 4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes**
- 5. Estat dels projectes**



2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS

- Impuls del desenvolupament dels projectes.
- Seguiment de l'execució d'aquests projectes.

CALENDARI






3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment


MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.
- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.





4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

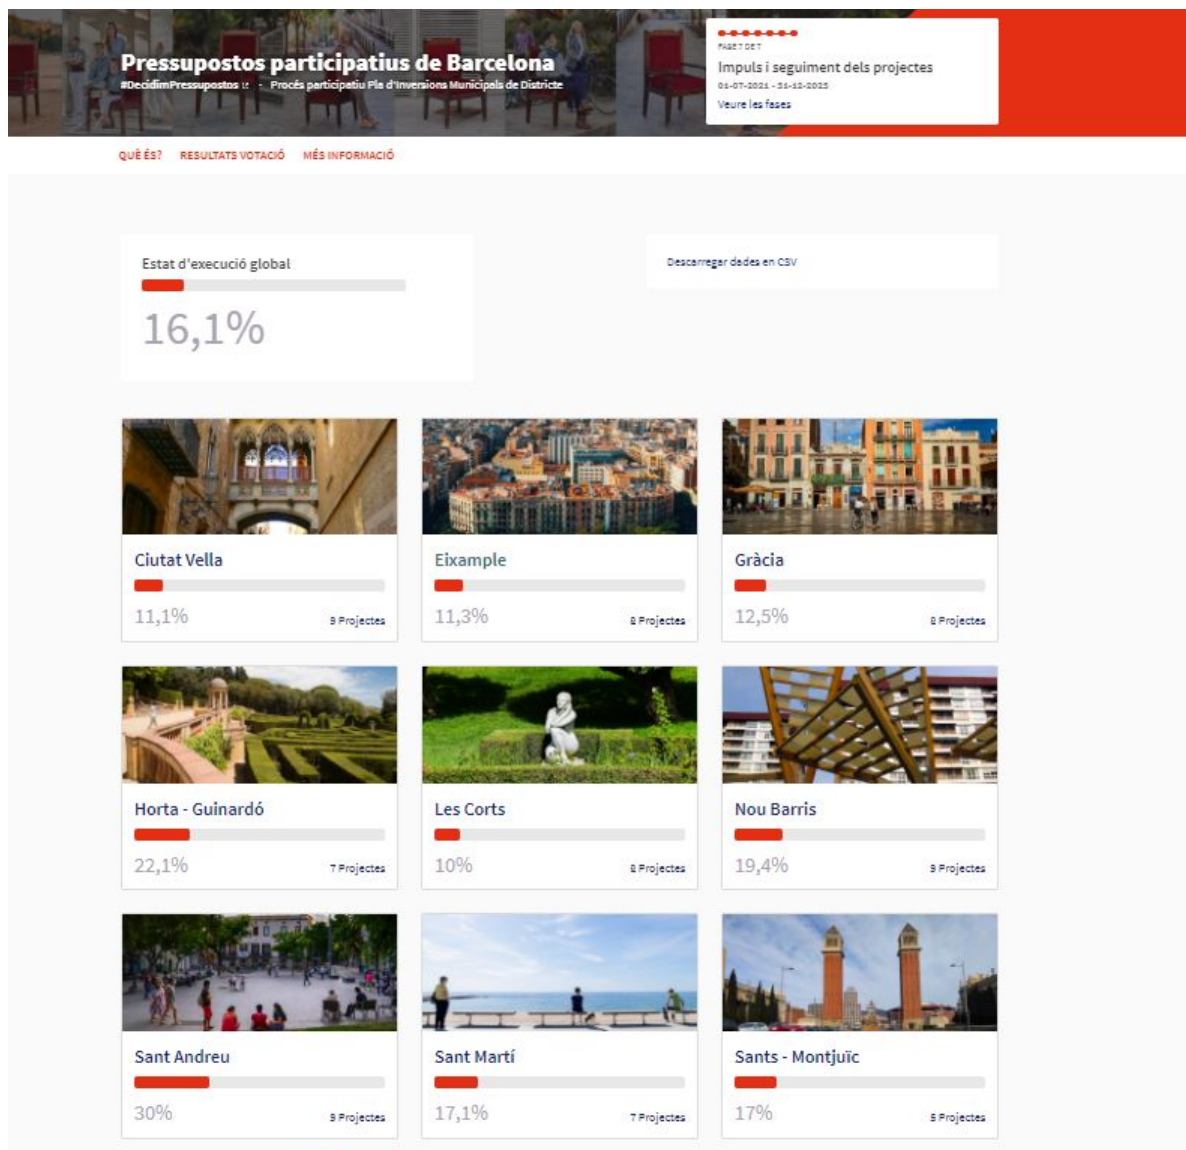



4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

Pressupostos participatius de Barcelona

#DecidimPressupostos · Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7

Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Àmbits

Tots Ciutat Ciutat Vella Eixample Sants - Montjuïc Horta - Guinardó Gràcia Sarrià - Sant Gervasi Les Corts Nou Barris Sant Martí Sant Andreu

✓	Convertim el pati de l'Escola La Farigola en un pulmó verd del barri	10%
✓	Fem una superilla al Camp de l'Arpa del Clot	10%
✓	Fem possible el nou model d'hort urbà al Clot	10%
✓	Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris	10%
✓	Construïm una cuina a l'Escola La Pau	10%
✓	Pacifiquem els entorns de l'Escola Pere IV i de l'Institut Quatre Cantons	20%
✓	Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou	20%

Pressupostos participatius de Barcelona

#DecidimPressupostos · Procés participatiu Pla d'Inversions Municipals de Districte

FASE 7 DE 7

Impuls i seguiment dels projectes
01-07-2021 - 31-12-2023
Veure les fases

QUÈ ÉS? RESULTATS VOTACIÓ MÉS INFORMACIÓ

Execució global: 15,7% · Pacificació o remodelació de carrers: 11,3%

Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou

Inici: 2021-07-01
Fi: 2023-12-31
Estat: Redacció inicial
Descripció: Redacció inicial del projecte. Inclou les següents actuacions: Estudi preliminar, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.

Progrés: 20%

Descripció breu: Plantegem l'execució de diverses mesures, tant per millorar la seguretat viària com per crear espais multifuncionals destinats a l'ús esportiu i cultural de les famílies i del veïnat.

Descripció ampliada: Contemplem desenvolupar, amb la participació del veïnat, diverses actuacions per millorar la seguretat viària d'aquesta zona i crear-hi espais multifuncionals de tipus esportiu i cultural.

Per tant, plantegem que es faci una pista de bàsquet en una zona sense veïns ni veïnes (al carrer de Badajoz, a l'altura de BTV), amb taules i banca, així com una graderia o un escenari multifuncional per fer-hi actuacions que algun d'interès per al veïnat, amb capacitat per a un màxim de cinquantes persones, i que disposi d'un espai d'emmagatzematge.

També contemplem aplicar mesures per pacificar el trànsit, en especial al carrer de Roc Boronat, i col·locar senyals nous per reforçar la preferència dels vianants. A més a més, plantegem una intervenció artística per pintar el paviment amb la finalitat d'ampliar la zona d'ús dels veïns i veïnes i de millorar-ne la seguretat, així com un augment i una millora de les zones verdes i de l'arbrat.

Incorporació de la perspectiva de gènere: Millora la seguretat de tota els veïns i veïnes i molt especialment dels infants. Afavorir la vida familiar i quotidiana i crear una ciutat amable per tothom.

Persones o entitats impulsores: Col·lectiu Superilla Poblenou.

Pacificació o remodelació de carrers: al Parc i la Llacuna del Poblenou

EVOLUCIÓ DEL PROJECTE


- 2021-10-01 Reunió amb les promotores del projecte
- 2022-06-01 Avantprojecte en redacció

PROJECTES INCLOSOS EN AQUEST RESULTAT

✓ Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou




4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes

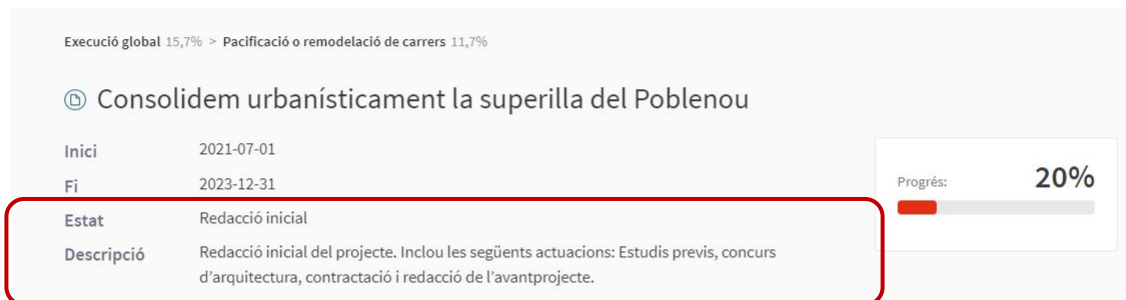

ESTATS D'EXECUCIÓ:

% d'execució	Títol	Descripció / Contingut
5% - 10%	Trobada amb els i les promotores	Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.
10 - 20 %	Redacció inicial	Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte.
20 % - 30 %	Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat	Si s'escau
30 % - 35 %	Redacció inicial finalitzada	Redacció del projecte executiu.
35% - 50%	Tramitació administrativa de les obres	Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el Comitè d'Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.
50% - 80%	Desenvolupament de les obres (iniciat)	Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l'execució del projecte.
80% - 99%	Desenvolupament de les obres (avançat)	En obres
100%	Finalitzat	Aquest projecte d'inversió ja ha finalitzat

4. Decidim: Seguiment de l'execució dels projectes



EVOLUCIÓ DEL PROJECTE

- 1 2021-10-19
Reunió de llançament del projecte amb les promotores
- 2 2021-11-05
Sessió participativa amb infants a Pl. Revolució
- 3 2021-12-20
Redacció inicial del projecte: realització d'estudis previs, equip d'arquitectes contractat i redactant l'avantprojecte

DOCUMENTS RELACIONATS

[Retorn sessió participativa amb infants pdf 1 MB](#)
[Retorn sessió participativa amb infants \(13 de novembre de 2021\)](#)



5. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte
Convertim el pati de l'Escola Farigola en un pulmó verd del barri	350.000 €
Fem una superilla al Camp de l'Arpa del Clot	390.000 €
Fem possible el nou model d'hort urbà al Clot	725.000 €
Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris	1.000.000 €
Construïm una cuina a l'Escola La Pau	400.000 €
Pacifiquem els entorns de l'Escola Pere IV i de l'Institut Quatre Cantons	250.000 €
Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou	365.000 €



5.1. Estat dels projectes

Títol	Convertim el pati de l'Escola Farigola en un pulmó verd del barri
Import	350.000 €
Previsió execució	<u>2021</u> – Reunió promotores <u>2022</u> – Avantprojecte, projecte bàsic i executiu, licitació, inici obres (juny-juliol)
Previsió finalització	Setembre 2022
Òrgan executor	Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)
Òrgans municipals implicats	Districte de Sant Martí CEB
Previsió participació	No
Estat actual	Redacció avantprojecte



5.2. Estat dels projectes

Títol	Fem una superilla al Camp de l'Arpa del Clot
Import	390.000 €
Previsió execució	<u>2021</u> – Reunions promotores, Pla d'acció Superilla <u>2022</u> – Licitació redactors, avantprojecte i projecte executiu <u>2023</u> – Inici obres (abril)
Previsió finalització	3er trimestre 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte de Sant Martí Equip Superilles
Previsió participació	Sí
Estat actual	Pla d'Acció Superilles



5.3. Estat dels projectes

Títol	Fem possible el nou model d'hort urbà al Clot
Import	725.000 €
Previsió execució	<u>2021</u> – Redacció estudi contaminació de terres <u>2022</u> – Contractació, redacció del projecte, tramitació tècnica i administrativa , inici d'obres (novembre) <u>2023</u> – Finalització obres (febrer)
Previsió finalització	Febrer 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte de Sant Martí
Previsió participació	No
Estat actual	Estudi de reconeixement del terreny Contractació redactors del projecte



5.4 Estat dels projectes

Títol	Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris
Import	1.000.000 €
Previsió execució	<u>2021</u> – Reunions promotores <u>2022</u> – Licitació projecte, redacció , tramitació administrativa i projecte <u>2023</u> – Licitació obres , inici obres: març 2023
Previsió finalització	Octubre 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte de Sant Martí
Previsió participació	No
Estat actual	Contractació redactors del projecte



5.5. Estat dels projectes

Títol	Construïm una cuina a l'Escola La Pau
Import	400.000 €
Previsió execució	2021 – Reunió amb promotores del projecte 2022 – Redacció, contractació, inici i final obres
Previsió finalització	Octubre 2022
Òrgan executor	Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)
Òrgans municipals implicats	Districte de Sant Martí CEB
Previsió participació	No
Estat actual	Redacció avantprojecte Contractació redactors del projecte



5.6. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem els entorns de l'Escola Pere IV i de l'Institut Quatre Cantons
Import	250.000 €
Previsió execució	<u>2021</u> – Reunió promotores <u>2022</u> – Redacció projecte, aprovació administrativa, inici obres (desembre) <u>2023</u> – Finalització obres (abril)
Previsió finalització	Abril 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte de Sant Martí
Previsió participació	No
Estat actual	Redacció del projecte



5.7 Estat dels projectes

Títol	Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou
Import	365.000 €
Previsió execució	<u>2021</u> – Reunió promotores <u>2022</u> – Redacció del projecte, tramitació i aprovació, inici obres(octubre) <u>2023</u> – Finalització obres (abril)
Previsió finalització	Abril 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte de Sant Martí
Previsió participació	No
Estat actual	Contractació redacció del projecte

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**
