

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Enquestes de valoració**
- 4. Estat dels projectes**




2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres.
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions.

CALENDARI

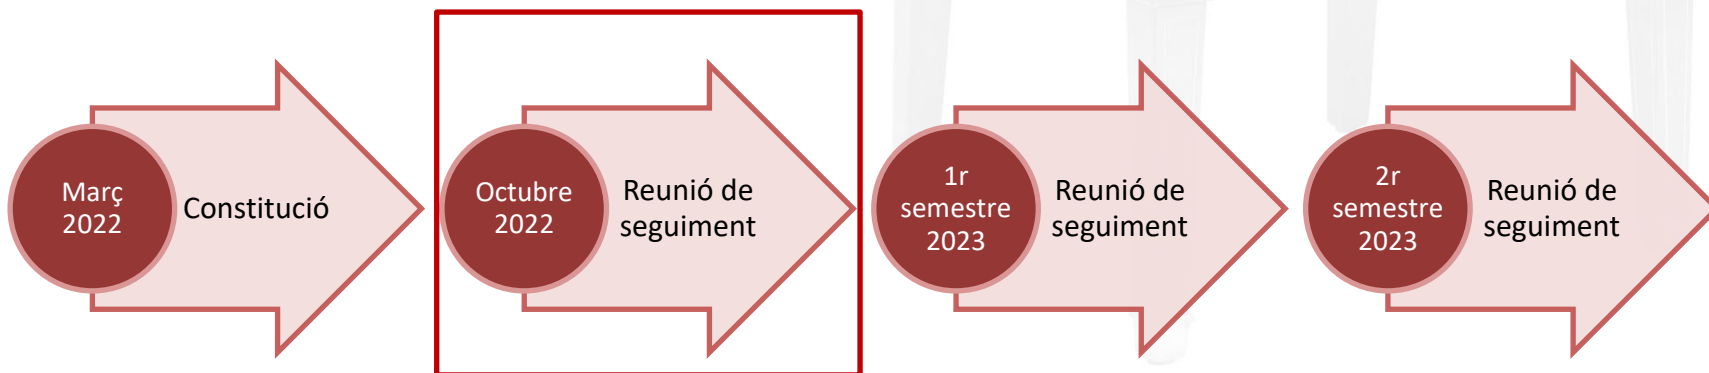



3. Enquestes de valoració

Valorar la **fase de l'execució** dels projectes i **valorar el projecte executat**

EXECUTAT COMPLETAMENT

NO EXECUTAT COMPLETAMENT

Sessions de debat, incidència en la definició del projecte final executat, comunicació amb tècnics ajuntament, problemes d'aquesta fase, ajust entre projecte proposat i el que vau proposar, nivell de satisfacció...

S'enviarà correu personalitzat amb l'enllaç al formulari

La durada aproximada de resposta és d'uns 10 minuts.

Millorar la participació a Barcelona.

El registre de les respostes no recollirà cap dada personal.



4. Estat dels projectes

Projecte	Import del projecte
Millorem el parc de l'Espanya Industrial	850.000 €
Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris	1.600.000 €
Pacifiquem Sants antic	200.000 €
Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins	850.000 €
Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives	70.000 €



4. Estat dels projectes

Trobada amb els i les promotores

Redacció inicial

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat

Redacció inicial finalitzada

Tramitació administrativa de les obres

Desenvolupament de les obres (iniciat)

Desenvolupament de les obres (avançat)

Finalitzat

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Pacifiquem Sants antic →

Millorem el parc de l'Espanya Industrial →

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris →

Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins →

Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives →

PERCENTATGE D'EXECUCIÓ



4. Estat dels projectes

CALENDARI DE FINALITZACIÓ DELS PROJECTES

2022

2023

2024

oct	nov	des	gen	feb	març	abril	maig	juny	juliol	ago	set	oct	nov	des	gen	feb
-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	------	------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives



Pacifiquem Sants antic

Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins

Millorem el parc de l'Espanya Industrial

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris



4. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem Sants antic
Import	200.000 €
Barri	Sants
Previsió execució	2021 – Elaborar el Pla d'Acció 2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 2023 – Obres d'abril a agost.
Previsió finalització	Agost 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, equip de Superilles i Mobilitat
Percentatge d'execució	30% (propera actualització finals novembre)
Estat actual	Projecte executiu en redacció

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11115>



4. Estat dels projectes

Títol	Millorem el parc de l'Espanya Industrial
Import	1.100.000€
Barri	Sants-Hostafrancs
Previsió execució	2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu. 2023 – Obres de juny 2023 a gener 2024
Previsió finalització	gener 2024
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, Parcs i Jardins, i BCASA
Percentatge d'execució	35% (propera actualització gener 2023)
Estat actual	Redacció inicial finalitzada. Projecte executiu en redacció (definitiu: gener 23)

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11113>



4. Estat dels projectes

Títol	Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris
Import	1.600.000 €
Barri	Poble-sec
Previsió execució	2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 2023 – Abril inici de les obres, finalització al setembre finalització de les obres
Previsió finalització	octubre 2023 (abans març 24)
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, Institut Barcelona Esports i els gestors de la instal·lació
Percentatge d'execució	40% (propera actualització octubre 22)
Estat actual	Projecte executiu definitiu (octubre 22) Tramitació administrativa de les obres

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11114>



4. Estat dels projectes

Títol	Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins
Import	850.000 €
Barri	Poble-sec
Previsió execució	2021 –agost 2023 Inici obra març
Previsió finalització	Setembre 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte i BIMSA
Percentatge d'execució	45% (propera actualització novembre 22)
Estat actual	Tramitació administrativa de les obres

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11116>



4. Estat dels projectes

Títol	Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives
Import	70.000 €
Barri	Hostafrancs (CEM Espanya Industrial) i La Marina (Camp Futbol Energia)
Previsió execució	2021 – Sol·licitud de pressupostos 2022 – Compra i instal·lació
Previsió finalització	Desembre 2022
Òrgan executor	Districte i IBE
Òrgans municipals implicats	Districte i IBE
Percentatge d'execució	75% (propera actualització adjudicació CEM Espanya Industrial)
Estat actual	Marcador Camp Futbol energia instal·lat 100% Marcador CEM Espanya industrial adjudicat 50%

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11117>

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**
