

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Seguiment Decidim.Barcelona**
- 4. Enquestes de valoració**
- 5. Estat dels projectes**





2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment


OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Detectar actuacions incompatibles.
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres.
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions.




2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI



3. Seguiment Decidim.Barcelona

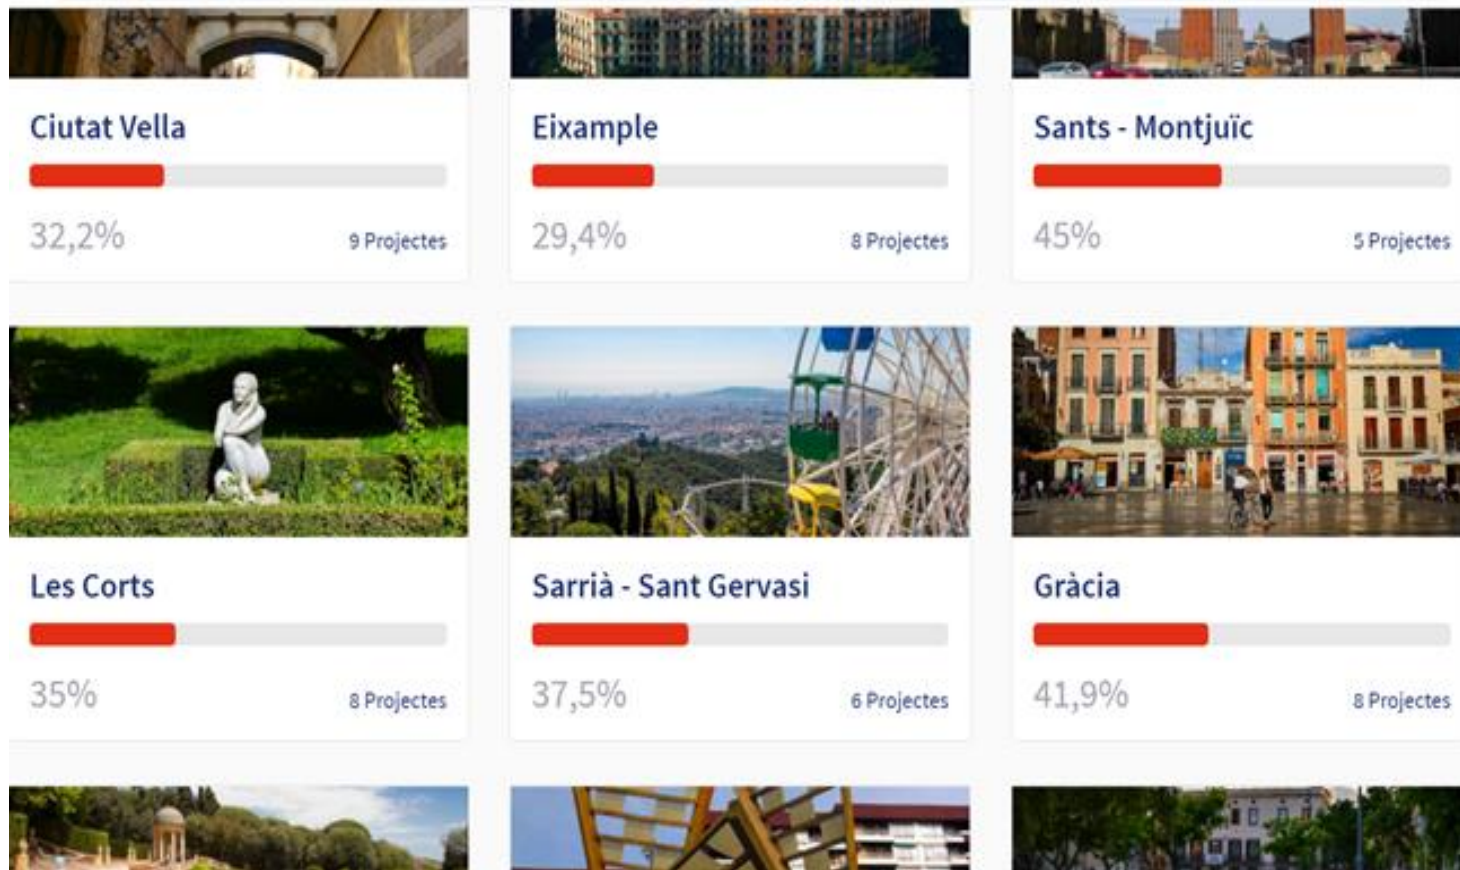



3. Estat dels projectes

Trobada amb els i les promotores

Redacció inicial

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat

Redacció inicial finalitzada

Guanyar espai vianants Balmes
Superilla Farro Hort de Sarrià de Dalt

Tramitació administrativa de les obres

Carril bici Via Augusta

Cuidem la infància entorn Escola Lourdes

Desenvolupament de les obres (iniciat)

Desenvolupament de les obres (avançat)

Finalitzat

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

PERCENTATGE D'EXECUCIÓ



4. Enquestes de valoració

Valorar la última fase en la que s'han realitzat les tasques d'execució del teu projecte.

El període d'execució dels projectes de pressupostos participatius no és uniforme

EXECUTAT COMPLETAMENT

NO EXECUTAT COMPLETAMENT

L'EXECUTIU APROVAT

OBRA EXECUTADA

Per accedir al qüestionari selecciona aquest enllaç:

<https://inscripciones-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577>

La durada aproximada de resposta és d'uns 10 minuts. En molt poc temps ens pots ajudar a millorar la participació a Barcelona. El registre de les teves respostes no recollirà cap dada personal.



5. Estat dels projectes

Projectes	Import
Creem un carril bici a la Via Augusta	1.100.000 €
Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes	340.000 €
Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lurdes	50.000 €
Superilla al Farró- Pacifiquem el barri	370.000 €
Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt	120.000 €
Urbanitzem el carrer de Romaninar	112.500 €



5. Estat dels projectes


Títol	Carril bici Via Augusta (Ganduxer-Pl. Borràs)
Import	1.100.000 €
Previsió execució	2022 – Redacció del projecte Aprovació tècnica i administrativa juliol 2022- set 2022 Inici d'obres gener 2023
Previsió finalització	Aproximadament 6 mesos
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	S'ha estudiat de manera general el traçat de tot el tram de Ganduxer a Plaça Borràs. S'ha dividit l'actuació en 2 àmbits, per ajustar-los a la disponibilitat pressupostària: • TRAM GANDUXER- DOLORS MONSERDÀ: Inici obres gener 2023. • TRAM DOLORS MONSERDÀ- PLAÇA BORRÀS: Redacció del projecte: Gener 23- Juliol 23



5. Estat dels projectes

Títol	Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes. Pl.Molina-Pl. Joaquim Folguera
Import	340.000 €
Previsió execució	Redacció del projecte 15 Març de 2022 Tramitació tècnica: 15 de Març – 30 d'Abril 2022 Tramitació tècnica i administrativa: Gener 2023 Inici d'obres, si és possible, abans de juny 2023
Òrgan executor	BIMSA
Estat actual	El projecte està condicionat al calendari d'obres de la L9/L10 (estació Putxet), promogudes per la Generalitat de Catalunya. Actualment s'està avançant en l'aprovació tècnica i administrativa del projecte. La voluntat de l'Ajuntament és executar el projecte dins el primer semestre del 2023.

Plànol Balmes

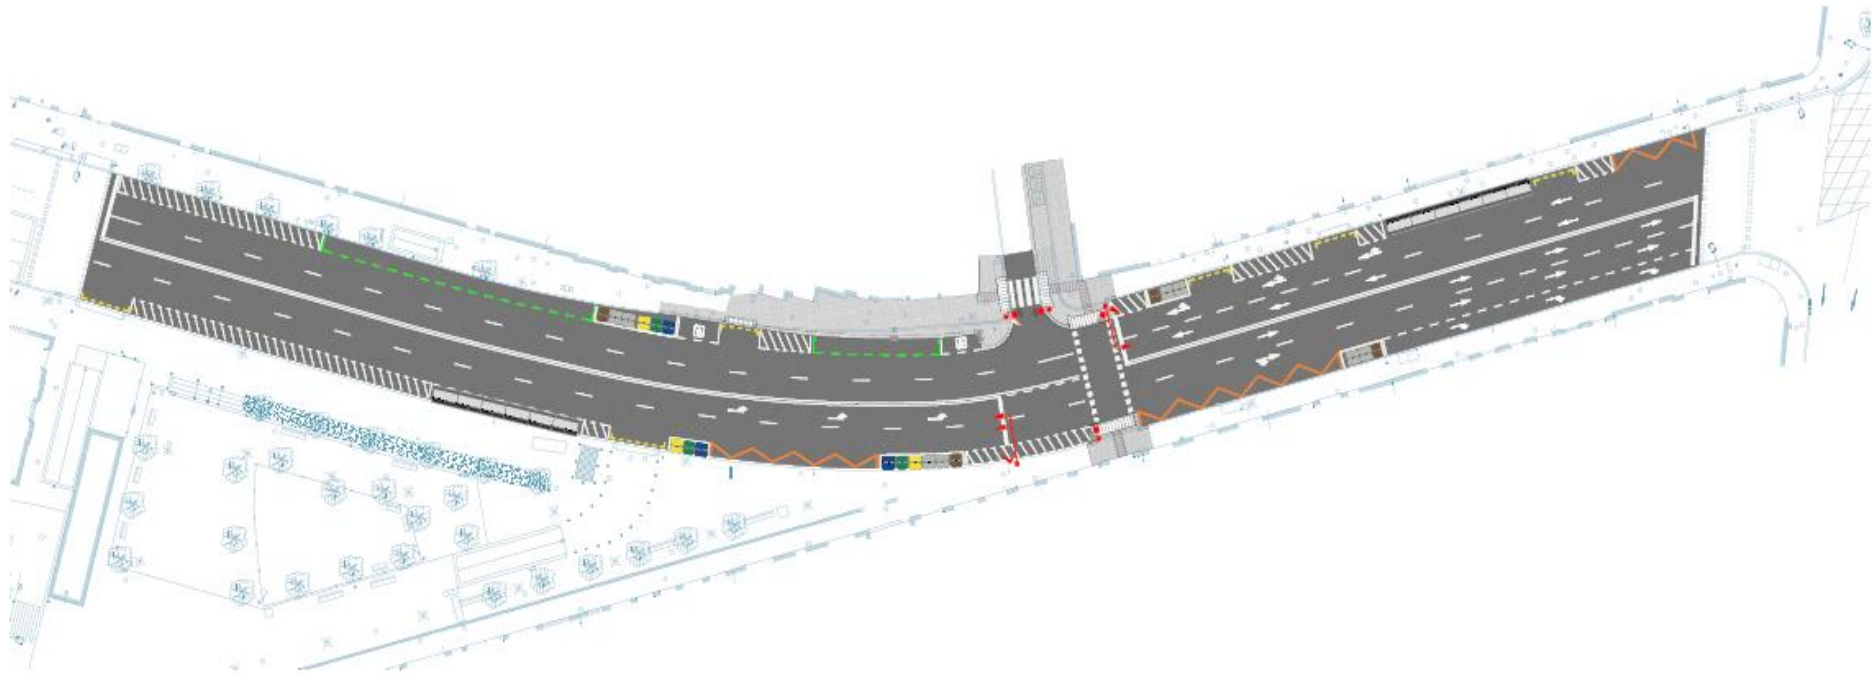




5. Estat dels projectes

Títol	Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lurdes
Import	50.000 €
Previsió execució	2021 – avantprojecte 2022 – Abril-Maig (informes i aprovació administrativa) Inici obres 7 Novembre 2022
Previsió finalització	Realització d'obres durant les vacances escolars de Nadal
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Protegim escoles
Estat actual	Fase d'execució d'obra. L'actuació inclou l'ampliació de vorera i la col·locació d'una barana just davant de l'Escola Lourdes, es preveu també la instal·lació de mobiliari urbà.

PLANTA

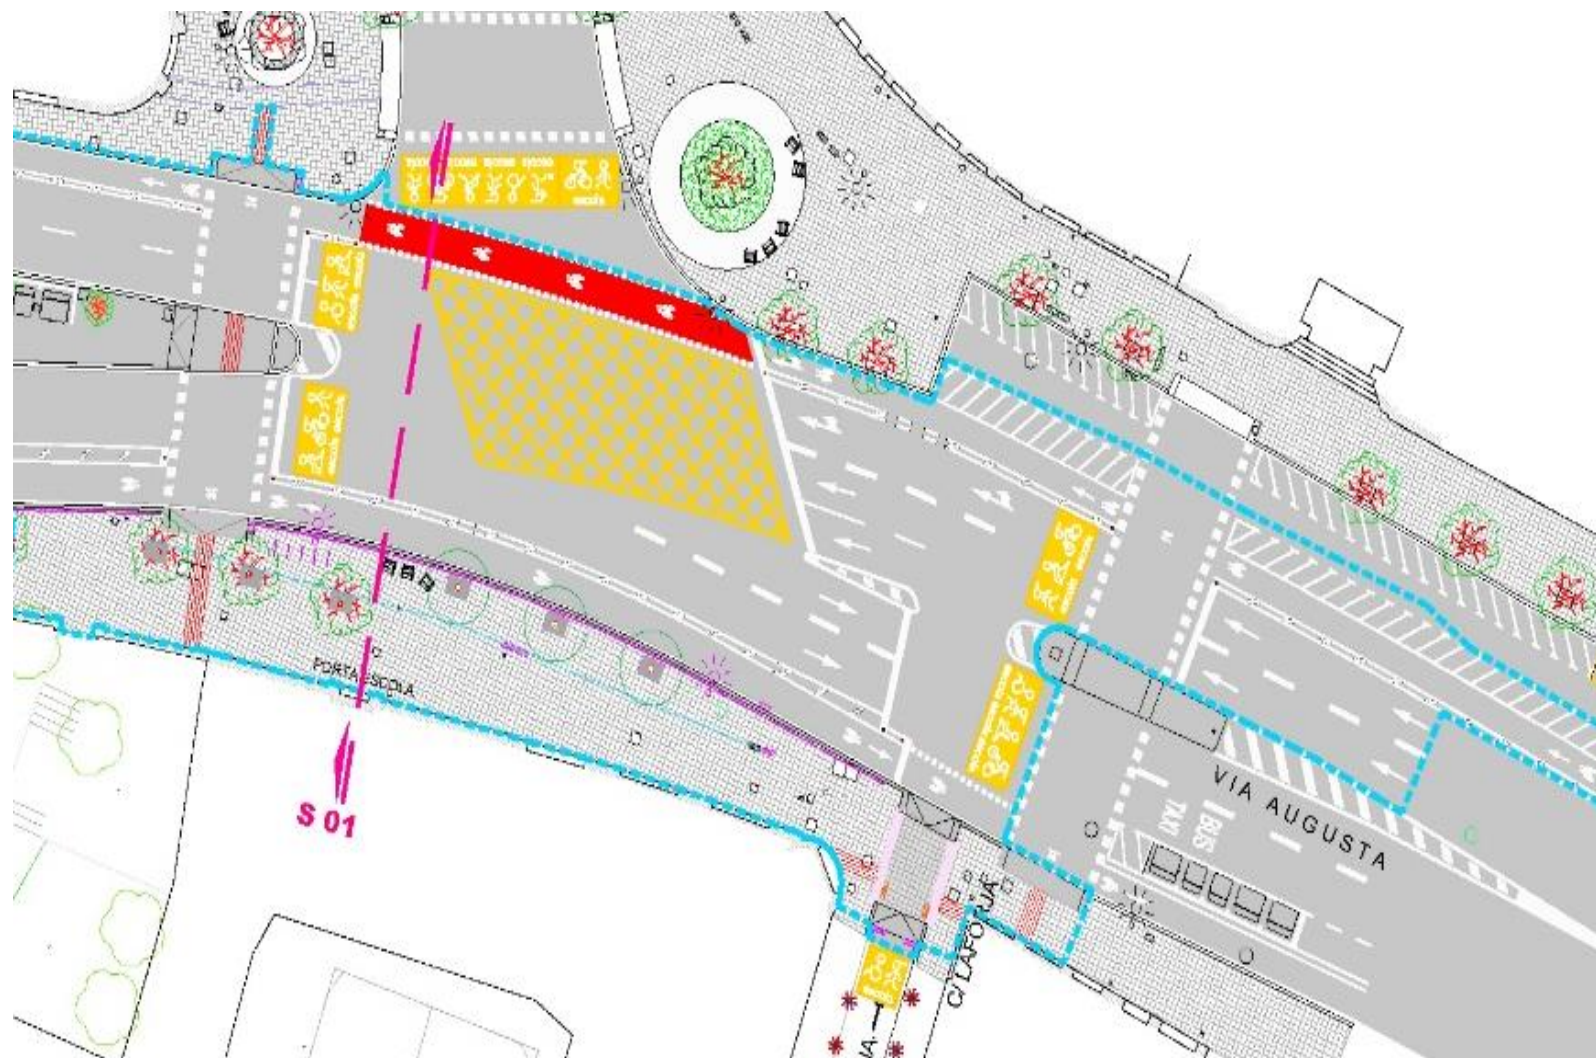



5. Estat dels projectes


Títol	Superilla al Farró-Pacifiquem el barri
Import	370.000 €
Previsió execució	2021 – Pla d'acció 2022 – Març- Entrega del Pla d'acció Projecte executiu desembre 2022
Previsió finalització	2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Superilles i Districte
Previsió participació	Explicació Consell de barri de novembre 2022
Estat actual	Maqueta del projecte executiu: octubre de 2022. L'aprovació administrativa definitiva es preveu al febrer 2023. L'inici de les obres es preveuen cap a l'Abril del 2023. La durada de l'obra s'estima en 4 mesos.



5. Estat dels projectes

Títol	Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt
Import	120.000 € + € increment pressupost
Previsió execució	2021 – Estudi del terreny. 2022 – Avantprojecte tancat. Previsió projecte definitiu (aprov. tècnicament): Febrer 23 • Previsió Aprovació Administrativa: Març - Abril 23 • Previsió inici de les obres Maig 23 • Previsió finalització de les obres: Octubre 23
Previsió finalització	Tardor 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte-Mans al verd
Estat actual	Reconeixement del terreny (contaminació) L'Avantprojecte està redactat i validat pel grup impulsor, Espais Verds i Districte, que ja ha confirmat vist i plau a posició mòduls auxiliars. Redacció projecte executiu.

Plànol projecte Hort Sarrià de Dalt

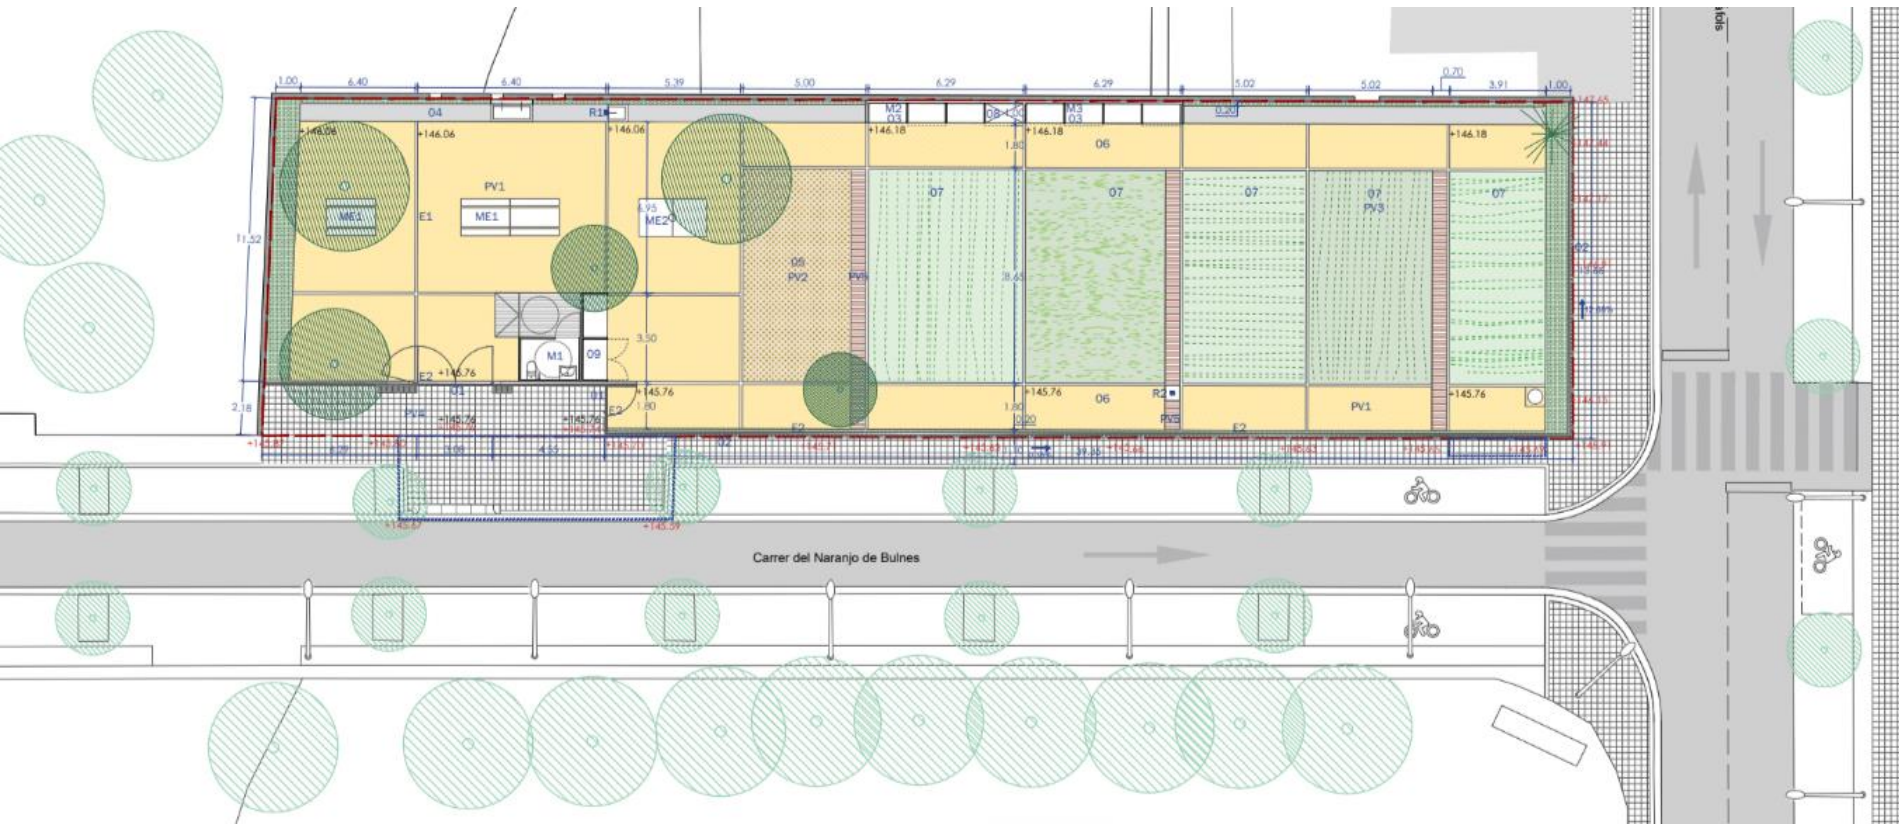


5. Estat dels projectes

Títol	Urbanització carrer Romaninar – Vallvidrera
Import	112.500 €
Previsió execució	2022 – Proposta conveni
Previsió finalització	Resolució jurídica de revisió d'ofici del projecte
Òrgan executor	IMU
Òrgans municipals implicats	Districte
Estat actual	Reunió amb promotors 15 febrer 2022 Aquest projecte no es podrà portar a terme per ser una primera urbanització segons la normativa d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Els diners d'aquest projecte es faran repercutir en altres projectes del Districte de Sarrià - Sant Gervasi.



5. Estat dels projectes

CALENDARI DE FINALITZACIÓ DELS PROJECTES

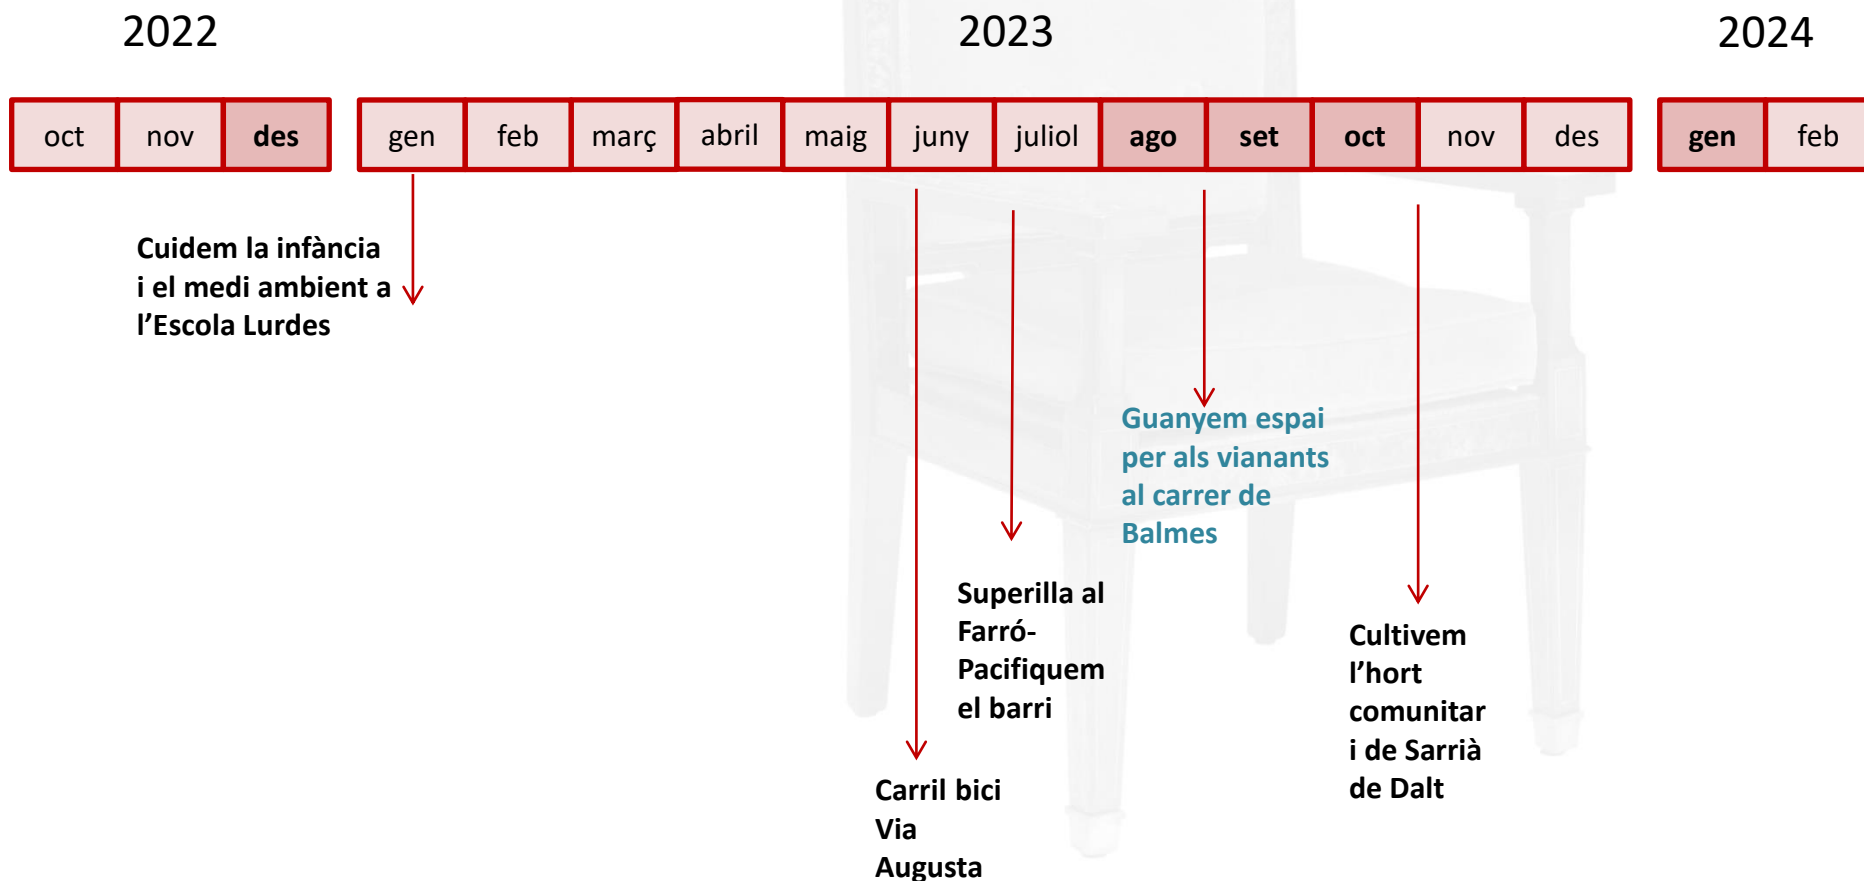

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**
