

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Enquestes de valoració**
- 4. Estat dels projectes**






2. Objectius, funcions i calendari

OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment** del desenvolupament dels projectes.
- Estar **informat/des** sobre els l'estat i contingut dels projectes que no tenen promotores.
- **Detectar** actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les **obres**
- Estar informat sobre la planificació de les **inauguracions**

2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI





3. Enquestes de valoració

S'ha enviat una **enquesta de valoració** a tots/es els/les promotors/es dels diferents projectes per a que valorin el seu projecte.

A destacar que el **període d'execució** dels projectes de pressupostos participatius **no és uniforme**

Diferents **situacions**: executat completament, no executat completament, amb projecte executiu aprovat, etc.


Per accedir al qüestionari selecciona aquest enllaç:

<https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577>

La durada aproximada de resposta és d'uns 10 minuts. En molt poc temps ens pots ajudar a millorar la participació a Barcelona. El registre de les teves respostes no recollirà cap dada personal.



4. Estat dels projectes

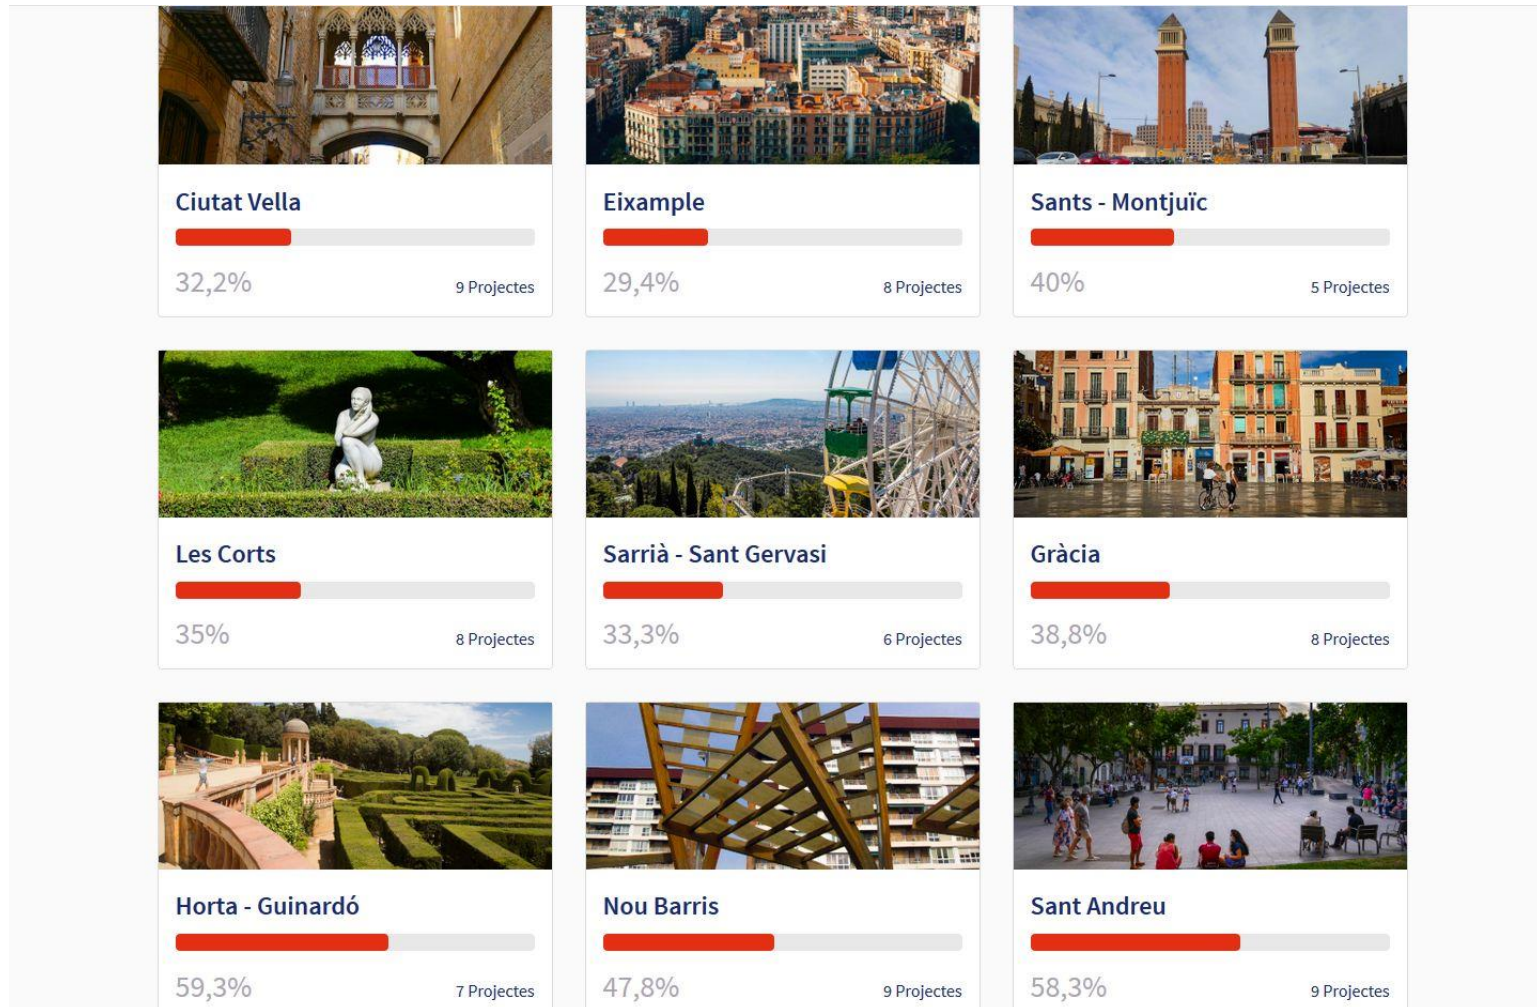



5. Estat dels projectes d'Horta

Projecte	Import del projecte
Renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre	100.000 €
Millorem el pati de l'Escola de les Aigües	185.000 €
El Casal Font d'en Fargues pel Clima	100.000 €
Renovem l'enllumenat del carrer Sorolla	52.000 €
Carril bici a la ronda del Guinardó	650.000 €
Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó	1.600.000 €
Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó	300.000 € +100.000 €



5. Estat dels projectes

Títol	Renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre
Import	100.000 €
Previsió execució	2021 novembre - Contractació equip redactor 2022 juny – inici obres / novembre - finalització
Previsió finalització	2022 setembre/octubre – finalització obres
Òrgan executor	Consorci d'Educació de Barcelona
Òrgans municipals	Consorci d'Educació de Barcelona
Previsió participació	Comissió de Seguiment del projecte
Estat actual	• El vestidor estarà finalitzat el 28/10 a falta de: pica i mobles vestidors (esgotats) • La càmera de vídeo – actualment sense ús- • La tanca perimetral i interiors estaran col·locades el 29/10 • Des de la finalització de la tanca, caldrà pintar la pista i netejar tot el perímetre de l'obra. • El pati obrirà totalment el 9/10 de novembre



Títol	Millorem el pati de l'Escola de les Aigües
Import	185.000 €
Previsió execució	2021 novembre – Contractació de l'equip redactor desembre – Presentació avantprojecte 2022 Juny – Inici d'obres
Previsió finalització	2022 setembre
Òrgan executor	Consorci d'Educació
Òrgans municipals implicats	Consorci d'Educació
Previsió participació	Comissió Seguiment del projecte
Estat actual	Obra finalitzada Està previst un acte d'inauguració pel novembre S'instal·larà un tòtem informatiu



Títol	El Casal Font d'en Fargues pel Clima
Import	100.000 €
Previsió execució	2021 – 3 reunions de la Comissió de Seguiment 2022 – Pendent concretar intervencions
Previsió finalització	Desembre 2022
Òrgan executor	Serveis Tècnics Districte Horta
Òrgans municipals implicats	Serveis Tècnics Districte Horta, Agència de l'Energia de Barcelona
Previsió participació	Comissió de Seguiment del projecte
Estat actual	Durant els mesos d'octubre i novembre 2022 està previst: • Canvis de paviment al pati de la planta baixa i a la terrassa ludoteca • Contracte de millora domòtica • Instal·lació de sensors per encesa automàtica de llums i font planta baixa Quedarà pendent concretar l'actuació a la porta d'entrada



Títol	Renovem l'enllumenat del carrer Sorolla
Import	52.000 €
Previsió execució	2021 desembre – Reunió Comissió Seguiment 2022 Febrer – Resultats estudi lumínic
Previsió finalització	2022 desembre
Òrgan executor	Departament Enllumenat
Òrgans municipals implicats	Serveis Tècnics Districte Horta, Departament Enllumenat
Previsió participació	Comissió Seguiment del projecte
Estat actual	Actuacions previstes: • Parc infantil al costat de la sala polivalent al C/Arquitectura. Previsió finalització Desembre 2022 • Substitució de llumeneres Plaça Mossen Ferran Palau Previsió finalització octubre 2022 • Substitució punts de llum a façana c/Domenech i Montaner. Previsió finalització octubre 2022 • Carrer Sorolla. Canvi de suports i llumeneres.



Títol	Carril bici a la ronda del Guinardó
Import	650.000 €
Previsió execució	2021 Novembre – Inici obres
Previsió finalització	2022 abril
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	BIMSA, Serveis Tècnics municipals
Previsió participació	No
Estat actual	Obra finalitzada a l'abril del 2022



Títol	Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó
Import	1.600.000 €
Previsió execució	2022 gener – Contractació equip redactor 2023 juny – inici d'obres (14 mesos)
Previsió finalització	2024 setembre
Òrgan executor	BIMSA / Mònica Vila Arquitectura & Project Management SL.
Òrgans municipals implicats	BIMSA
Previsió participació	Comissió de Seguiment
Estat actual	Actualment el projecte executiu està en fase d'aprovació tècnica, és a dir, cal rebre els informes municipals. En paral·lel també s'està passant el procés d'auditoria externa. Tenim planificat obtenir l'ITP i l'Auditoria aquest mes d'octubre i poder tancar el projecte a principis de novembre de 2022



Títol	Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó
Import	300.000 + 100.000 = 400.000 €
Previsió execució	2021 novembre – Contractació equip redactor del projecte executiu 2022 febrer – Presentació de la proposta als promotors 2023 juliol – inici obres (4 mesos)
Previsió finalització	2023 novembre
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Serveis Tècnics Districte Horta, Model Urbà, BCASA i BIMSA
Previsió participació	Comissió de Seguiment del projecte
Estat actual	Respecte a l'anterior proposta presentada, hi ha un canvi substancial, relatiu a les dimensions de reducció del llac que passa de reduir-se 2/3 parts a 1/3 part degut al marc pressupostari Actualment el projecte executiu està en fase d'aprovació tècnica i està previst tancar el projecte a finals d'octubre 2022




4. Estat dels projectes

CALENDARI

2022

2023

2024

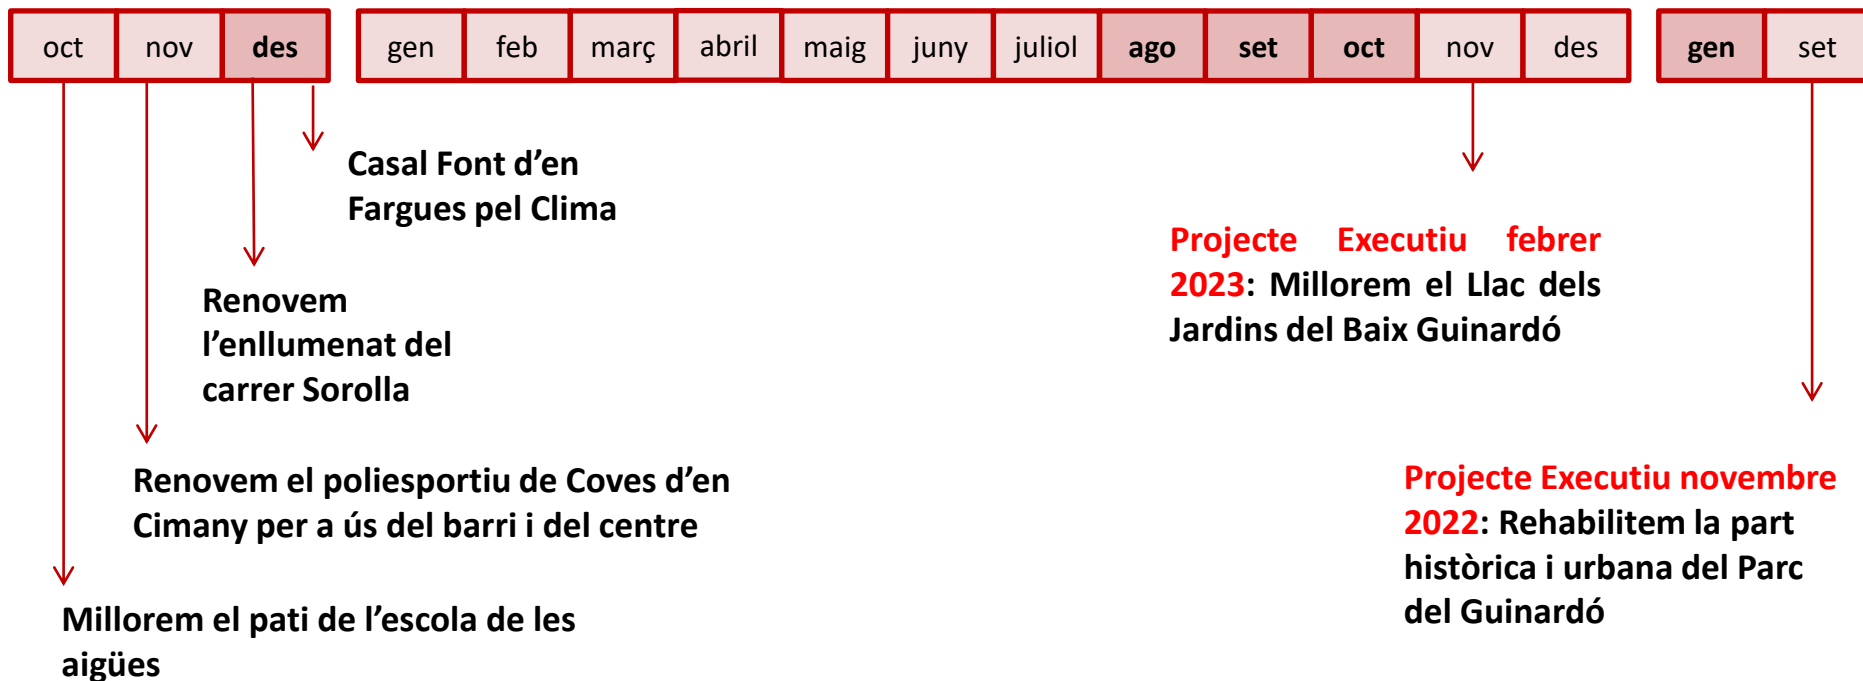

Gràcies per la vostra participació



Ajuntament
de Barcelona
