




barcelona
sagrera
alta velocitat



CONSELL DE BARRI LA VERNEDA
8 D'ABRIL 2021

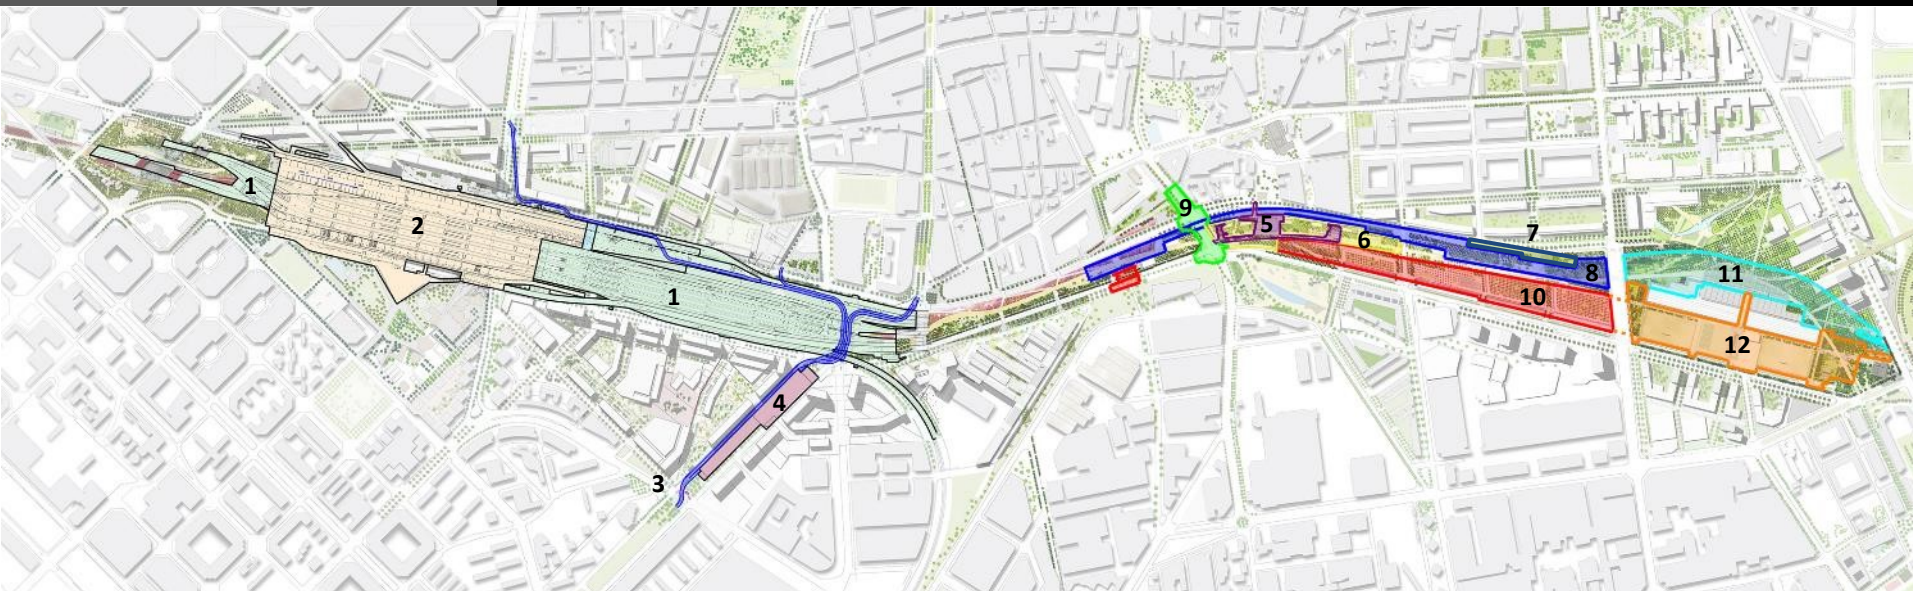

ÀMBIT SAGRERA


1	Accessos a l'estació de la Sagrera	46% Executat
2a	Estructura de l'estació de la Sagrera	41% Executat
2b	Arquitectura i instal·lacions estació de la Sagrera	Projecte adjudicat i impugnat
3	Col·lector de Prim	Obra reactivada febrer 2021
4	Dipòsit de Prim	Obra pendent de licitació

ÀMBIT SANT ANDREU

5	Estació de Sant Andreu Comtal	8% Executat
6	Urbanització de l'entorn de la nova estació de Sant Andreu	Projecte en redacció
7	Viari segregat costat muntanya. Sector Colorantes (parcial)	Projecte en redacció
8	Cobertures costat muntanya sector Sant Andreu	Pendent licitació projecte
9	Reposició de la urbanització viària del c. Sant Adrià	Pendent licitació projecte
10	Cobertures costat mar sector Sant Andreu i nou taller AV	Estudis previs
11	Reforma taller trens Regionals i cobertures associades	Estudis previs
12	Nova àrea de estacionament de trens AV (transformació Nau Talgo)	Estudis previs


OBRA EN EXECUCIÓ	PRESSUPOST	EXECUTAT GENER 2021	
	228,17 M€	105,33 M€	46,16%

	Línia de Rodalies
	Línia d'Alta Velocitat
	Obra estructura estació Sagrera

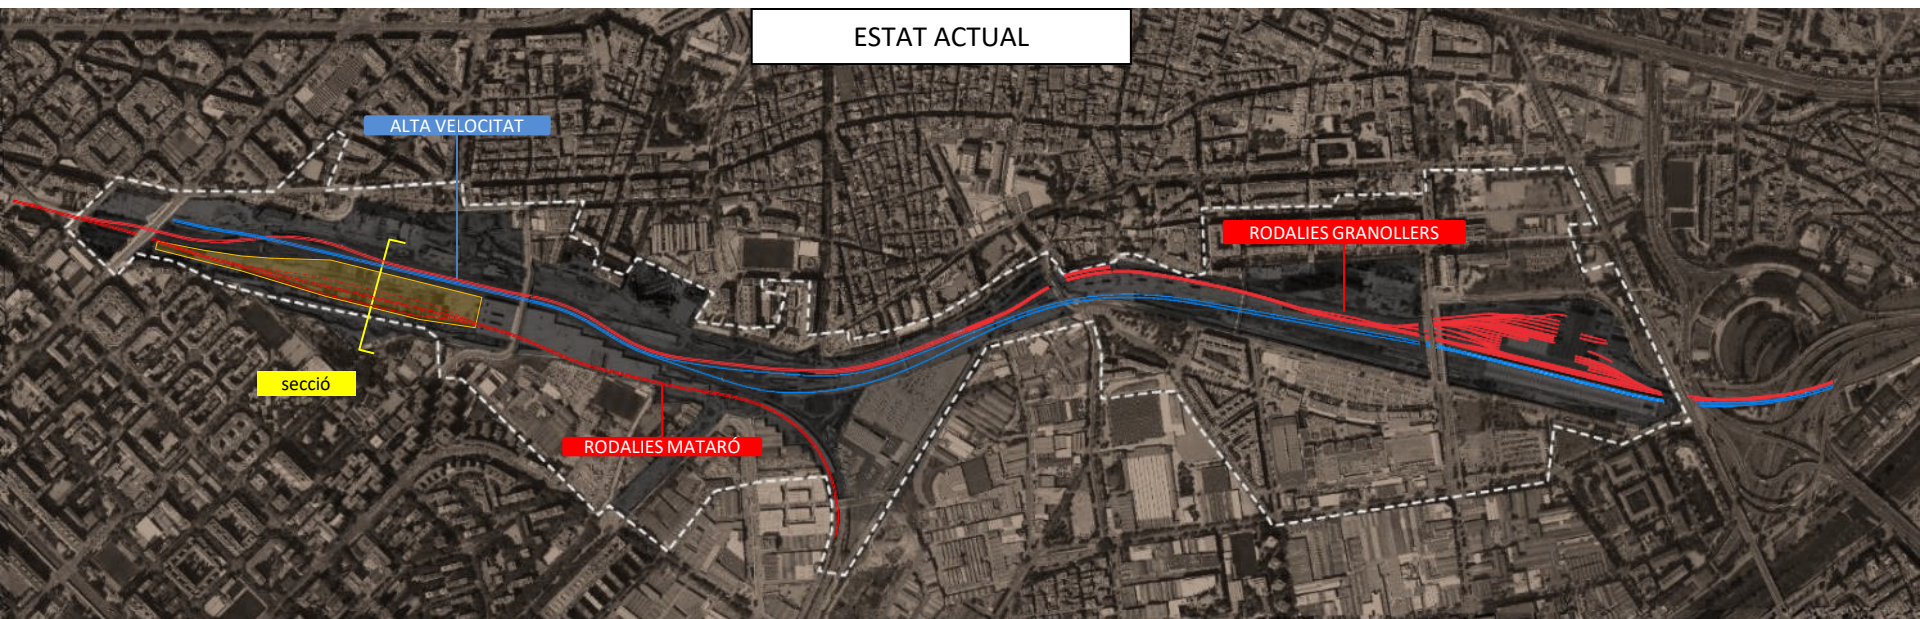



ESTIMACIÓ POSADA EN SERVEI POSICIÓ DEFINITIVA
RODALIES GRANOLLERS

ESTIU 2022

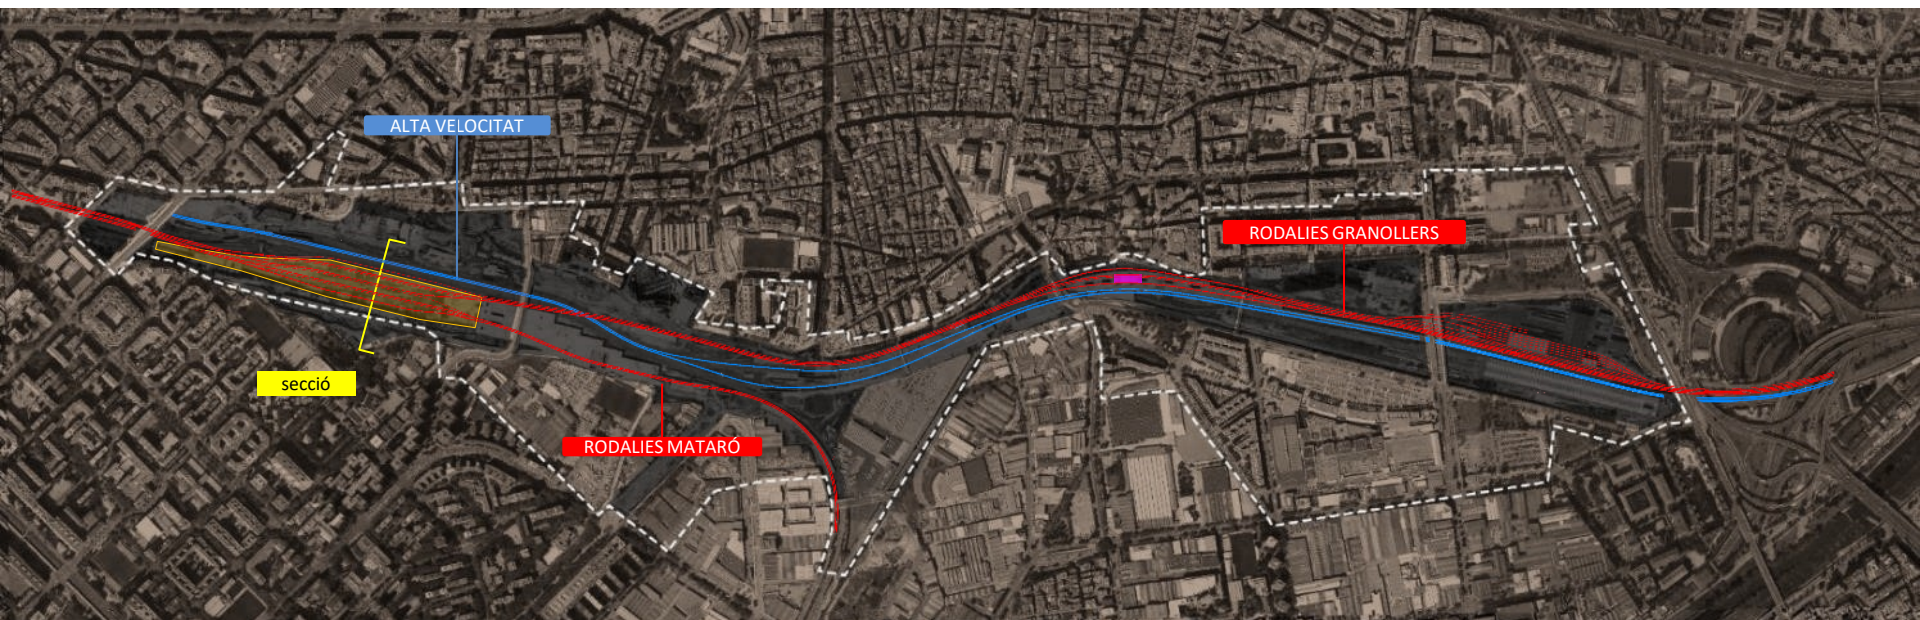


ESTIMACIÓ POSADA EN SERVEI POSICIÓ DEFINITIVA
ALTA VELOCITAT

ESTIU 2023

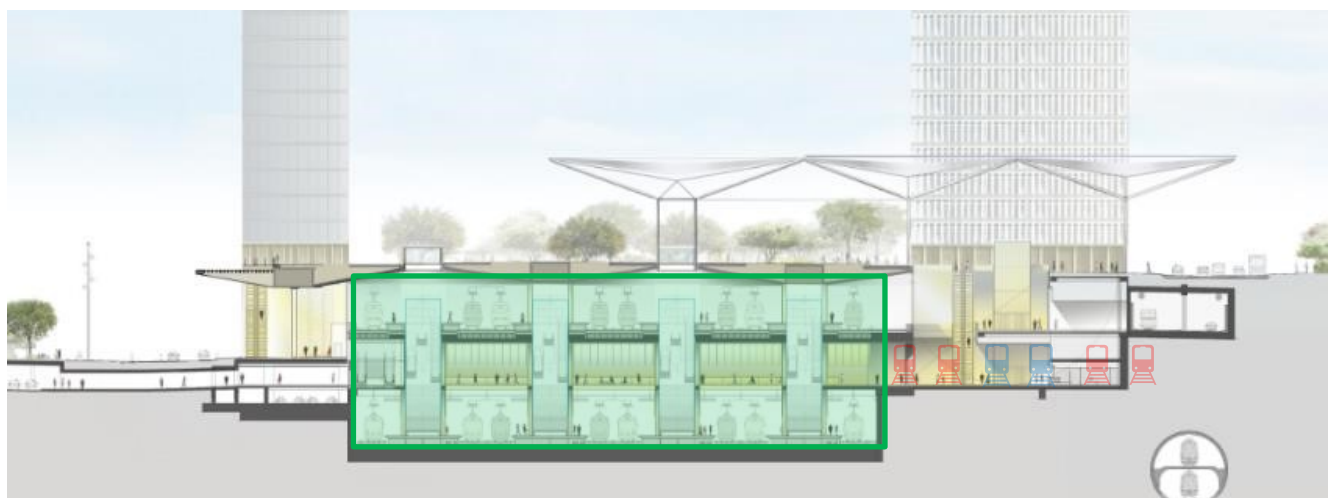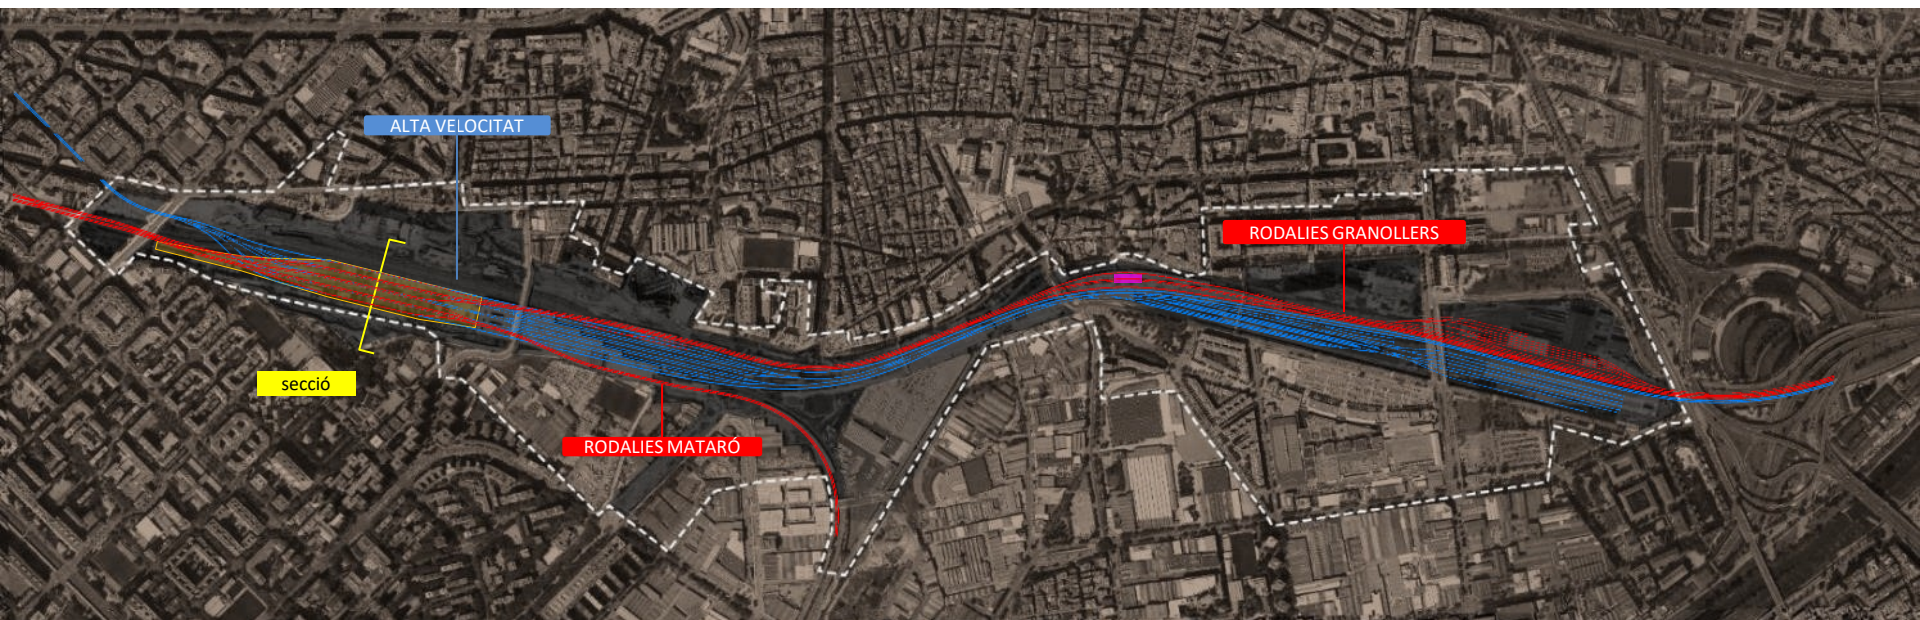



OBRA EN EXECUCIÓ	PRESSUPOST	EXECUTAT GENER 2021		ESTIMACIÓ FINALITZACIÓ D'OBRES
	323,28 M€	132,77 M€	41,07%	2024-2025

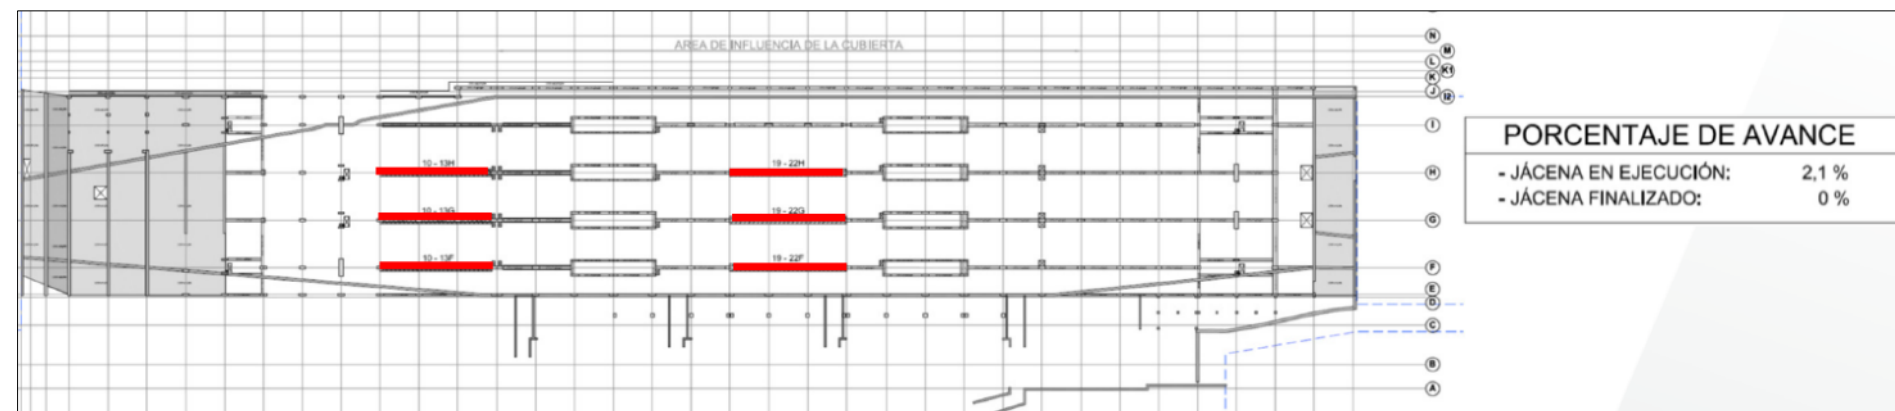




PROJECTE ADJUDICAT I IMPUGNAT	PRESSUPOST	ESTIMACIÓ REDACCIÓ DEL PROJECTE
	6,309 M€	18 MESOS



OBRA REACTIVADA FEBRER 2021 (corredor Mataró en posició definitiva)	PRESSUPOST	EXECUTAT GENER 2021		ESTIMACIÓ POSADA EN SERVEI
	9,51 M€	8,68 M€	91,29%	4t TRIMESTRE 2021

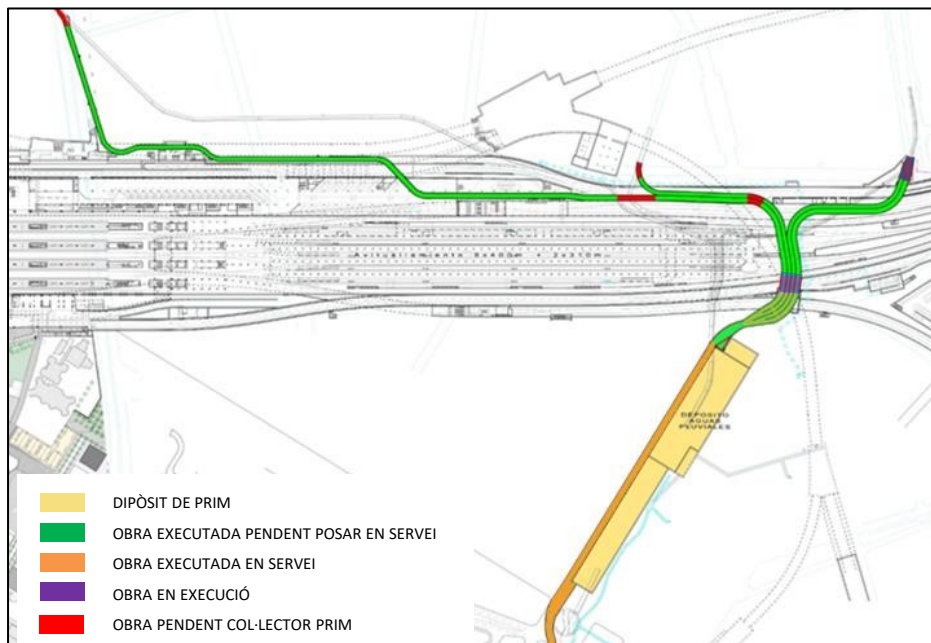

REPOSICIÓ URBANITZACIÓ RAMBLA DE PRIM

OBRA FINALITZADA NOVEMBRE 2019





OBRA PENDENT DE LICITACIÓ
PIM AJUNTAMENT

PRESSUPOST


46,60 M€

ESTIMACIÓ D'OBRES

2023-2025

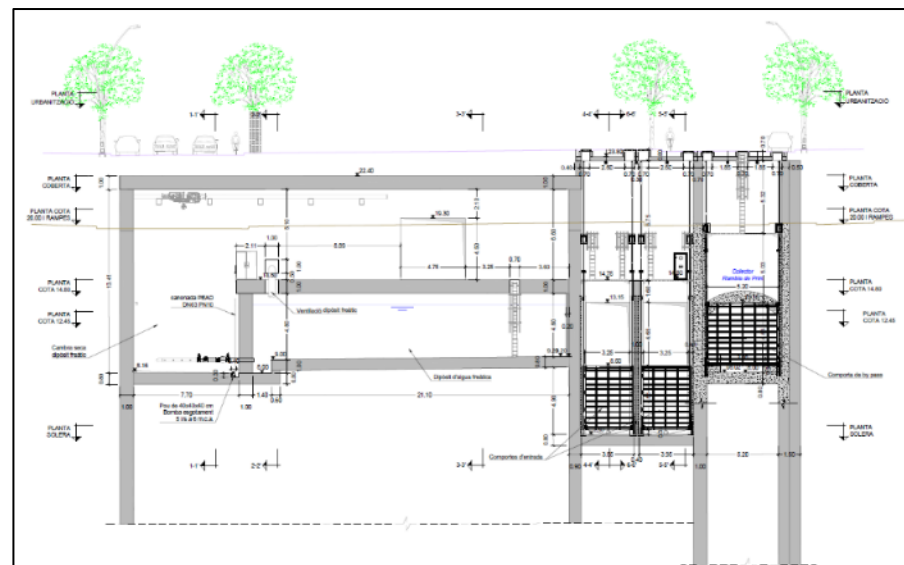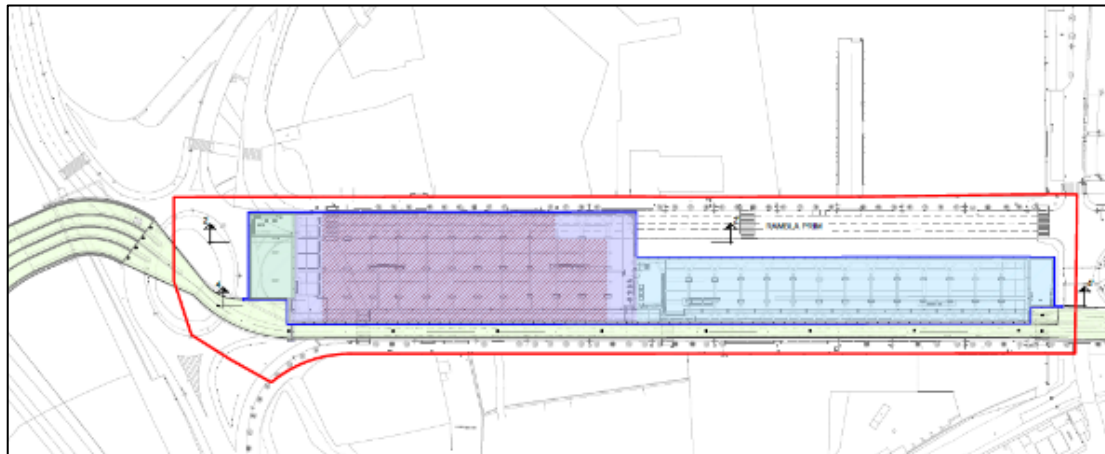

PROJECTES	PRESSUPOST	ESTIMACIÓ D'OBRES
 CLOT	0,569 M€	CONDICIONADA FINANÇAMENT AJUNTAMENT
 SAGRERA	-	EN EXECUCIÓ, FINALITZACIÓ MAIG 2021
 SAGRERA	1,027 M€	INICI: NOVEMBRE 2021. FINALITZACIÓ: 2N TRIMESTRE 2022
 SANT ANDREU	2,478 M€	CONDICIONADA FINANÇAMENT AJUNTAMENT

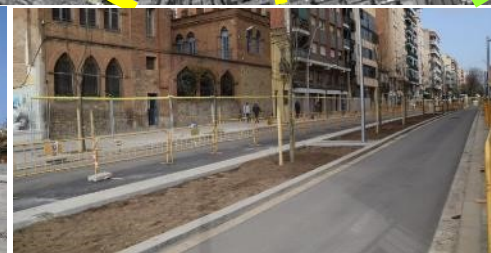


PROJECTE PENDENT EXPOSICIÓ PÚBLICA

PRESSUPOST



0,53 M€

ESTIMACIÓ D'OBRES

CONDICIONADA AUTORITZACIÓ D'ADIF
INICI: 4T TRIMESTRE 2021

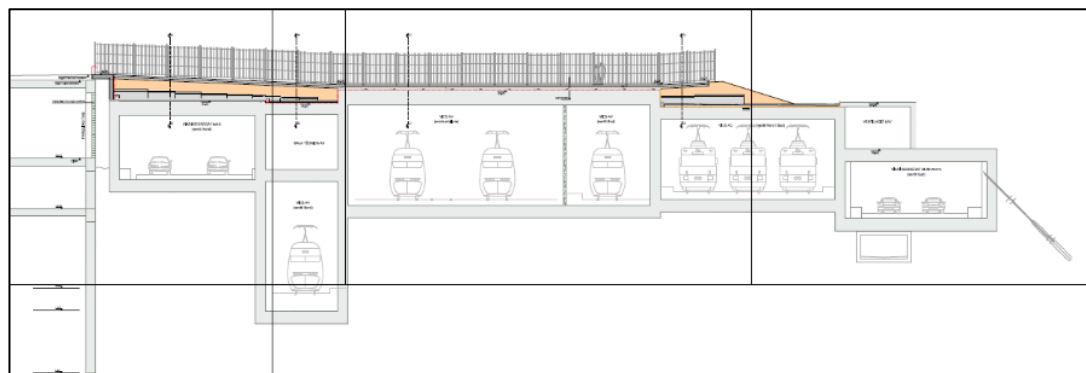


OBRA EN EXECUCIÓ	PRESSUPOST	EXECUTAT GENE 2021		ESTIMACIÓ POSADA EN SERVEI
	5,23 M€	0,40 M€	7,67%	ESTIU 2022

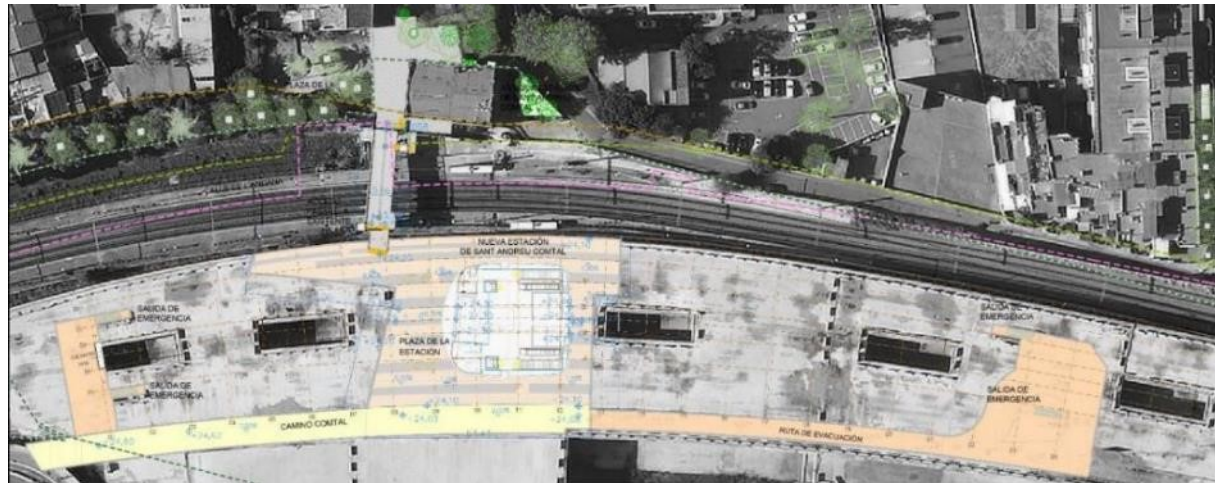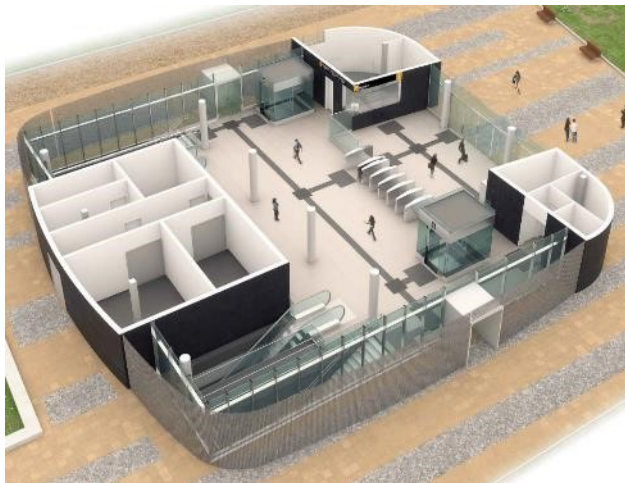

PROJECTE EN REDACCIÓ	PRESSUPOST	ESTIMACIÓ D'OBRES
	3,9 M€	CONDICIONADA INFORME FAVORABLE D'ADIF INICI: 1R TRIMESTRE 2022



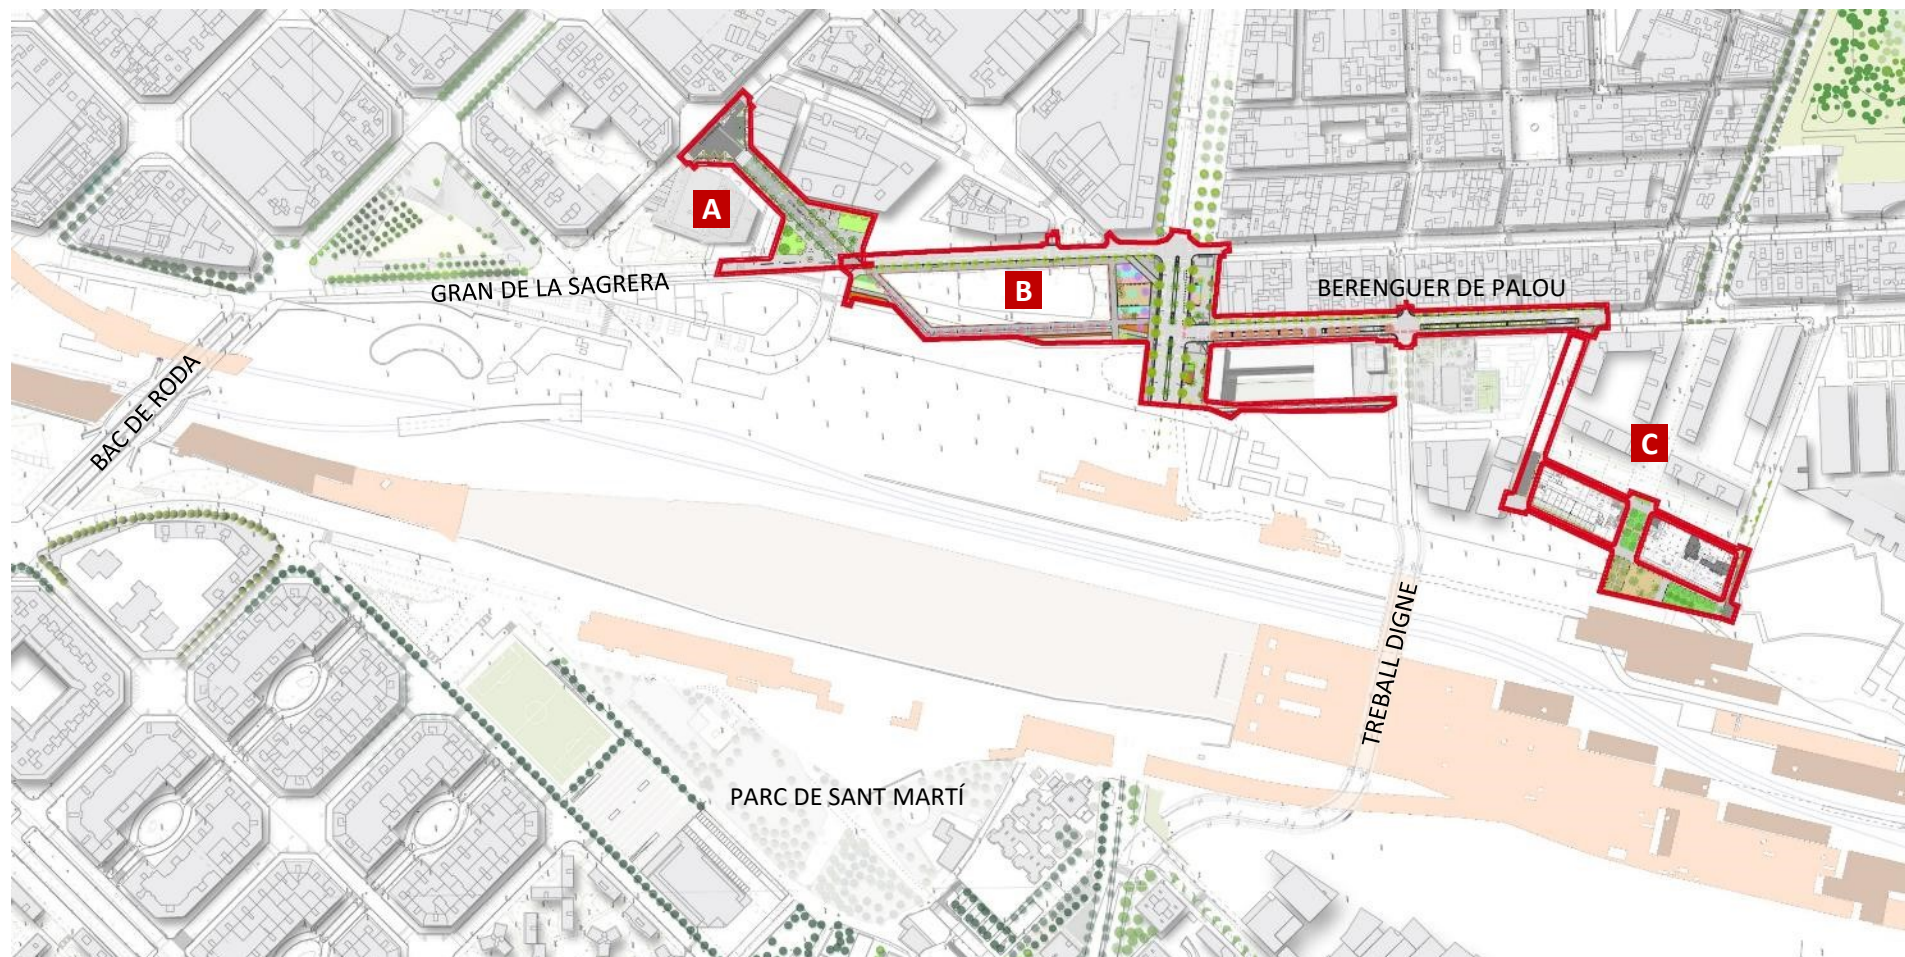

A. JOSEP ESTIVILL	ESTIMACIÓ	B. BERENGUER DE PALOU	ESTIMACIÓ	C. ENTORN BIBLIOTECA	ESTIMACIÓ
Aprovació projecte	Juliol 2019	Aprovació projecte	Març 2019	Aprovació projecte	Abril 2020
Inici d'obra	3r. trimestre 2021	Inici d'obra	Octubre 2019	Inici d'obra	3r. trimestre 2021
Finalització d'obra	2n. Trimestre 2022	Finalització d'obra	Maig 2021	Finalització d'obra	2n. trimestre 2022
PRESSUPOST	1,55 M€	PRESSUPOST	7,25 M€	PRESSUPOST	1,71 M€


PRESSUPOST (IVA inclòs)









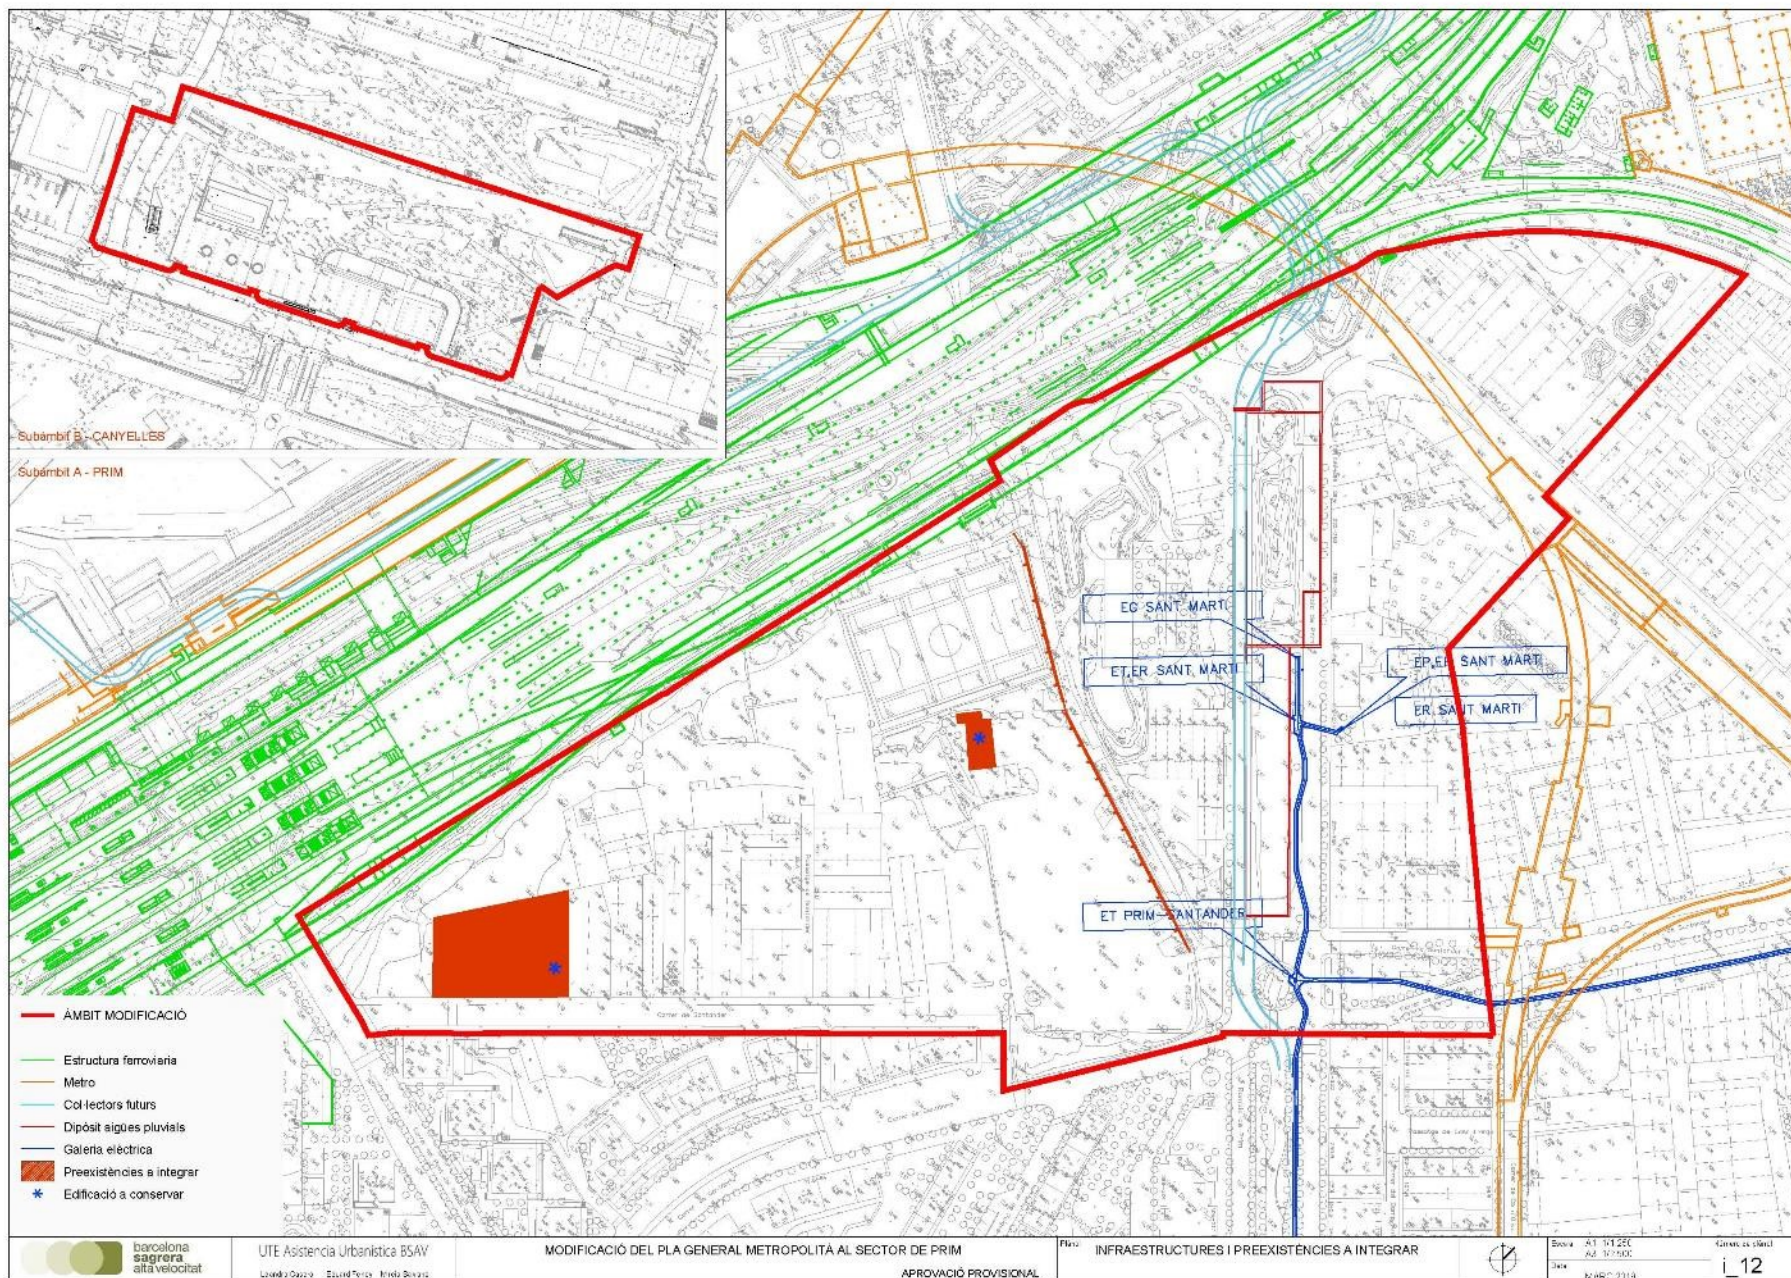

MPGM DEL SECTOR DE PRIM. Estat dels tràmits

ACTUACIONS REALITZADES

- De setembre a desembre 2017 - Concurs idees
- De maig a octubre 2018 Participació ciutadana
- Gener 2019 - Aprovació inicial MPGM (AJBCN)
- Maig 2019 - Aprovació provisional MPGM (AJBCN)

ACTUACIONS PENDENTS

- Aprovació definitiva MPGM (GENCAT) – 3T 2021
- Concurs projecte urbanització- 4T 2021
- Aprovacions Projectes urbanització i reparcel·lació – finals 2023
- Inici enderrocs – 2024
- Inici urbanització – previsió 2025 (*condicionada pel dipòsit RSU Prim*)

