

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**

Comissió de seguiment del Districte de Sants-Montjuïc 10/01/24





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari**
- 2. Sistema de valoració de l'execució**
- 3. Estat dels projectes**
- 4. Enquestes de valoració**
- 5. Precs i Preguntes**




1. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

OBJECTIUS I FUNCIONS

- Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres.

CALENDARI

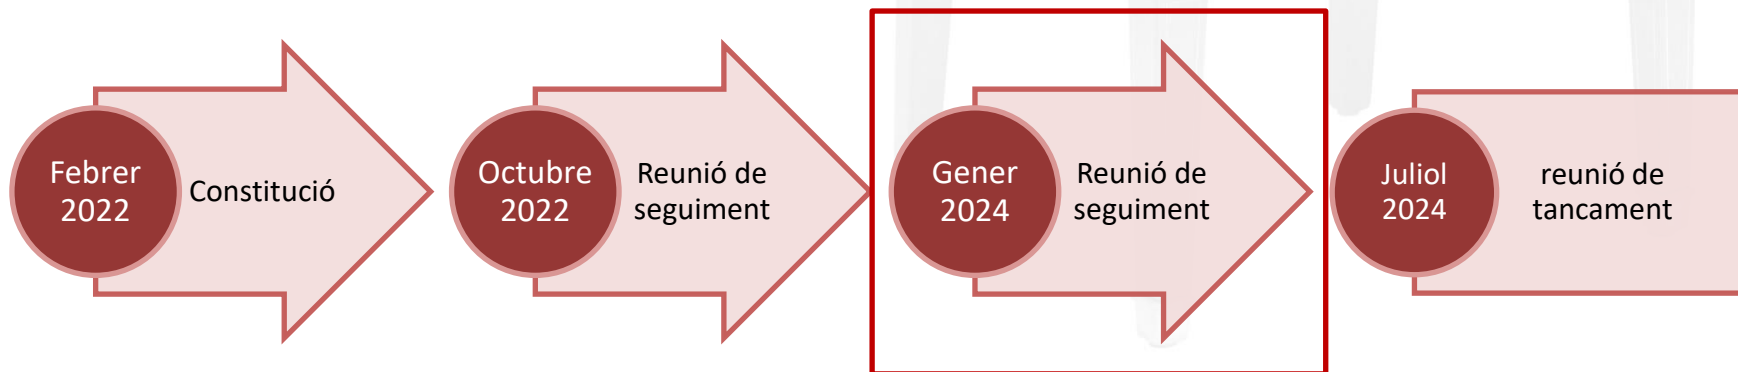



2. Sistema de valoració. Estat octubre 2022

Trobada amb els i les promotores

Redacció inicial

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat

Redacció inicial finalitzada

Tramitació administrativa de les obres

Desenvolupament de les obres (iniciat)

Desenvolupament
de les obres (avançat)

Finalitzat

Pacifiquem Sants antic →

Millorem el parc de l'Espanya Industrial →

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris →

Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins →

Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives →

PERCENTATGE D'EXECUCIÓ



2. Sistema de valoració. Estat gener 2024

Trobada amb els i les promotores

Redacció inicial

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat

Redacció inicial finalitzada

Tramitació administrativa de les obres

Pacifiquem Sants antic →

Millorem el parc de l'Espanya Industrial →

Desenvolupament de les obres (iniciat)

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris →

Desenvolupament de les obres (avançat) **Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins →**

Finalitzat **Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives →**

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

PERCENTATGE D'EXECUCIÓ




3. Estat dels projectes

- Segons data de finalització d'execució
- Fitxa individualitzada



4. Estat dels projectes

CALENDARI DE FINALITZACIÓ DELS PROJECTES

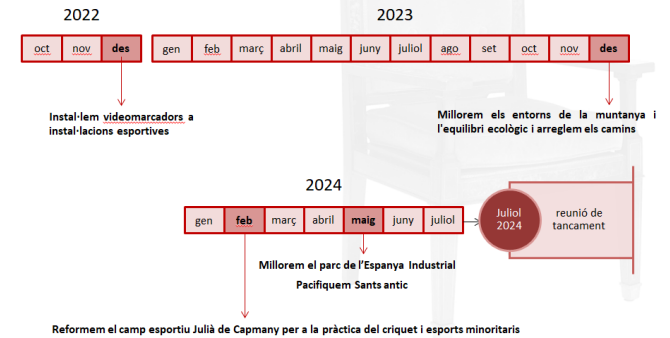

8




4. Estat dels projectes

Títol	Pacíficums Sants antic
Import	200.000 €
Barri	Sants
Previsió execució	2021 – Elaborar el Pla d'Acció 2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 2023 – Obres d'abril a agost.
Previsió finalització	Agost 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	<u>Districte</u> , BIMSA, <u>equip de Superilles i Mobilitat</u>
Percentatge d'execució	30% (propera actualització finals novembre)
Estat actual	Projecte executiu en redacció



3. Estat dels projectes

CALENDARI DE FINALITZACIÓ DELS PROJECTES

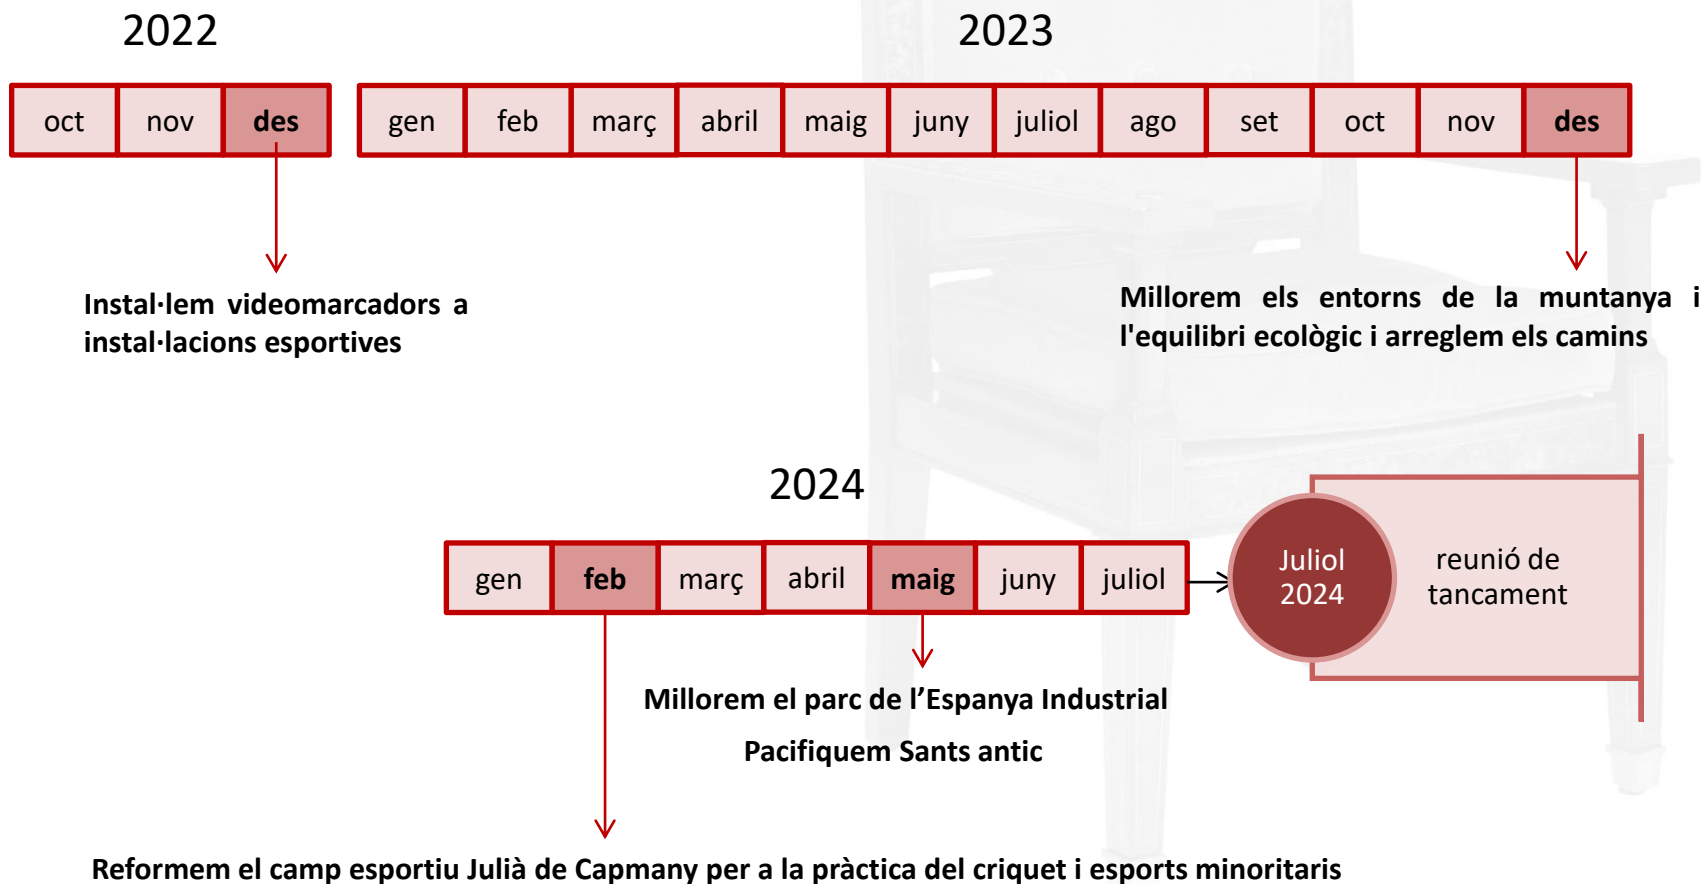



3. Estat dels projectes

Projecte	Import final
Pacifiquem Sants antic	228.902,00 €
Millorem el parc de l'Espanya Industrial	1.017.566,00 €
Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins	1.100.000,00 €
Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris	1.600.000,00 €
Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives	78.572,94 €

4.025.040,94€

**12,90% del cost total dels projectes de
pressupostos participatius de la ciutat**



3. Estat dels projectes

Títol	Pacifiquem Sants antic
Import	228.902,00 €
Barri	Sants
Previsió inicial de l'execució	2021 – Elaborar el Pla d'Acció 2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 2023 – Obres d'abril a agost.
Inici obres	inicis de febrer 2024
Previsió finalització	finals de maig 2024
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, equip de Superilles i Mobilitat
Percentatge d'execució	50% (propera actualització inicis de febrer)
Estat actual	Tramitació administrativa de les obres

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11115>



3. Estat dels projectes

Títol	Millorem el parc de l'Espanya Industrial
Import	1.017.566,00 €
Barri	Sants-Hostafrancs
Previsió inicial de l'execució	2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu. 2023 – Obres de juny 2023 a gener 2024
Inici obres	13 de novembre de 2023
Previsió finalització	finals de maig 2024
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, Parcs i Jardins, i BCASA
Percentatge d'execució	60% (propera actualització febrer 2024)
Estat actual	Desenvolupament de les obres (iniciat)

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11113>



4. Estat dels projectes

Títol	Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris
Import	1.600.000,00 €
Barri	Poble-sec
Previsió inicial de l'execució	2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 2023 – Abril inici de les obres, finalització al setembre
Inici obres	26 de maig de 2023
Previsió finalització	mitjans de febrer 2024
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, BIMSA, Institut Barcelona Esports i els gestors de la instal·lació
Percentatge d'execució	90% (propera actualització finals de gener)
Estat actual	Desenvolupament de les obres (avançat)

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11114>



3. Estat dels projectes

Títol	Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins
Import	1.100.000,00 €
Barri	Poble-sec
Previsió inicial de l'execució	2021 –agost 2023 Inici obra març
Inici obres	18 d'abril de 2023
Data finalització	22 de desembre de 2023 retirada de maquinària
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte i BIMSA
Percentatge d'execució	95%
Estat actual	Finalitzat

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11116>



3. Estat dels projectes

Títol	Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives
Import	78.572,94 €
Barri	Hostafrancs (CEM Espanya Industrial) i La Marina (Camp Futbol Energia)
Previsió execució	2021 – Sol·licitud de pressupostos 2022 – Compra i instal·lació
Data finalització	5 de desembre 2022
Òrgan executor	Districte i IBE
Òrgans municipals implicats	Districte i IBE
Percentatge d'execució	100%
Estat actual	Finalitzat

<https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11117>



4. Enquestes de valoració

Sessions de debat, incidència en la definició del projecte final executat, comunicació amb tècnics ajuntament, problemes d'aquesta fase, ajust entre projecte proposat i el que vas proposar, nivell de satisfacció...

Hi ha diverses opcions en funció del grau d'execució del projecte.

- ☐ **Opció A:** Projecte que ja s'ha executat completament: et proposem que valoris el conjunt d'aquesta fase d'execució.
- ☐ **Opció B:** Projecte que ja disposa de projecte executiu i que resta a l'espera de la licitació i/o execució de l'obra: et proposem que valoris la primera part de l'execució.
- ☐ **Opció C:** Projecte que ja s'ha executat completament i del qual ja vas valorar la primera part de l'execució: et proposem que valoris el projecte executat.

S'enviarà correu personalitzat a cada grup de promotors amb l'enllaç al formulari



Millorar la participació a Barcelona



10 minuts



No es recull cap dada personal

Gràcies per la vostra participació



**Ajuntament
de Barcelona**
