


Entorns estació Sants

1. *Àmbits d'actuació.*
2. *Adequació de la mobilitat prèvia a la Fase 1 d'ADIF. Àmbits 1, 2 i 3.*
3. *Estat de les obres: Àmbits 1, 2 i 3.*
4. *Projecte executiu Fase 1 d'ADIF. Estació, Plaça Països Catalans i Entorns.*
5. *Planificació d'actuacions.*

01

Àmbits d'actuació

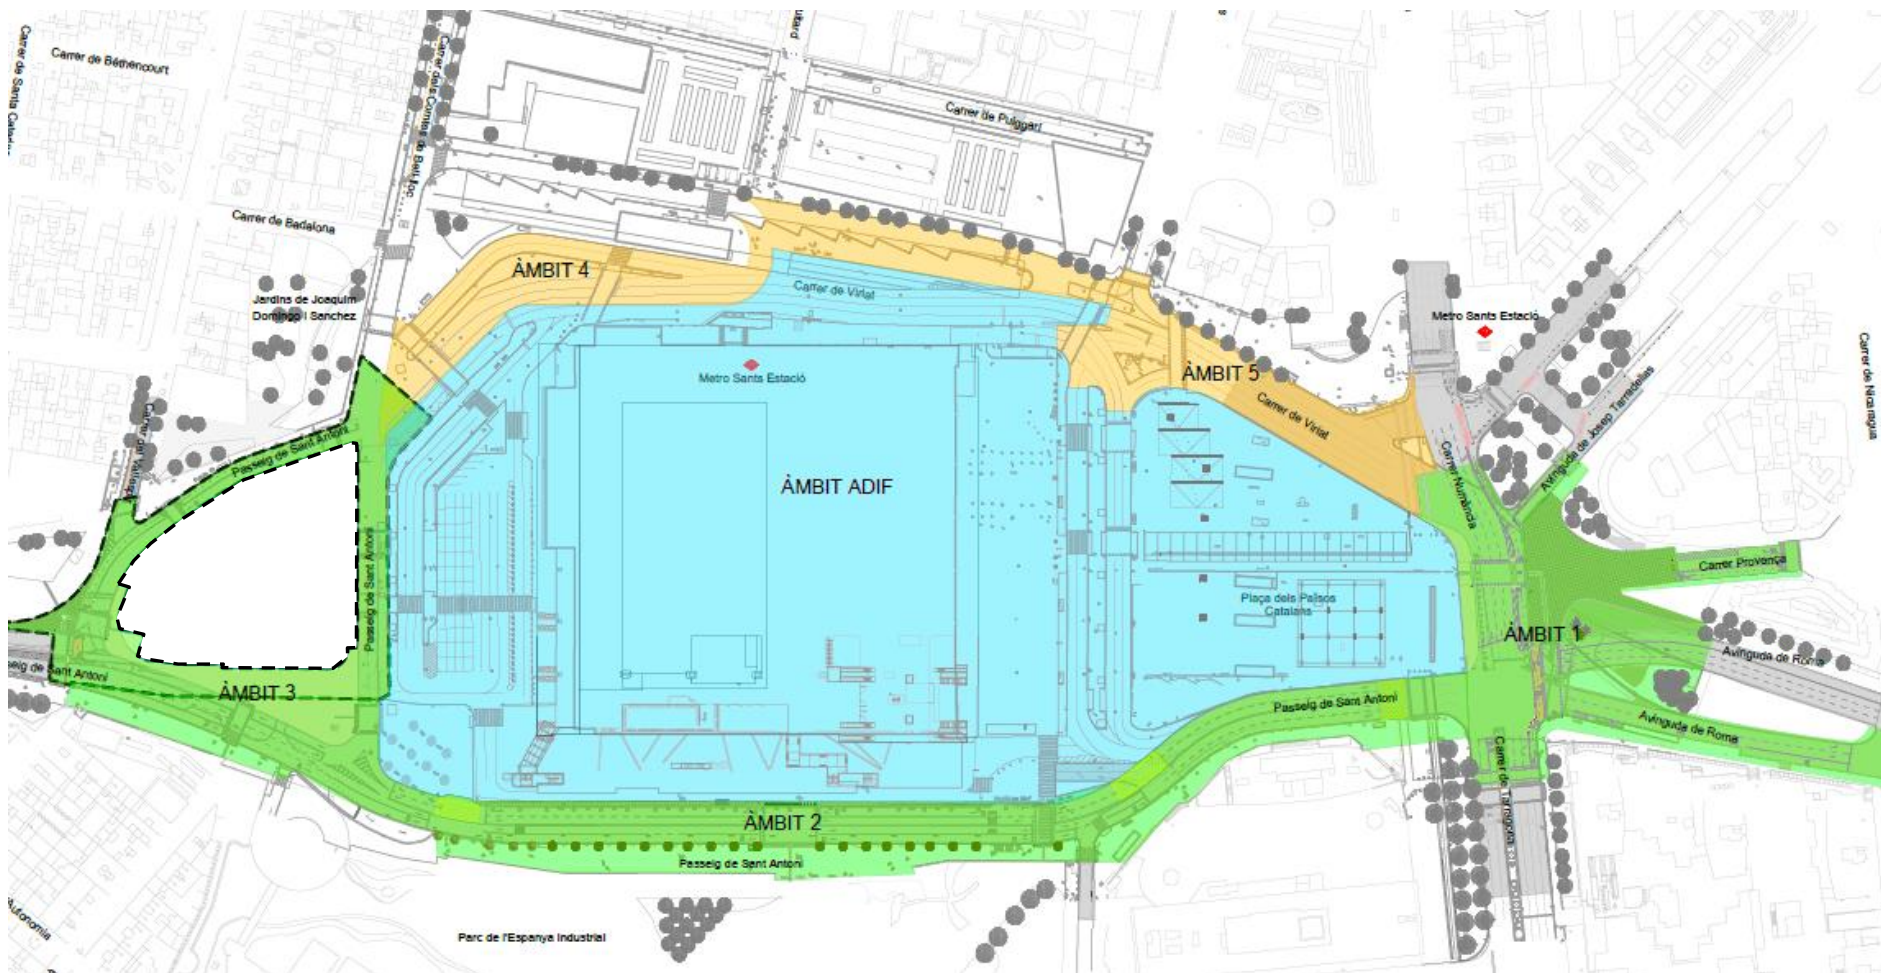


AJ. BCN/BIMSA (EN PROJETE)

ADIF (FASE 1 EN LICITACIÓ)



AJ. BCN/BIMSA (EN OBRES)

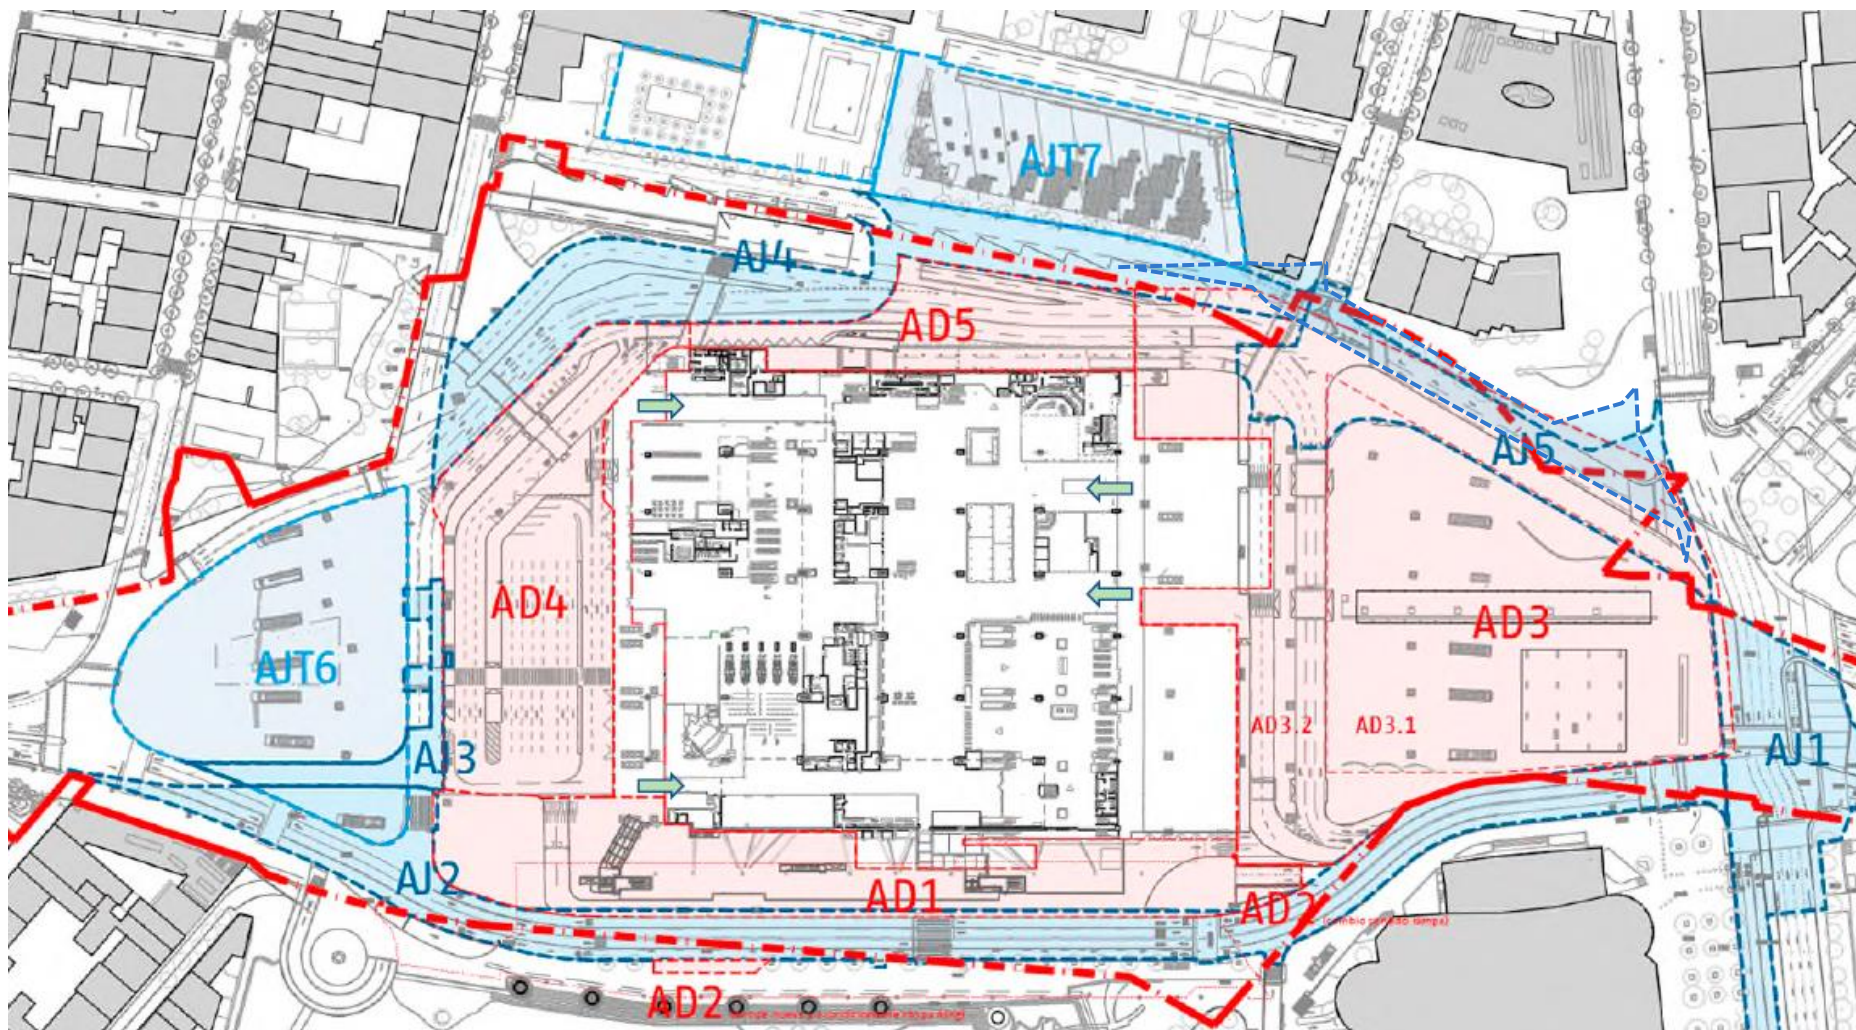


Projectes AJ. BCN/BIMSA: AJ1 , AJ2 i AJ3 en obres. Previst obrir al trànsit al juliol de 2024, finalització d'obres al setembre de 2024. AJ4 i AJ5 en redacció de projecte.

Projectes ADIF: AD1, AD3 i AD5 el licitació d'obres. Inici previst al gener de 2025 . AD2 i part AD4 Projecte en fase d'activació (accés aparcament costat mar i impermeabilització).


02

**Adequació mobilitat prèvia Fase 1 d'ADIF.
Àmbits 1, 2 i 3**

ADEQUACIÓ DE LA MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS PRÈVIA A FASE 1 D'ADIF

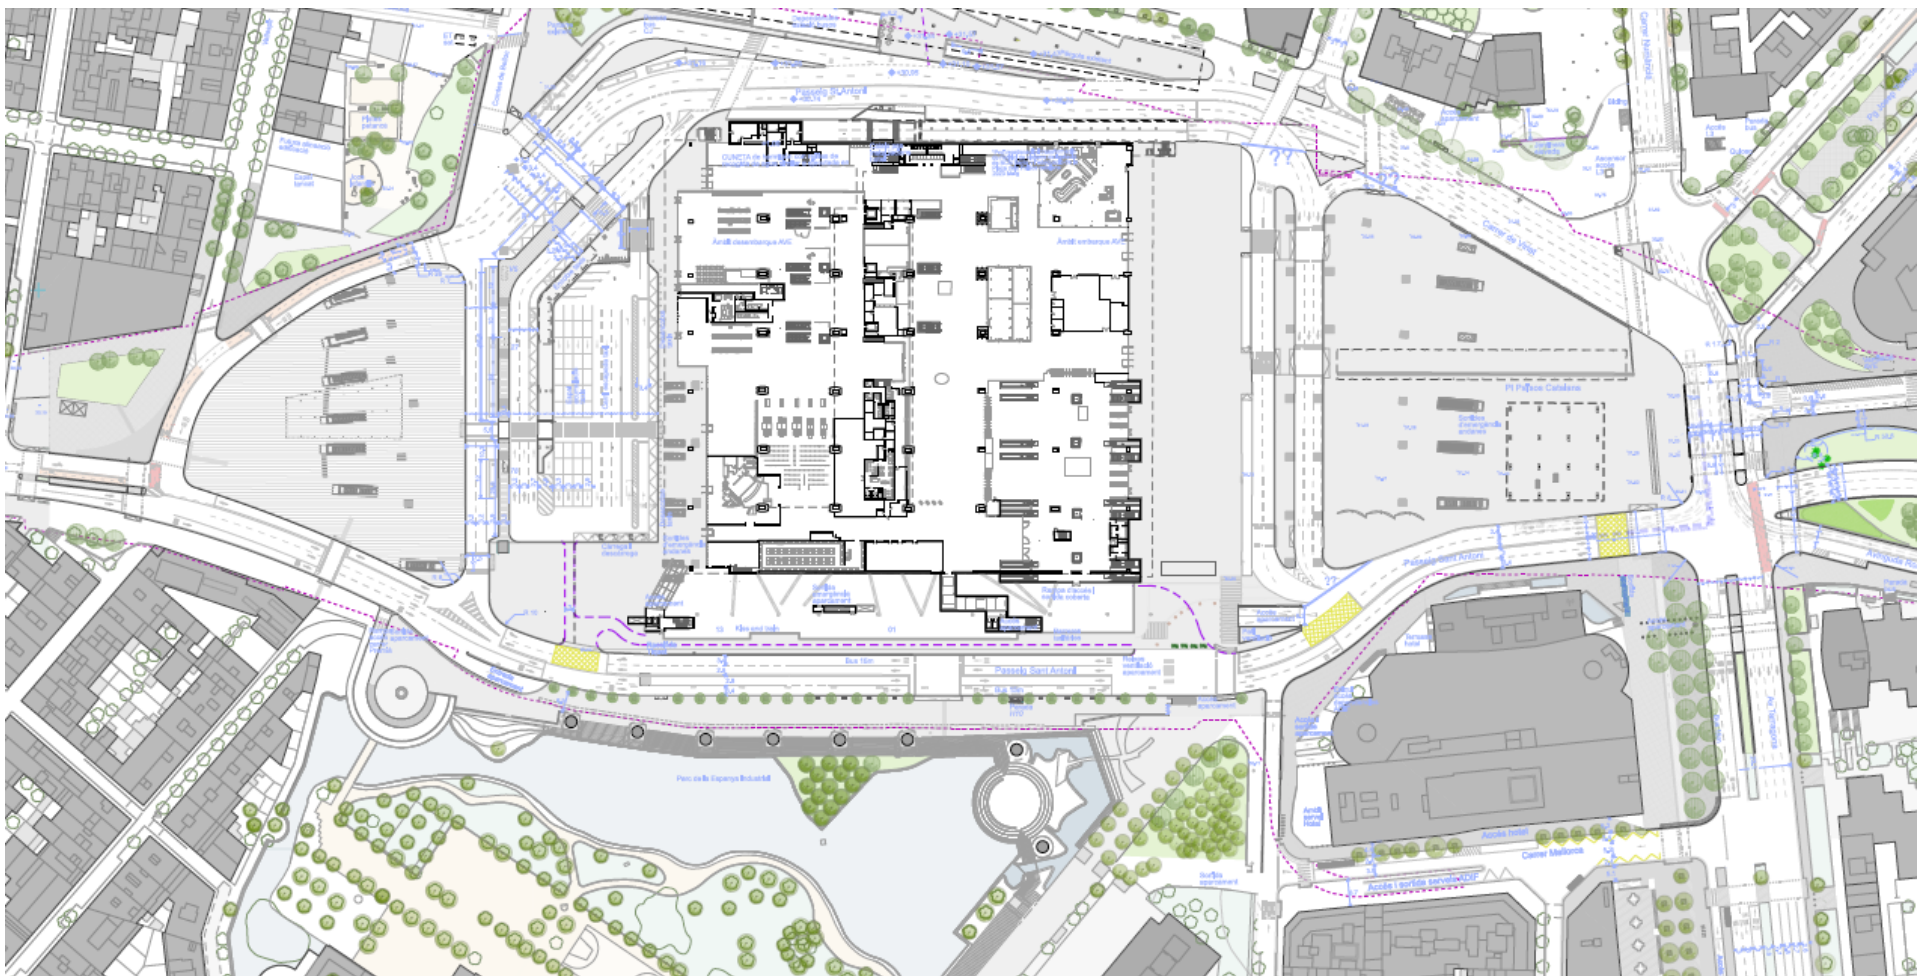


MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ESTAT ACTUAL.-

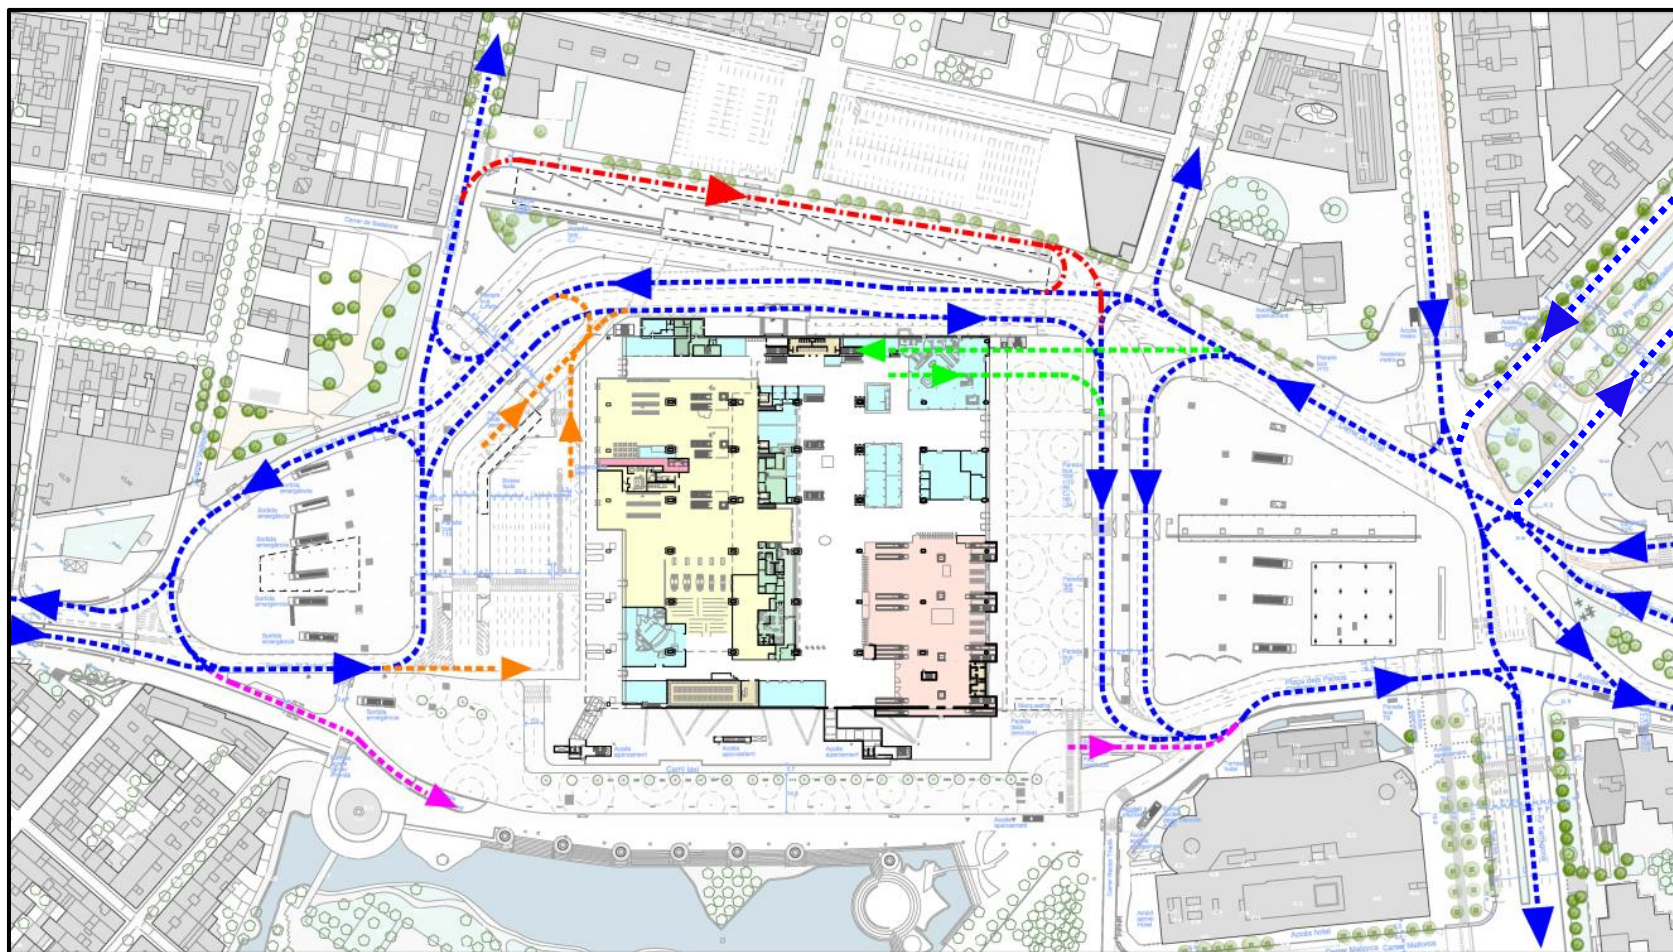


- Flux de vehicles entre costats Llobregat i Besós a través del vial muntanya
- Accés Estació autobusos: Entrada per Comtes Bell-Lloc i Sortida per vial munt. i PPC
- Accés aparcament teulada Estació: Entrada per Viriat i Sortida per plaça PC
- Accés aparcament Taxis: Entrada per plaça JP i Sortida per vial muntanya
- Accés aparcament soterrat Estació: Entrada per Llobregat i Sortida per Besós

- Vehicles particulars
- Autocars. Estació autobusos
- Accessos aparcament teulada Estació
- Taxis. Accessos aparcament Taxis
- Accessos aparcament soterrat Estació

MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ESTAT ACTUAL BUSOS.-

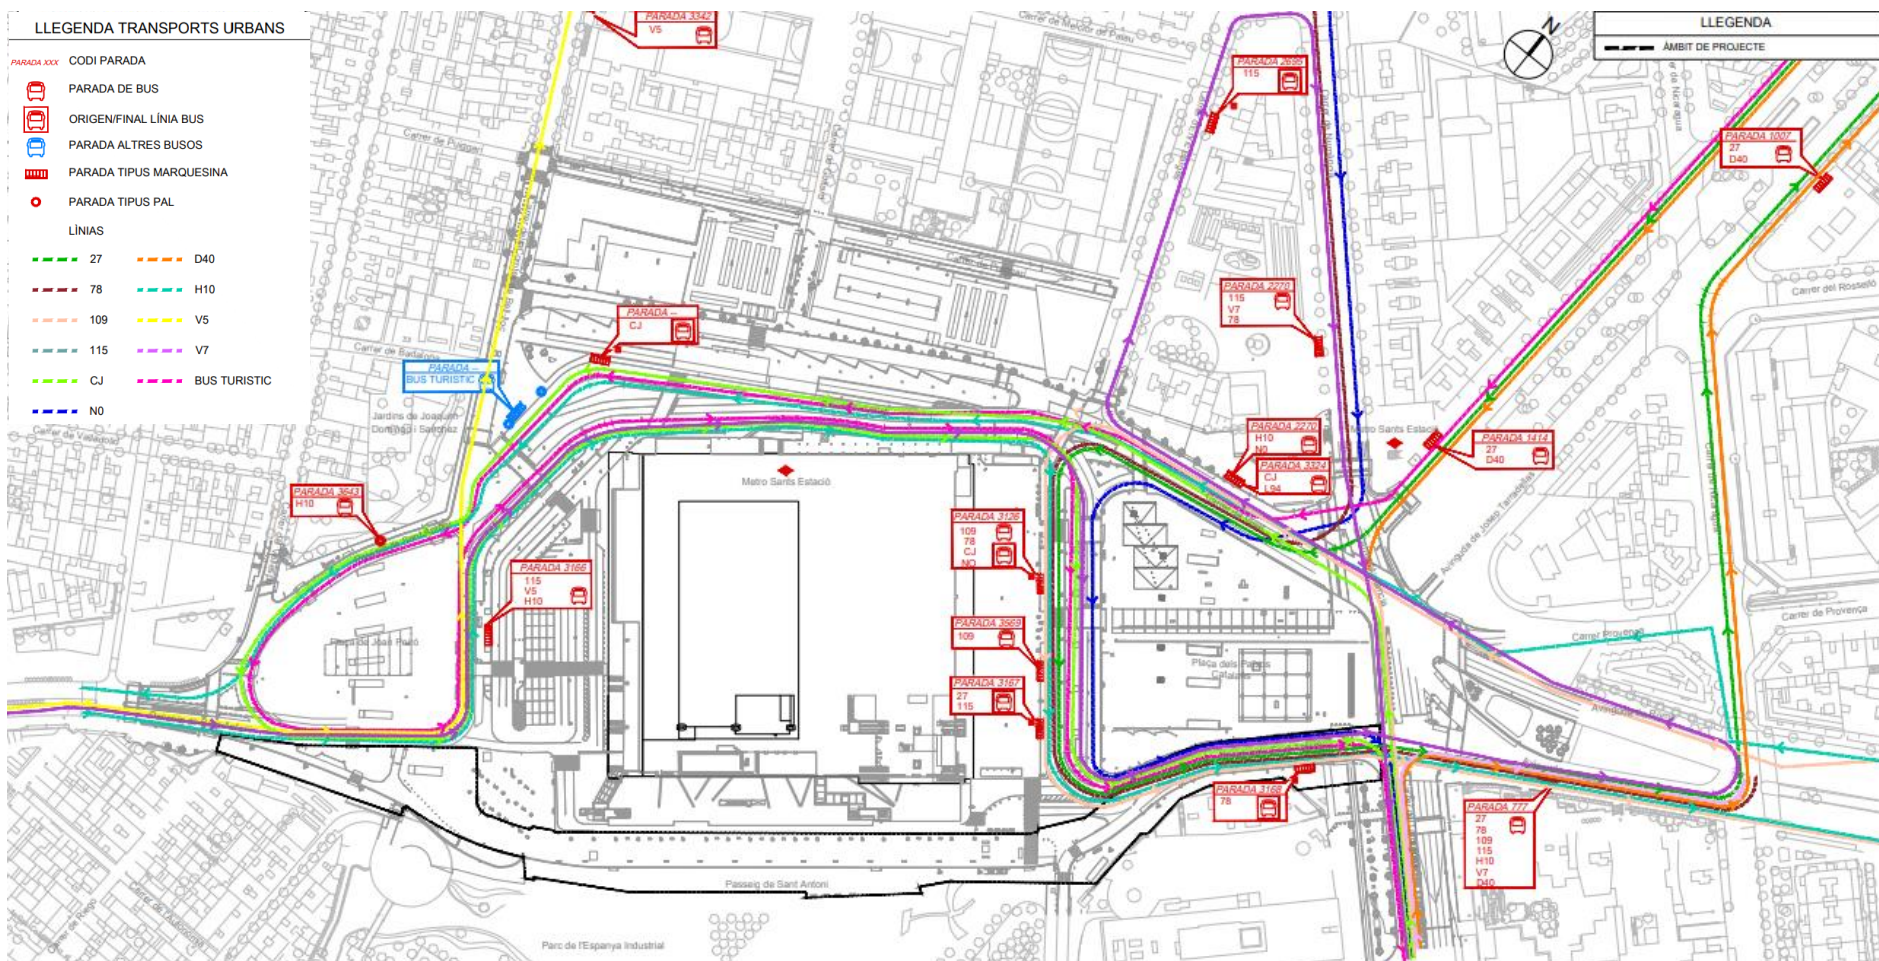


MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ESTAT FI OBRES ÀMBITS 1, 2 I 3.-

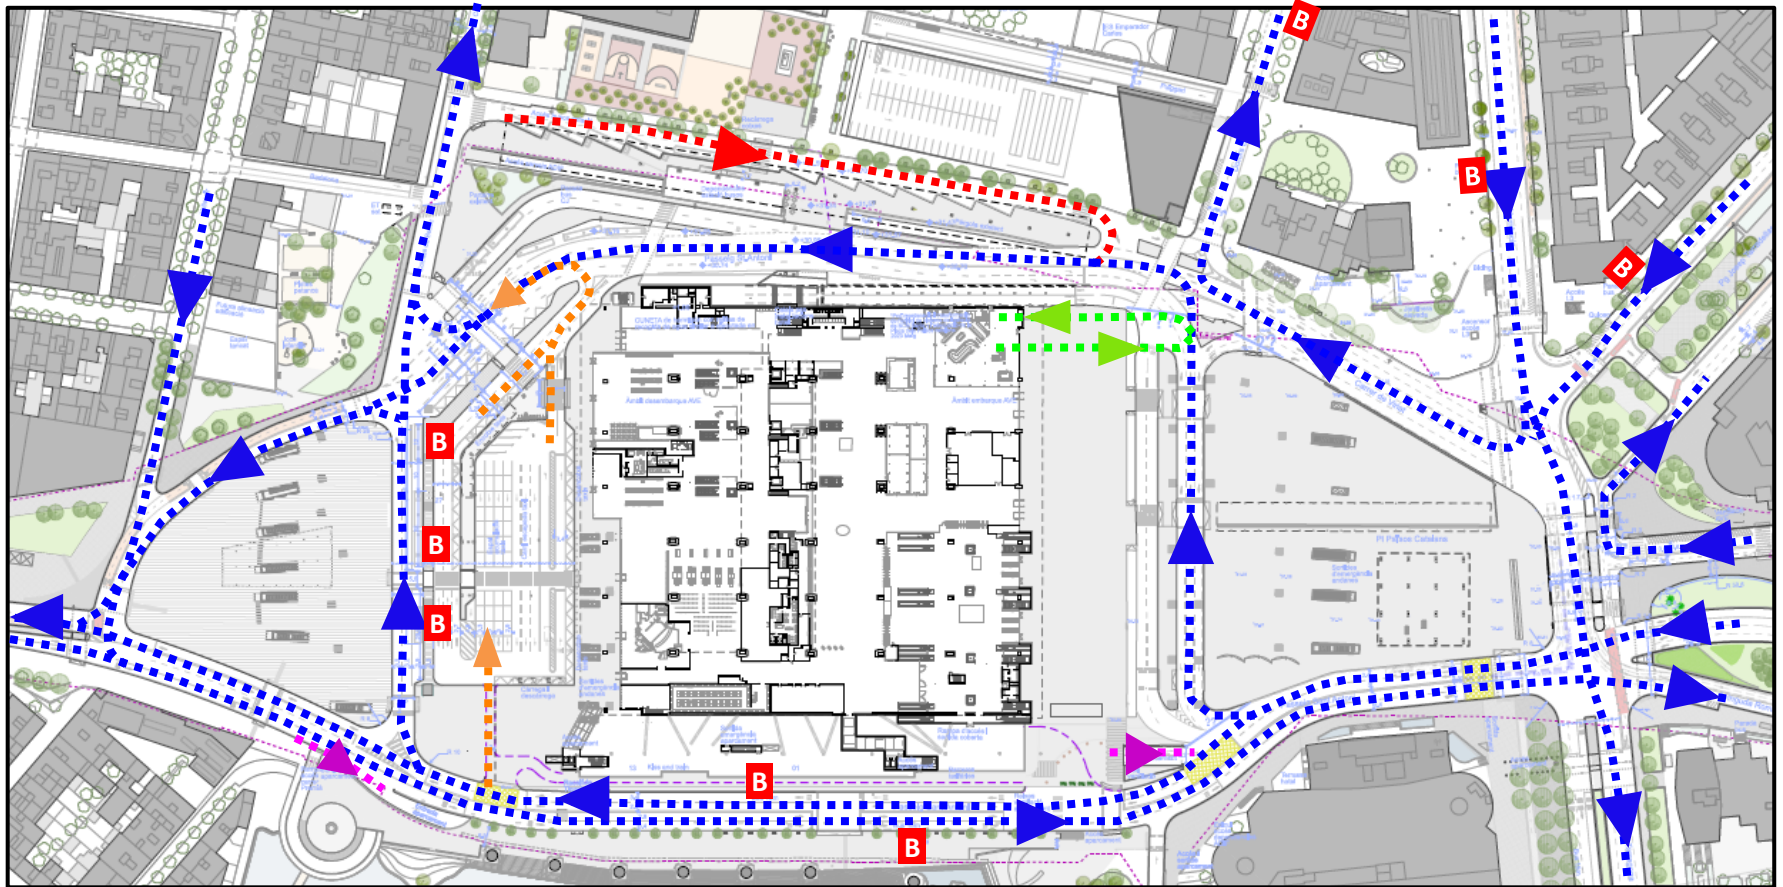

- Flux de vehicles entre costats Llobregat i Besós a través del vial mar
- Accés Estació autobusos: Entrada per Comtes Bell-Lloc i Sortida per vial muntanya
- Accés aparcament teulada Estació: Entrada i Sortida per plaça PC
- Accés aparcament Taxis: Entrada per vial mar i Sortida per vial muntanya
- Accés aparcament soterrat Estació: No es modifica


- Vehicles particulars
- Autocars. Estació autobusos
- Accessos aparcament teulada Estació
- Taxis. Accessos aparcament Taxis
- Accessos aparcament soterrat Estació

MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ESTAT BUSOS FI OBRES ÀMBITS 1, 2 I 3.-

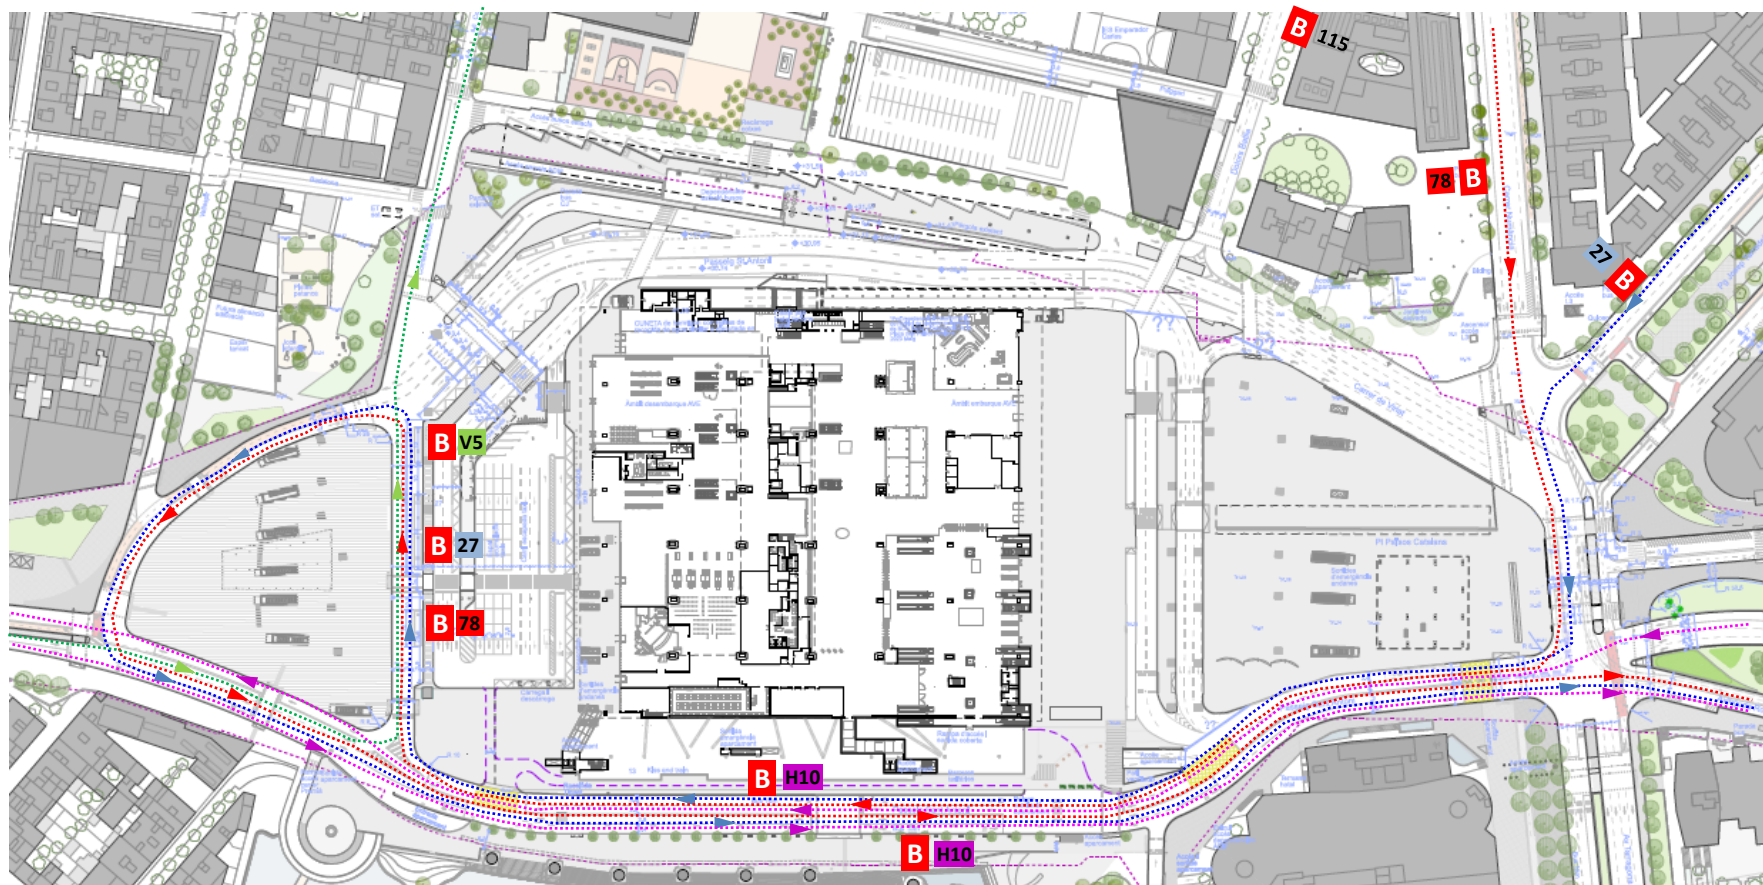

- ■ ■ ■ ■ 27
- ■ ■ ■ ■ 78
- ■ ■ ■ ■ V5
- ■ ■ ■ ■ H10

MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ESTAT BUSOS FI OBRES ÀMBITS 1, 2 I 3.-

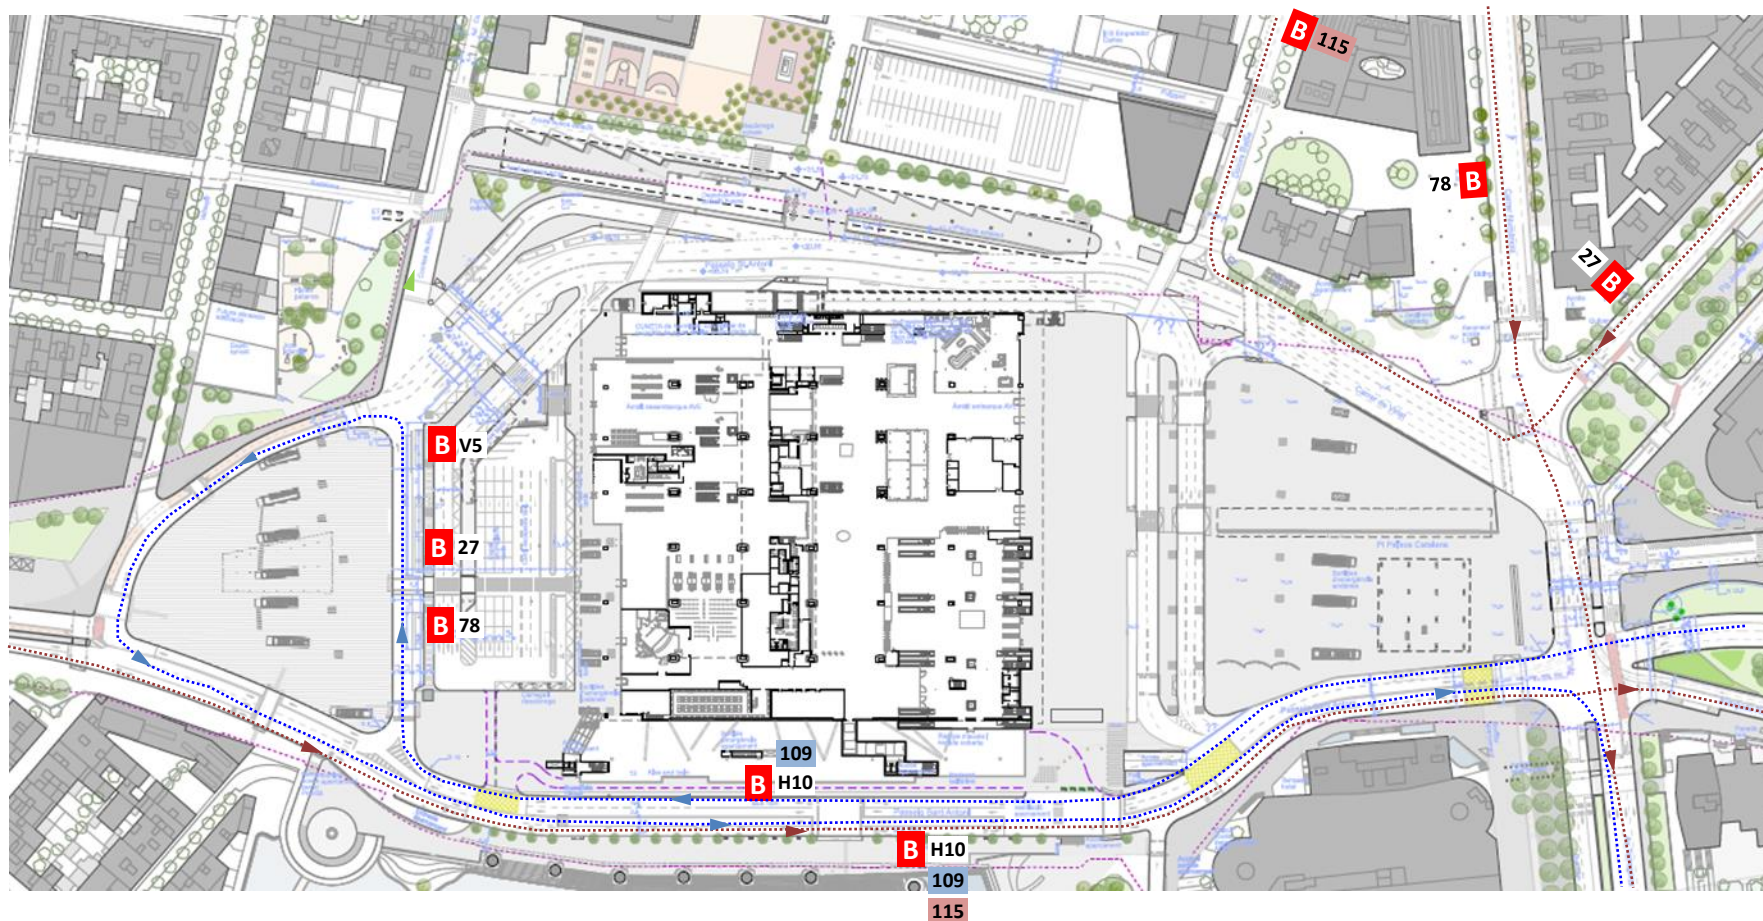

109
115

03

Estat de les obres: Àmbits 1, 2 i 3

ACTUACIONS ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ÀMBIT 1.-




ACTUACIONS ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ÀMBIT 1.-




Canalitzacions creuant serveis c. Tarragona
Transplantament palmera parterre Av. Roma
Nou vial Av. Roma
Embornals al c. Tarragona


ACTUACIONS ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ÀMBIT 2.-

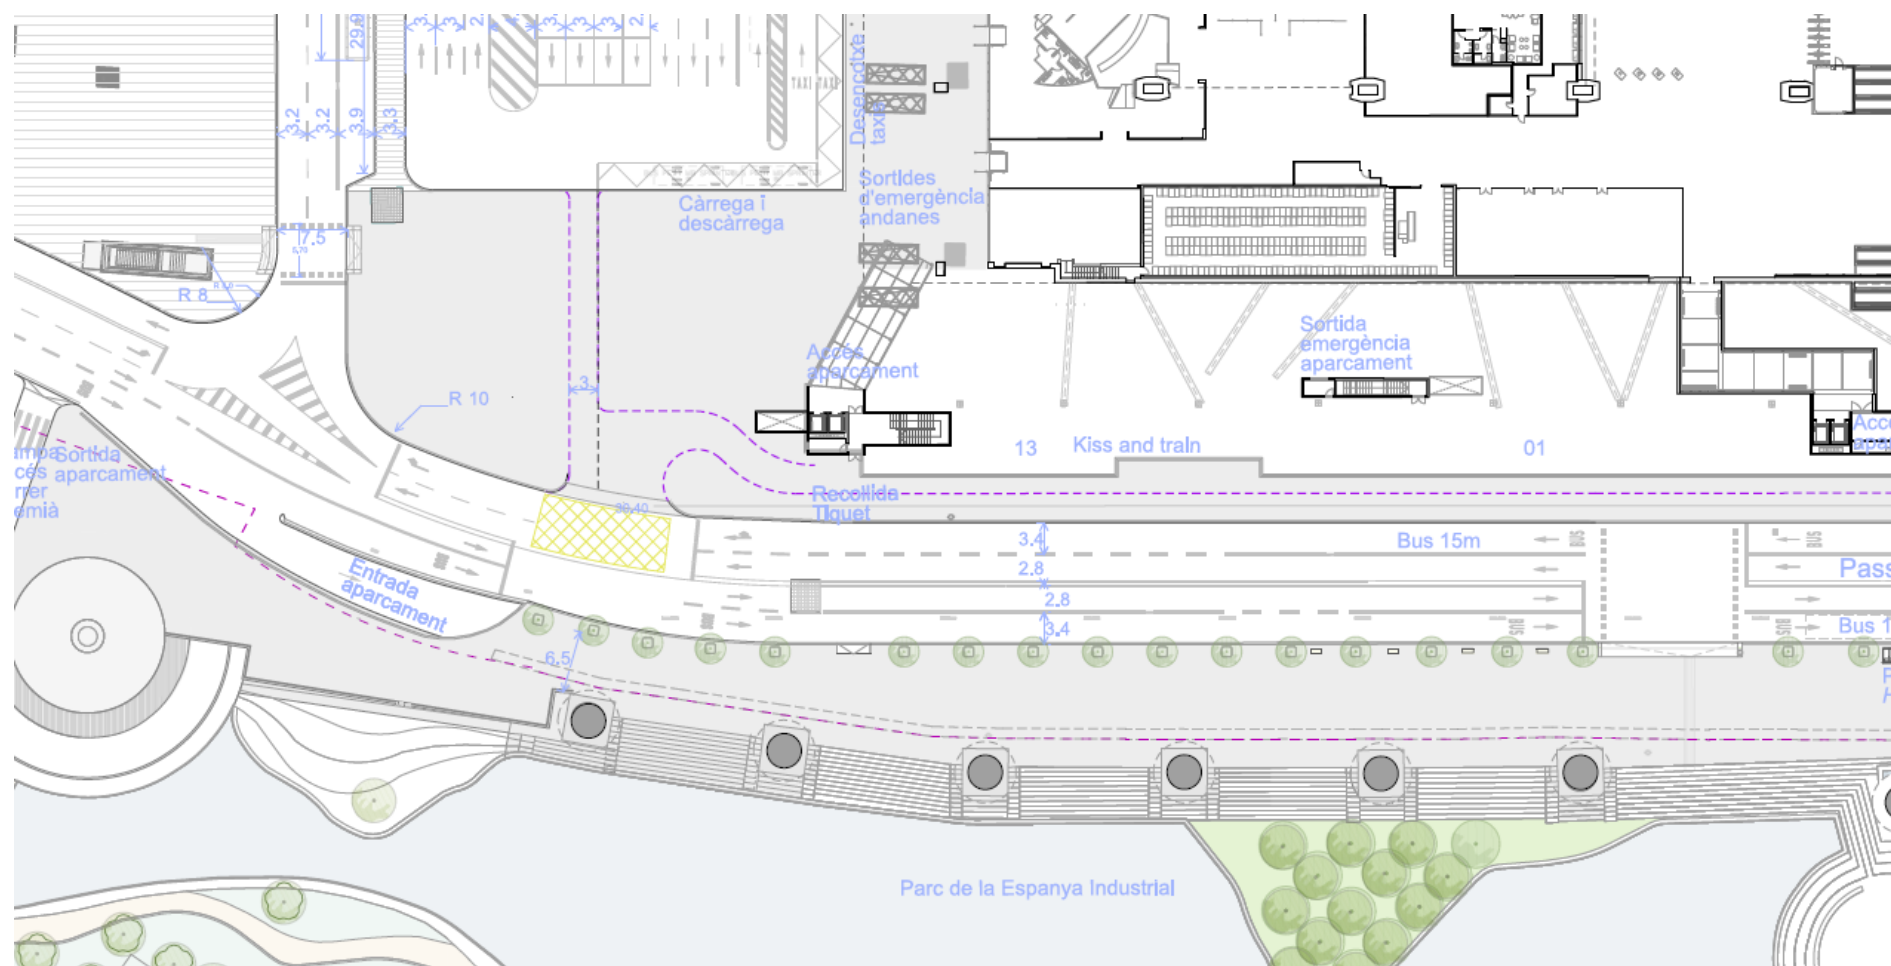

ACTUACIONS ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ÀMBIT 2.-

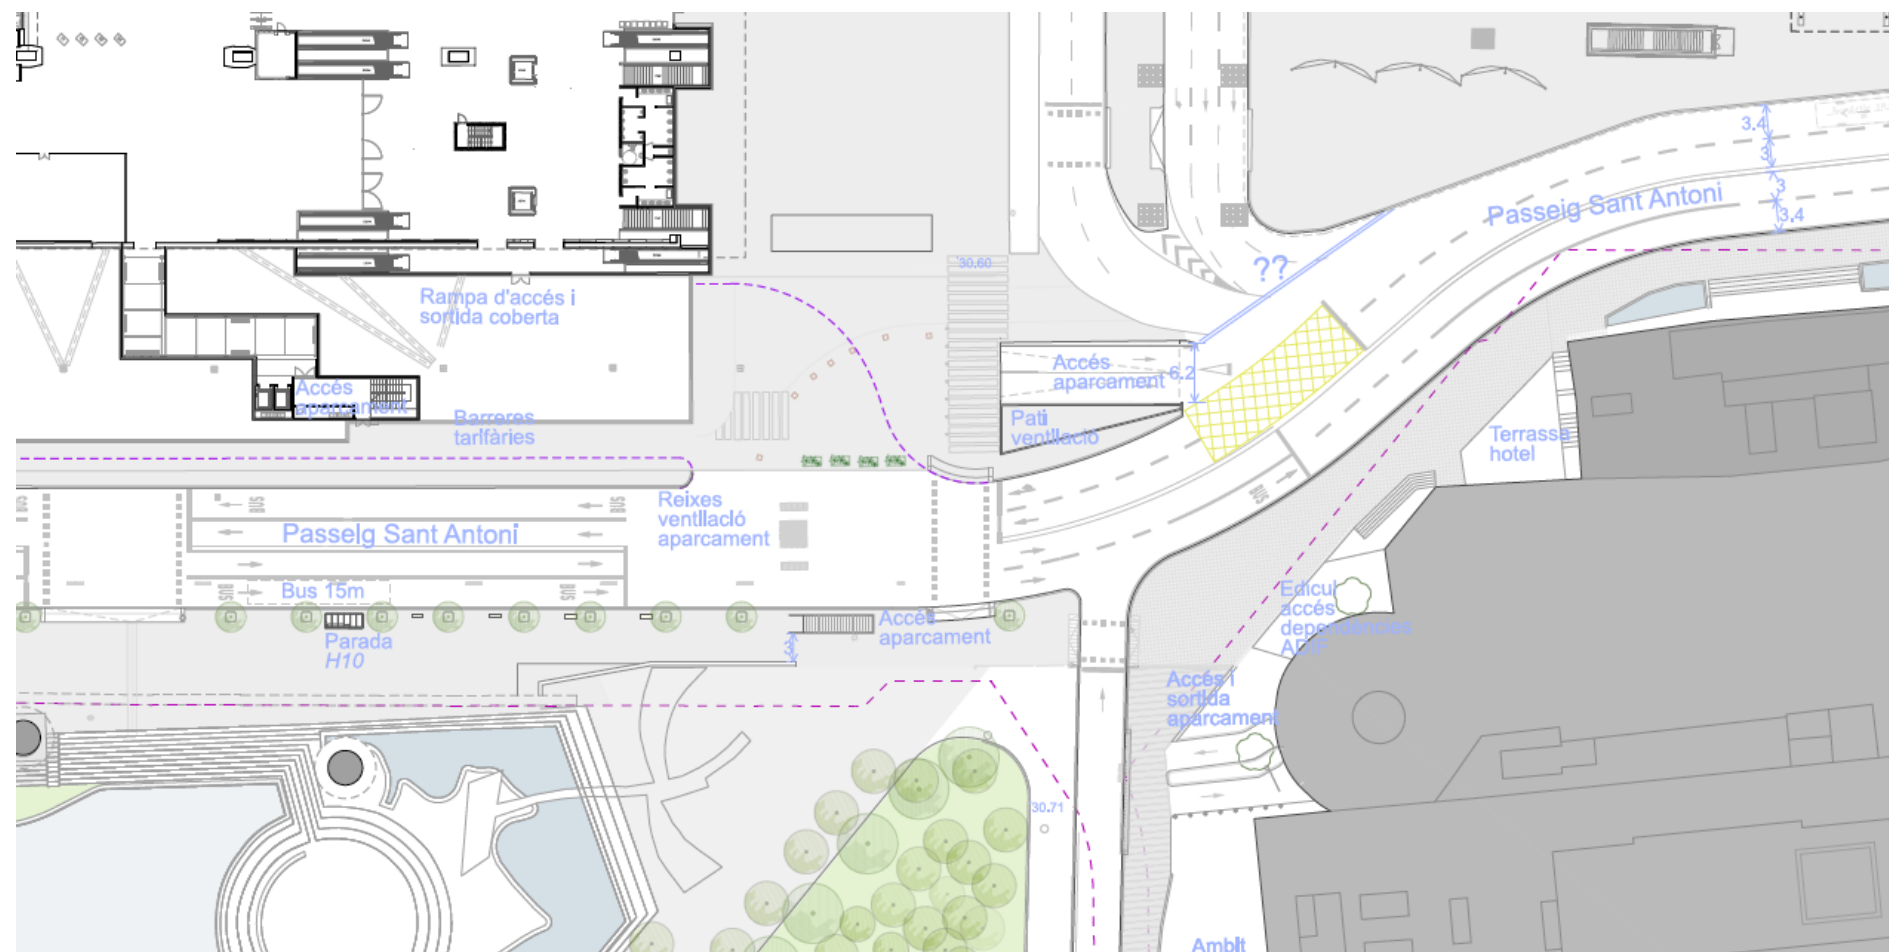


ACTUACIONS ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ÀMBIT 2.-

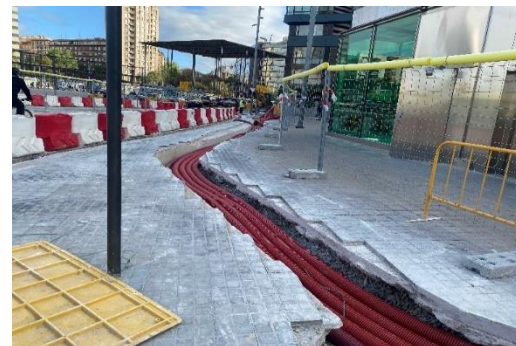

Fresat, rases per serveis, pavimentació i desviament taxis i bus cap a Pl. Joan Peiró

ACTUACIONS ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ÀMBIT 3.-

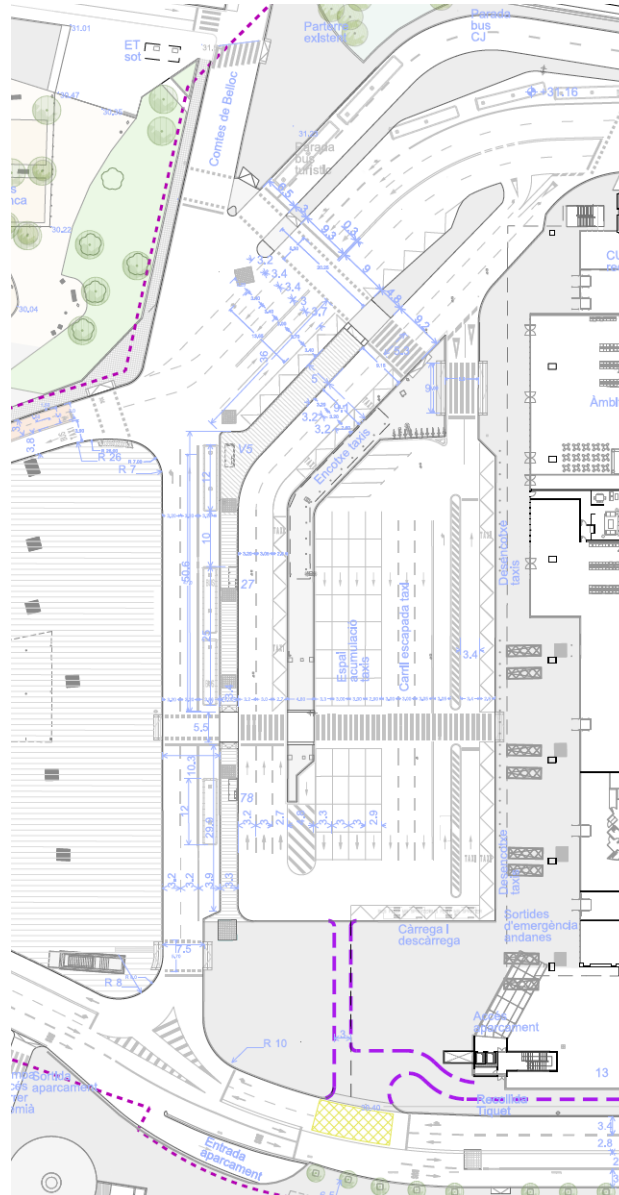

ACTUACIONS ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ÀMBIT 3.-



Treballs de segellat de juntes d'ADIF



Desviament taxis i bus per iniciar tancament illeta Joan Peiró


ADEQUACIÓ DE LA MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS PREVI A LA FASE 1 DE LES OBRES D'ADIF, SANTS-MONTJUÏC

	2023												2024																																									
	Set-Oct-Nov-Des												Gen				Feb				Mar				Abr				Mai				Jun				Jul				Ago				Sep				Oct					
	13 setembre 2023												01	08	15	22	01	08	15	22	19	01	04	11	18	01	08	15	22	01	08	13	20	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21
Acta Replanteig																																																						
1 AMBIT 2 - PG. SANT ANTONI																																																						
1.1 Tram Ps. Sant Antoni																																																						
1.2 Pl. Joan Peiró - Ps. Sant Antoni																																																						
1.3 Tram Rector Triadó																																																						
1.4 Tram Rector Triadó - Tarragona																																																						
2 AMBIT 1 - AV. ROMA - C/TARRAGONA																																																						
1.A Parterre nova vialitat Av. Roma																																																						
1.B Xarxa IMI+Av. Roma, C/Numància i Provença																																																						
3 AMBIT 3 - PL. JOAN PEIRÓ																																																						


04


**Projecte executiu Fase 1 d'ADIF.
Estació, Plaça Països Catalans i Entorns**


Obres d'execució dels projectes de construcció per a la reordenació i transformació de l'edifici de viatgers de l'Estació de Barcelona Sants: Projecte nº1.- Fase 1. Projecte nº2.- Plaza Països Catalans. Projecte nº3.- Entorns. (Expedient: 3.24/20830.0061).

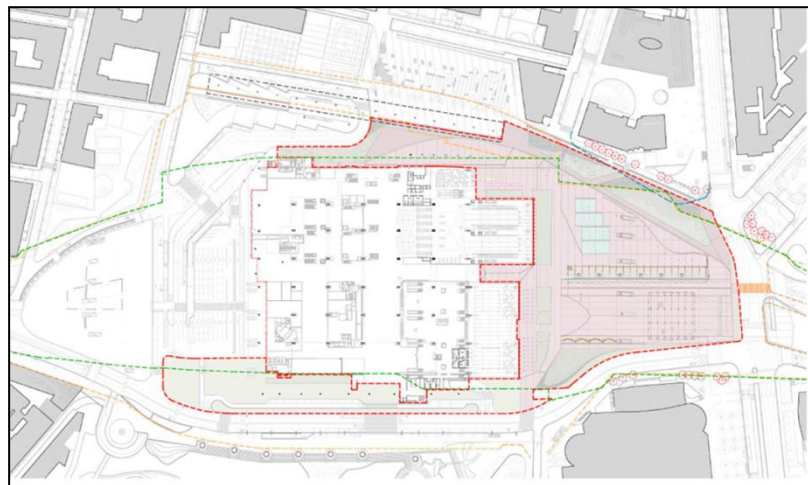

- **ESTAT:** *en licitació per part d'Adif. Publicat al BOE el 19/04/2024.*
- **VALOR ESTIMAT CONTRACTE:** 175.871.278,01 euros
- **DURACIÓ DEL CONTRACTE:** 38 mesos
- **DATA LÍMIT PRESENTACIÓ D'OFERTES:** 13/06/2024
- **OBERTURA OFERTES ECONÒMIQUES:** 12/07/2024
- **ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE:** 4t. Trimestre 2024
- **INICI OBRES PREVIST:** Gener de 2025
- **FINAL PREVIST OBRES ÀMBIT PAÏSOS CATALANS:** Finals de 2026

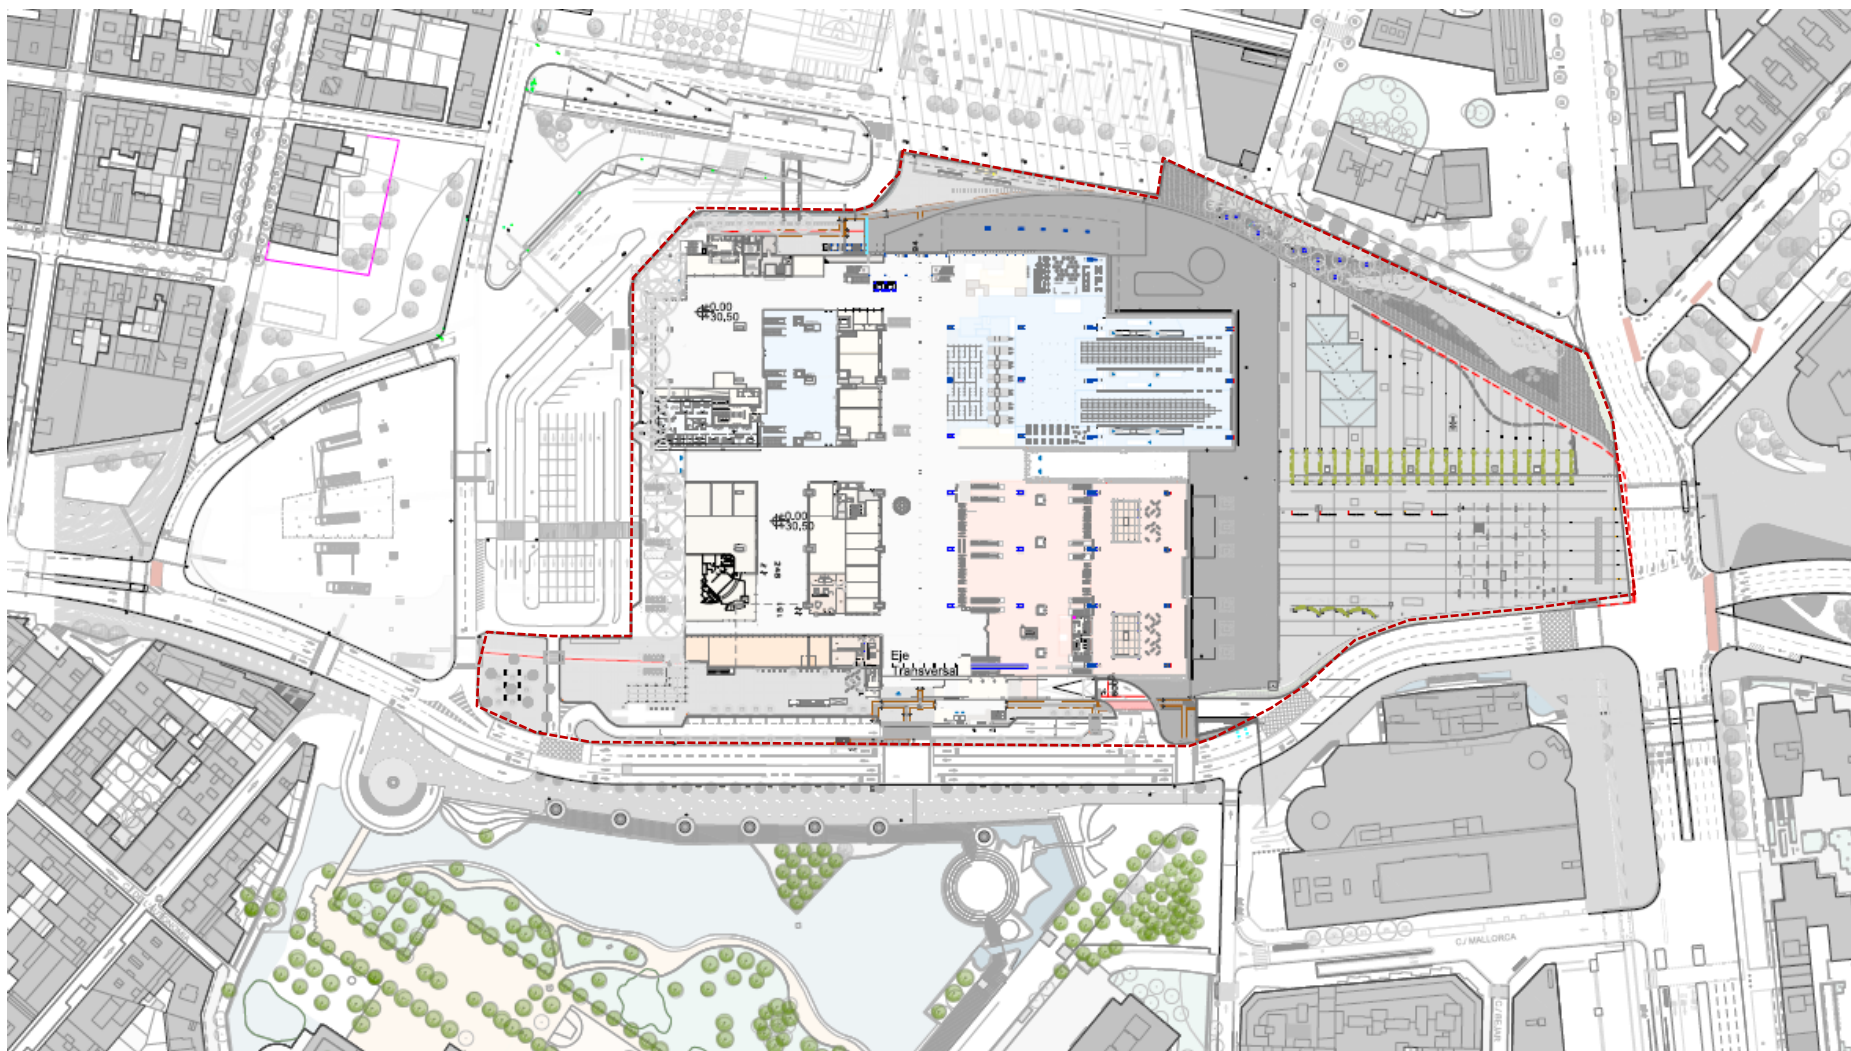

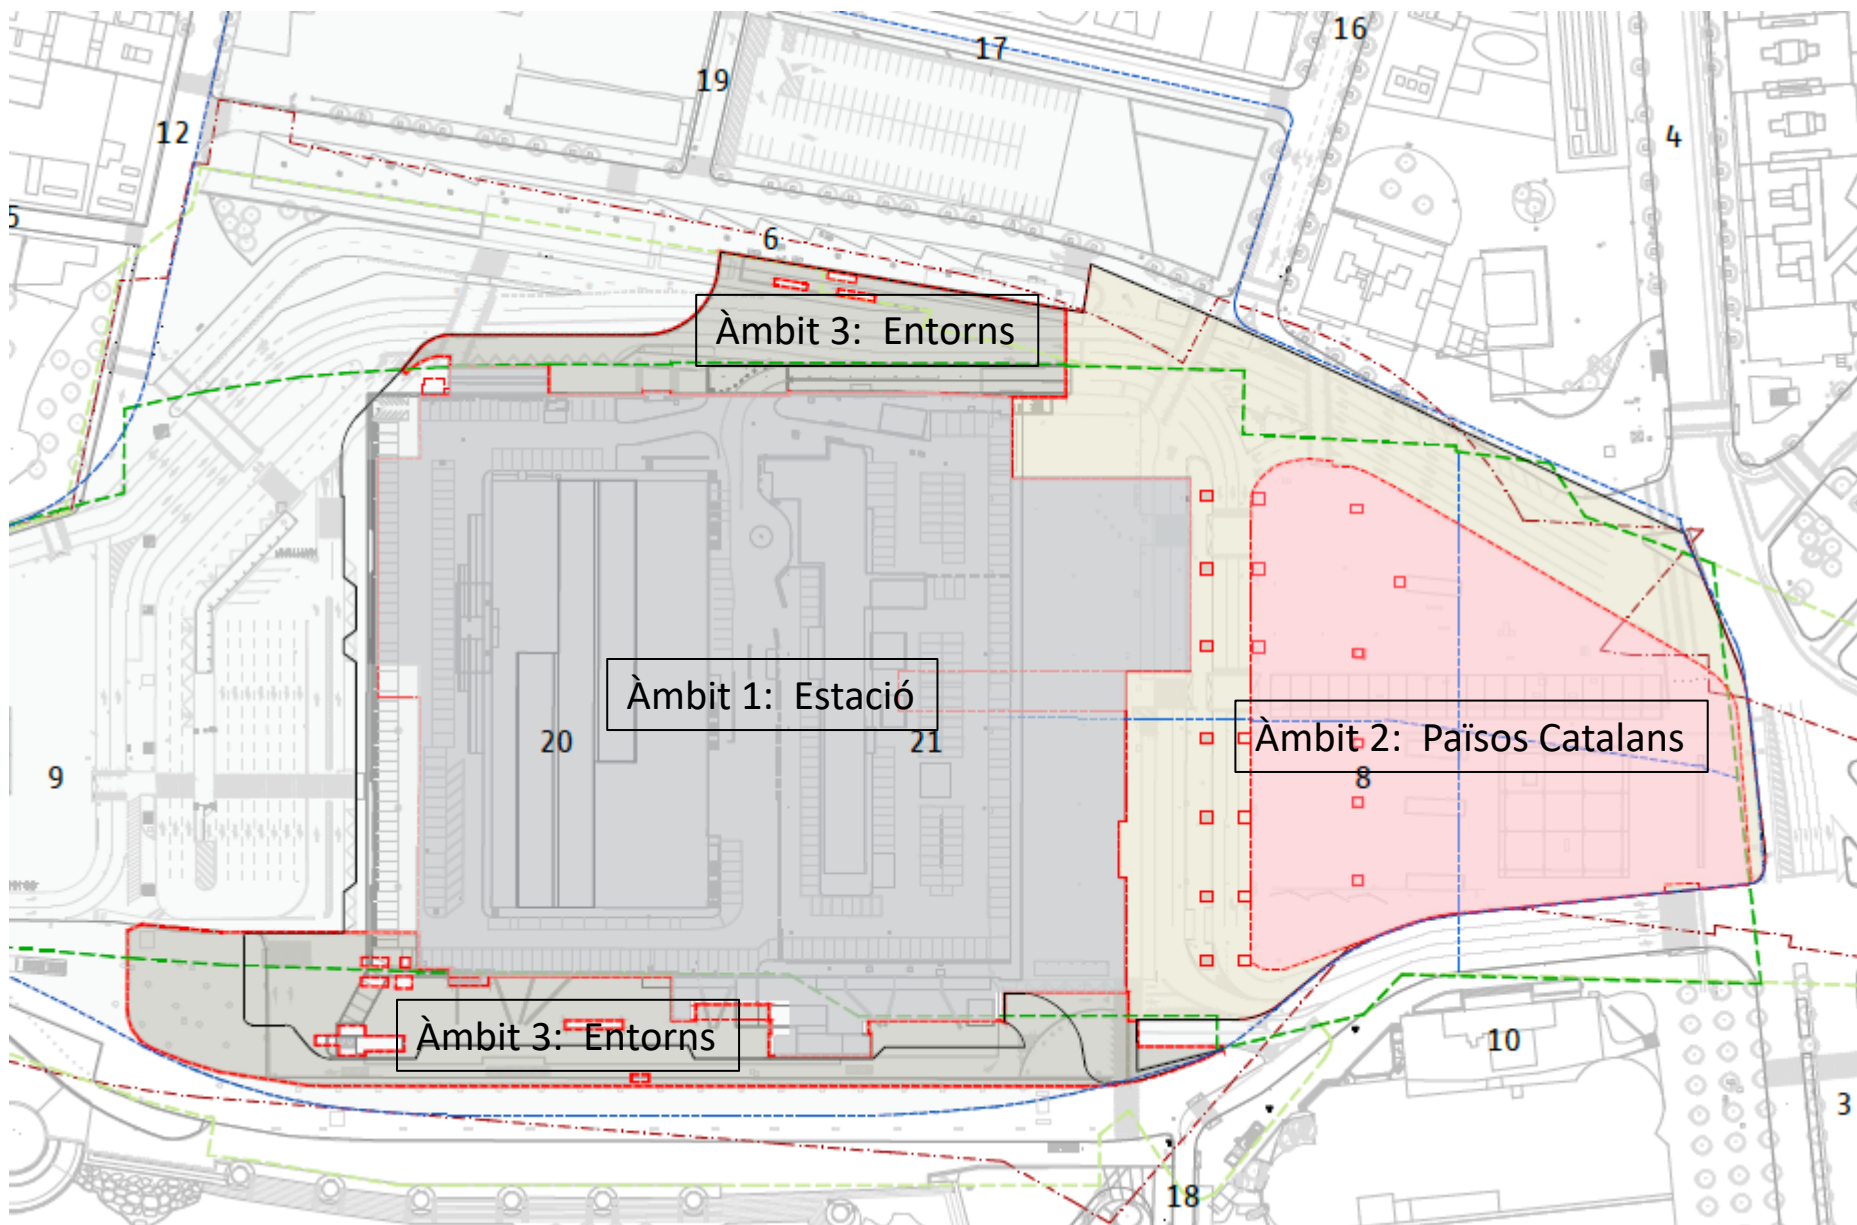


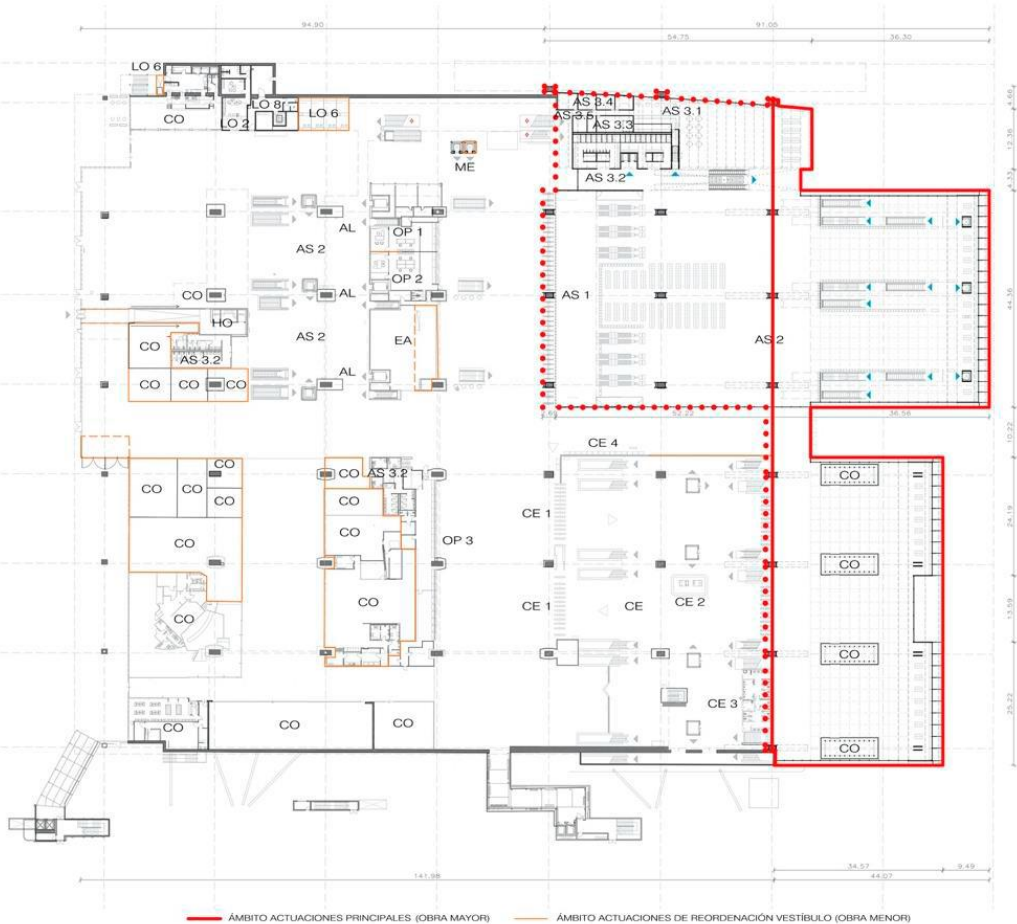

1. Creació d'una nova sala d'embarcament d'Alta Velocitat diferenciant les zones de sortides i arribades. Aquesta nova sala de embarcament es situa al costat Barcelona-muntanya en front la plaça de Països Catalans
2. Creació d'un nou accés més a Rodalies des de la plaça per organitzar els fluxos de sortides que permet una millor experiència al viatger amb una nova àrea d'estància
3. S'obren dos nous accessos en les façanes laterals de l'Estació
4. Nous accessos a l'estació per bicicletes, patinets i vianants per fomentar els recorreguts de darrera milla.
5. s'executaran tres nous nuclis de comunicació amb les andanes d'Alta velocitat i noves zones d'espera.
6. Es reordenen els fluxos en la mobilitat dins l'estació.

1. Reposició de la Plaça dels Països Catalans millorant la connectivitat dels vianants en l'entorn, sense interrupcions rodades.
2. Creació d'una zona de kiss and train al lateral mar de l'estació.
3. Ordenació i pacificació del lateral muntanya.

Detall zona kiss & train

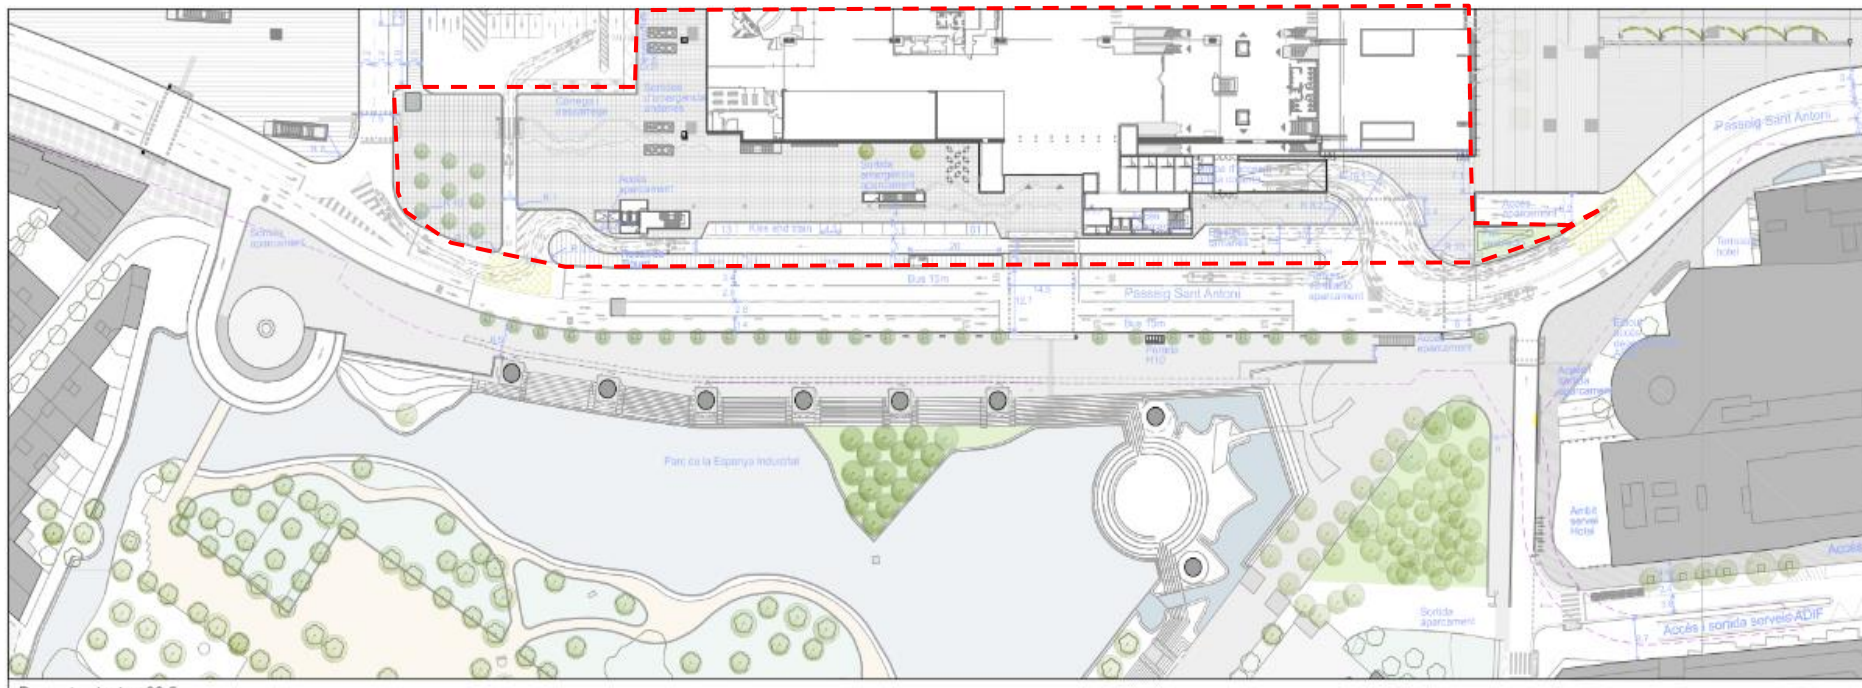

05

Planificació d'actuacions

PLANIFICACIÓ ACTUACIONS ENTORNS ESTACIÓ DE SANTS

2024

2025

2026

1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des gen feb mar abr mai jun jul ago set gen feb mar abr mai jun jul ago set

ÀMBITS AJUNTAMENT 1, 2 i 3

EXECUCIÓ OBRA ÀMBIT 1 i 2

Final obra (07/24)

EXECUCIÓ OBRA ÀMBIT 3

Final obra (09/24)

ÀMBITS AJUNTAMENT 4 i 5

AVANTPROJECTE PPUU + BR

Document definitiu*

PROJ. EXECUTIU - Àmbits 4 i 5
(6 mesos)

Inici redacció*
(04/24)

Maqueta

Auditoria + ITP

PE definitiu auditat i adaptat a ITP (12/2024)

TRAMITACIÓ ADMIN.

Ap. Inicial
(01/25)

Ap. Definitiva (05/2025)

Obtenció informe DGIM

LICITACIÓ OBRA

Publicació
(01/25)

Contracte (07/2025)

COM

EXECUCIÓ OBRA ÀMBIT 4
(6 mesos)

Inici obra
(07/25)

Final obra (01/2026)

EXECUCIÓ OBRA ÀMBIT 5**
(6 mesos)

Inici obra
(07/25)

Final obra (01/2026)

ÀMBITS ADIF – FASE 1 (Primera fase estació, Reposició Països Catalans i els entorns – laterals de l'estació)

Publicació

LICITACIÓ OBRA

Contracte (12/24)

Inici obra

EXECUCIÓ OBRA
(38 mesos)

* CALENDARI SUBJECTE AL
LLIURAMENT D'AVANTPROJECTE
DE L'ÀMBIT 5 (BR+PPUU)

** Caldrà coordinar execució de
l'obra amb les actuacions ADIF a
Plaça Països Catalans

CALENDARI FACILITAT PER ADIF

Fi obra previst
Març 2028
