BLOC E
PLANTA 0
OFTALMOLOGIA QUIROFANS
QUIROFANO 20

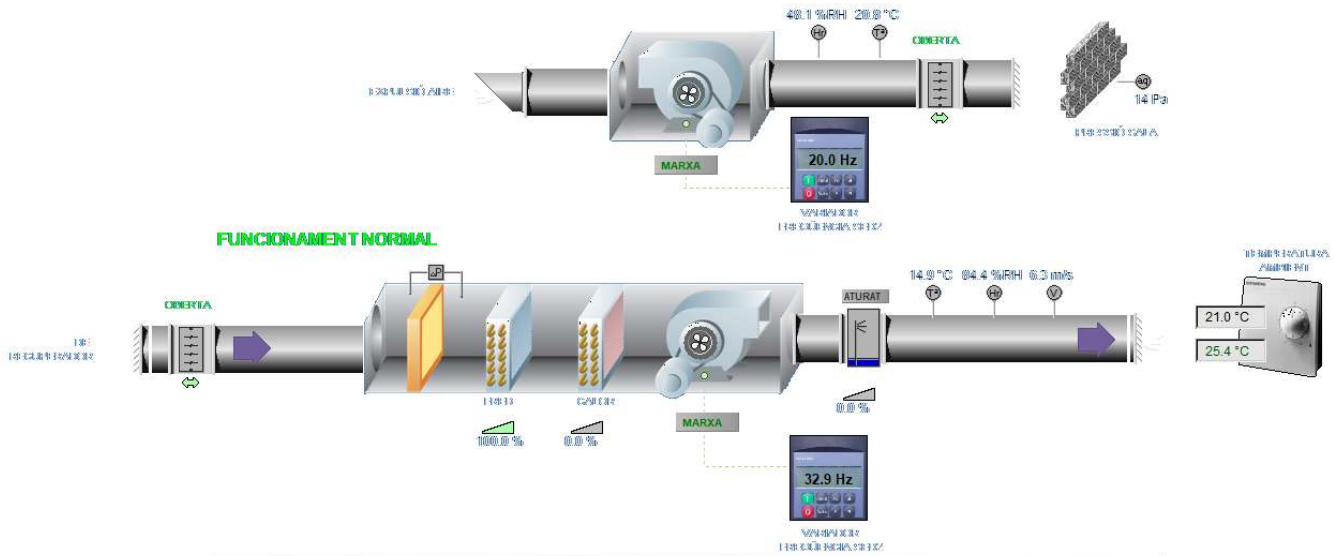

PARAMETRES DE CONTROL

FUNCIONAMENT NORMAL

CONSIGNA TEMPERATURA	20.0
SELECTOR CONSIGNA	Remota
CONSIGNA TEMPERATURA LIMITACIÓ IMPULSIO CALOR	25.0
CONSIGNA TEMPERATURA LIMITACIÓ IMPULSIO FRED	10.0
CONSIGNA VELOCITAT AIRE IMPULSIÓ	6.0
CONSIGNA HUMECTACIÓ	50.0
CONSIGNA DESHUMECTACIÓ	65.0
CONSIGNA HUMITAT LIMITACIÓ IMPULSIÓ	70.0
CONSIGNA PRESSIÓ EXTRACCIÓ	20.0

FUNCIONAMENT ESTALVI ENERGETIC

CONSIGNA CALOR	0.0
CONSIGNA FRED	50.0
CONSIGNA VELOCITAT AIRE IMPULSIÓ	6.0
CONSIGNA HUMECTACIÓ	45.0
CONSIGNA DESHUMECTACIÓ	55.0
CONSIGNA PRESSIÓ EXTRACCIÓ	10.0

HORARI DE FUNCIONAMENT

HORARI FUNCIONAMENT

ACTIU - FUNCIONAMENT NORMAL
PARAT - FUNCIONAMENT ESTALVI ENERGETIC
