

Pressupostos
participatius 2020-2023

Balanç de la primera experiència a Barcelona.

Democràcia en acció.
El poder de la comunitat
a Barcelona.



Ajuntament de
Barcelona

Edició: Juliol 2024.

Edita: Ajuntament de Barcelona.

Coordinació de l'edició: D.S. Participació i Innovació Democràtica
Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat.

Avís legal: Es permet la reproducció total de les dades i la informació que provenen de fons municipals citant-ne la procedència. El contingut d'aquesta presentació està sota una llicència Creative Commons By-SA license.



Introducció	5
Què són els pressupostos participatius?	6
El procés de pressupostos: fases i desenvolupament	10
Les xifres dels pressupostos participatius	11
L'execució dels projectes: xifres i valoracions	12
Projectes executats parcialment o no executats: causes	21
Els pressupostos participatius: balanç qualitatiu	22
Aprenentatges i reptes per a la nova edició	25
Annex 1: Resum econòmic	29
Annex 2: Fitxes dels 76 projectes	40



Introducció

Aquest document recull un balanç del procés de Pressupostos Participatius 2020-23, parant especial atenció a la seva execució i als aprenentatges que se'n poden extreure. És un informe que prioritza les xifres i les idees que resumeixen la realitat d'un procés, la seva dimensió i complexitat. Una anàlisi que contribueix a la difusió i l'avaluació d'aquest procés participatiu per millorar-ne futures edicions. Cal posar de manifest que l'experiència de Pressupostos Participatius de Barcelona s'ha situat en una de les iniciatives d'aquesta tipologia de processos més rellevants a escala internacional tant pel volum de pressupost, el nombre de participants i per la qualitat de la participació i dels projectes recollits.

Quan a principis del mandat 2019-23 es va decidir impulsar aquest procés participatiu, poc es podia saber que unes setmanes després d'haver-lo engegat esclataria una pandèmia mundial i que les dificultats i la magnitud del projecte, perllongarien l'execució d'una part dels projectes guanyadors fins més enllà del final de mandat. Per això ara és el moment per fer aquest exercici. Així i tot, l'execució es troba ja molt avançada, amb una gran majoria de projectes finalitzats, alguns projectes amb les obres ja programades per als pròxims mesos, superant així més del 80% de l'execució tal com es pot consultar al [decidim.barcelona](#).

El desenvolupament de totes les fases del procés participatiu va generar una gran quantitat de dades i també de valoracions i

reflexions. L'objectiu d'aquest document se centra principalment en aquesta fase final d'execució i en un resum global que permeti enfocar una nova edició de pressupostos participatius pel mandat 2024-2027. Actualment, ja es treballa intensament amb la segona edició dels Pressupostos Participatius a Barcelona. Així, que de nou és un moment idoni per avaluar com ha funcionat la primera edició i reflexionar sobre quines conclusions cal treure per introduir les modificacions pertinents.

El document comença introduint breument com es va definir el procés i exposa de forma gràfica quines van ser les seves fases. A partir d'aquí s'exposen les principals dades sobre l'execució tant a nivell d'estat de les actuacions, com de balanç econòmic i es detallen les diferents casuístiques sorgides durant aquesta fase, incloent-hi valoracions quantitatives dels promotors. A continuació es llisten els projectes que no s'han executat o que no s'han pogut desenvolupar en tota la seva extensió i s'exposen els motius.

Després s'exposa perquè aquesta eina ha obert un camí innovador sobre com millorar la relació entre la ciutadania i administració a l'hora de construir i transformar la ciutat. Finalment, es presenten els reptes principals de cara al futur. En els dos annexos inclosos es troba la informació detallada sobre les xifres econòmiques i unes fitxes individuals de cadascun dels 76 projectes amb la informació principal i l'anàlisi de l'execució de cadascun.

Execució i Resultats

Malgrat les dificultats causades per la pandèmia, el procés participatiu ha avançat significativament, amb més del 80% dels projectes ja executats o programats.

Innovació i Reptes Futurs

L'eina ha contribuït a millorar la relació entre la ciutadania i l'administració en la construcció i transformació de la ciutat. També es presenten els reptes futurs i informació detallada sobre les xifres econòmiques i l'execució dels 76 projectes.

Què són els pressupostos participatius?

Democràcia en acció.
La ciutat que fan els veïns i veïnes.



Què són els pressupostos participatius?

Els Pressupostos participatius 2020-2023 han constituït un procés participatiu innovador a Barcelona, en ser la primera vegada que es realitzava una experiència participativa d'aquestes característiques al conjunt de la ciutat. Bevent d'experiències similars de l'entorn més proper i d'arreu del món i amb l'experiència acumulada de molts anys de foment de la participació en la ciutat, els Pressupostos participatius han permès als veïns i veïnes de la ciutat **escollir de manera directa projectes d'inversió per a cadascun dels deu districtes de Barcelona**, i veure com aquests s'han anat executant.

L'objectiu general del procés participatiu ha estat **generar espais i canals que permetin a la ciutadania construir i deliberar sobre les necessitats, els reptes i les prioritats de la ciutat i projectes concrets a executar durant el mandat**. I partint d'aquest, ha comptat amb una sèrie d'objectius específics:

- Promoure mecanismes de democràcia directa que convisquin amb la democràcia representativa i la deliberativa: potenciar la participació ciutadana en les inversions municipals mitjançant la definició i votació de projectes d'inversió a executar durant el mandat.
- Desenvolupar un procés participatiu que s'integrés de manera coherent amb l'elaboració del PAM/PAD, malgrat que la pandèmia va truncar aquesta visió.
- Generar un procés participatiu àgil, eficient i comprensible per a les persones i entitats que en prenen part.
- Promoure una participació accessible i inclusiva.
- Incorporar la perspectiva de gènere i promoure una participació plural i diversa.
- Possibilitar una participació activa de la ciutadania, oberta i transparent, ampliant la seva capacitat d'incidència.
- Vetllar per la presa en consideració d'aportacions realitzades en processos participatius anteriors, per evitar repeticions i la sensació de 'començar de zero'.
- Articular els òrgans de participació existents a la ciutat amb els espais de debat generats específicament pel procés participatiu.
- Promoure la participació híbrida (presencial i digital) a través de la plataforma decidim.barcelona.

Innovació i participació ciutadana

Els Pressupostos participatius 2020-2023 van permetre als ciutadans de Barcelona escollir projectes d'inversió per als deu districtes.

Objectius Generals

L'objectiu principal era crear espais per deliberar sobre les necessitats de la ciutat, promovent la democràcia directa, una participació inclusiva i la perspectiva de gènere.

Metodologia i inclusió

Es va buscar un procés àgil i comprensible, integrat amb el PAM/PAD, promovent la participació híbrida i la integració dels òrgans de participació existents amb els nous espais de debat.

El procés participatiu es va plantejar des d'un inici amb un enfocament transversal, combinant tres perspectives:

1. **Voluntat d'interpel·lar a la ciutadania de Barcelona en el seu conjunt.**
2. **Buscar mecanismes de distribució i equilibri territorial en la participació i execució dels projectes.**
3. **Abordar tots els àmbits temàtics possibles que requereixin amb pressupost d'inversió.**

Aquests objectius i aquesta voluntat de transversalitat es van traslladar a la metodologia amb mesures concretes:


- Rebaixant l'edat mínima per a prendre part en el procés fins als 14 anys.
- Plantejant un model híbrid de participació (digital i presencial) que desplega múltiples canals per a participar.
- Convocant debats i espais de participació ad hoc encarats a facilitar la participació de persones o col·lectius que generalment no participen.
- Oferint servei d'acollida i recursos d'accessibilitat per a les sessions presencials de debat.
- Establint un pressupost específic per a projectes de cada districte de la ciutat, garantint així una distribució territorial més equilibrada.
- Definint el pressupost disponible per a cada districte tenint en compte variables sociodemogràfiques.
- Desplegant un total de 18 àmbits temàtics sobre els quals es podien desenvolupar projectes.



Finalment és important assenyalar una sèrie de criteris generals que van inspirar el disseny de tot el projecte:

1. **Construcció col·lectiva:** un dels punts de partida d'aquest procés participatiu ha estat consolidar la construcció compartida de les polítiques públiques de la ciutat de Barcelona. Tot i que alguns projectes no estaven presentats per col·lectius i és un aspecte a repensar.
2. **Democràcia directa:** la incorporació de la metodologia dels Pressupostos participatius ha permès a la ciutadania la proposició i elecció de projectes d'inversió que han suposat una part del total del PIM del mandat.
3. **Desenvolupament de recursos i canals de participació diversos:** s'han contemplat una diversitat i heterogeneïtat de canals i formats de participació per poder interpel·lar al conjunt de la ciutadania, tenint en compte la seva pluralitat. S'han potenciat els debats, les trobades presencials, la presència a peu de carrer i la plataforma digital de participació ciutadana decidim.barcelona, que ha estat el suport del procés participatiu i l'espai on s'ha centralitzat tota la informació vinculada a aquest. La pandèmia va fer, però que la part presencial tingués un pes menor al planificat.
4. **Coproducció:** s'ha treballat per a facilitar una intervenció àmplia de la ciutadania en les diverses fases del procés participatiu. S'han habilitat eines de coproducció col·lectiva, com poden ser les sessions de concreció on veïns, entitats i administració van treballar de manera conjunta per a detallar els projectes que havien de passar a la votació final. Això permet compartir la dificultat d'impulsar projectes i la necessària adaptació de la idea inicial per acabar tenint una inversió feta.
5. **Participació eficient:** Es va treballar per garantir que tots els discursos i punts de vista poguessin ser expressats i incorporats al procés sense generar un desgast innecessari per a la ciutadania. Per a fer-ho, es va plantejar un procés amb capacitat de recollir aquesta diversitat, tot evitant solapaments o repeticions innecessàries d'espais de participació.
6. **Participació enxarxada al territori:** La participació ha de ser adaptada i adequada al volum, necessitats i característiques de la població dels 10 districtes i dels 73 barris de la ciutat. Es va focalitzar l'àmbit d'actuació en els districtes i es van establir criteris sociodemogràfics per a distribuir el pressupost total disponible, alhora que es van definir criteris de distribució dels projectes entre els barris de cada districte, per evitar que tots els projectes es concentrassin en un sol barri.
7. **Transparència i traçabilitat:** la qualitat d'un procés participatiu passa per garantir el lliure accés a tota la informació vinculada, tant pel que fa als objectius i límits, com als mecanismes i convocatòries dels espais de participació i, en general, tota aquella informació rellevant. També és necessari possibilitar la consulta i el seguiment dels projectes presentats, dibuixant la seva traçabilitat, des de la proposta fins a l'execució. Això ha estat possible en tot moment a través de la plataforma decidim.barcelona.
8. **Diversitat de persones, opinions i interessos:** el disseny del procés s'ha orientat a possibilitar la participació del conjunt de la població de Barcelona, tenint en compte la seva heterogeneïtat socioeconòmica, territorial, d'origen, gènere, etc. Queda un llarg camí a recórrer perquè la participació real sigui semblant a la de la ciutadania que viu a la ciutat.

El procés de pressupostos: fases i desenvolupament

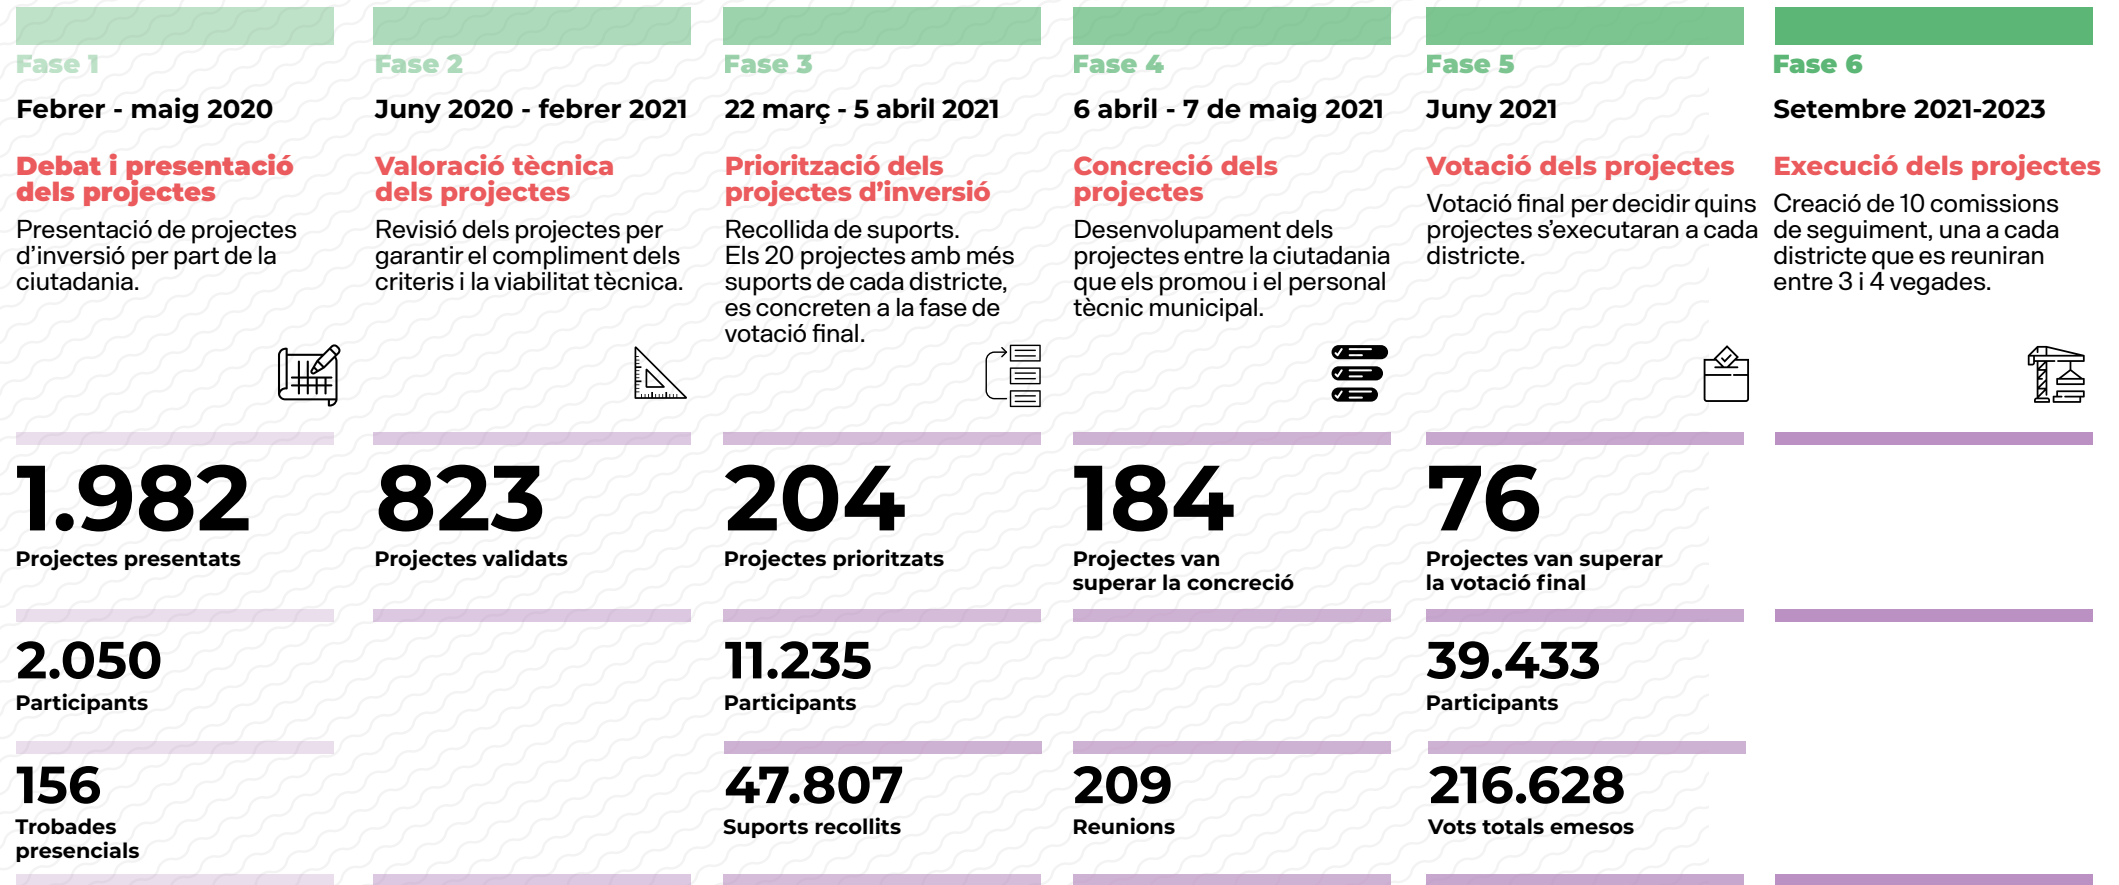

Les xifres dels pressupostos participatius

Les dades generals

30,7 M€

Invertits en el conjunt dels projectes (procés + execució)

76

Projectes escollits

El procés

1.982

Propostes inicials de projectes

73.490

Participacions en total

39.433

Votants a la fase final

706

Espais de participació

365

Trobades i reunions

750.275€

De despesa del procés

L'execució

30 M€

Pressupostats

58%

Han sofert una desviació pressupostària per sota del 20%

394.070€

Mitjana per projecte

29,9 M€

Executats

82%

D'execució (provisional)

7,8

Nota mitjana de valoració

Del procés per part dels promotors (escala 1-10)

Execució dels projectes: xifres i valoracions

- A finals de maig de 2024, **el percentatge d'execució global dels projectes de Pressupostos Participatius 2020-23 és del 82,2%**. El nivell d'execució varia entre les diferents tipologies de projectes. Els referents a equipaments educatius i entorns escolars s'han executat per complet, així com els vinculats a equipaments esportius. Les pacificacions o remodelacions de carrers són els que presenten un nivell més discret d'execució provisional amb el 60,5%. En relació amb els districtes, Nou Barris és el que presenta un nivell més modest, amb el 63,3% i Sants-Montjuïc el més alt, amb un 97%.
- En relació amb l'execució pressupostària, **la despesa total prevista ha crescut un 2,8%**: dels 29,15 milions d'euros inicials (per l'efecte del carretó de compra amb xifres màximes) als 29,95 milions d'euros (quedant molt a prop dels 30 milions projectats inicialment). El 58% dels projectes, 42 dels 73, s'han desviat com a màxim un $\pm 20\%$ del pressupost inicial.
- A finals de 2025 es preveu que estaran executats el 100% dels projectes.

Taula resum de l'execució dels projectes per tipologies

Categoria	Projectes presentats a votació final		Projectes seleccionats per a l'execució		Balanç econòmic			Percentatge d'execució
	Nombre de projectes	% respecte del total	Nombre de projectes	% respecte del total	Pressupost inicial	Pressupost final	% de diferència	
Equipaments educatius i entorns escolars	42	22,8%	14	18,4%	3.753.000€	4.034.111€	7,5%	100,0%
Pacificació o remodelació de carrers	38	20,7%	12	15,8%	4.072.500€	3.733.042€	-8,3%	60,5%
Espais verds i horts urbans	21	11,4%	11	14,5%	6.410.500€	5.829.927€	-9,1%	70,0%
Millora de l'espai públic	15	8,2%	5	6,6%	2.360.000€	2.215.137€	-6,1%	82,0%
Espais de joc infantil	13	7,1%	7	9,2%	2.050.000€	3.095.610€	51,0%	70,7%
Mobilitat i xarxa ciclista	11	6,0%	6	7,9%	4.265.000€	4.149.461€	-2,7%	78,3%
Equipaments de proximitat	9	4,9%	4	5,3%	1.200.000€	1.156.733€	-3,6%	70,0%
Equipaments i espais esportius	8	4,3%	3	3,9%	1.670.000€	1.668.008€	-0,1%	100,0%
Ascensors i escales mecàniques	7	3,8%	0	0,0%	-	-		
Mobiliari urbà	6	3,3%	5	6,6%	752.000€	906.157€	20,5%	98,0%
Tecnologia	5	2,7%	5	6,6%	820.000€	1.529.830€	86,6%	98,0%
Memòria històrica	4	2,2%	1	1,3%	65.000€	74.462€	14,6%	100,0%
Altres equipaments	3	1,6%	1	1,3%	1.175.000€	1.099.547€	-6,4%	100,0%
Equipaments per a col·lectius específics	1	0,5%	1	1,3%	52.000€	49.657€	-4,5%	100,0%
Equipaments culturals	1	0,5%	1	1,3%	500.000€	407.636€	-18,5%	100,0%
TOTAL	184	100%	76	100%	29.145.000€	29.949.317€	2,8%	82,2%

Taula resum de l'execució dels projectes per districtes

Categoria	Projectes seleccionats en la votació final		Balanç econòmic			Percentatge d'execució
	Nombre de projectes	% respecte del total	Pressupost inicial	Pressupost final	% de diferència	
Ciutat Vella	9	11,8%	3.080.000€	3.902.908€	26,7%	95,6%
Eixample	8	10,5%	2.995.000€	1.768.503€	-41,0%	74,4%
Sants-Montjuïc	5	6,6%	3.570.000€	4.139.588€	16,0%	97,0%
Les Corts	8	10,5%	1.969.500€	2.161.925€	9,8%	76,3%
Sarrià-Sant Gervasi	6	7,9%	2.092.500€	1.971.986€	-5,8%	90,0%
Gràcia	8	10,5%	2.225.000€	2.011.269€	-9,6%	85,0%
Horta-Guinardó	7	9,2%	3.187.000€	3.229.677€	1,3%	87,1%
Nou Barris	9	11,8%	3.573.000€	3.823.844€	7,0%	63,3%
Sant Andreu	9	11,8%	2.973.000€	3.941.205€	32,6%	87,2%
Sant Martí	7	9,2%	3.480.000€	2.998.411€	-13,8%	75,7%
TOTAL	76	100,00%	29.145.000€	29.949.317€	2,8%	82,2%

El procés d'execució dels 76 projectes de pressupostos participatius ha comportat una sèrie de reptes, limitacions i també aprenentatges. Malgrat que pot semblar que el procés participatiu com a tal acabava un cop eren escollits els projectes finals, ha quedat clar que el procés d'execució és una extensió mateixa d'aquest i és una fase fonamental. El protagonisme ciutadà en aquesta fase, a través del diàleg, el seguiment i el rendiment de comptes, és imprescindible per garantir la coherència i la integralitat de la dimensió participativa del projecte. Aquesta forma de fer, caminant en paral·lel a la planificació, el disseny i la concreció tècnica de les obres també significa un aprenentatge pels participants i pels equips de participació sobre la complexitat que envolta qualsevol transformació física en una ciutat densa i amb un ús intens i divers dels espais públics i els equipaments.

Al llarg del procés d'execució han sorgit imprevistos o condicionants que han comportat canvis a diversos nivells. El més significatiu han sigut les modificacions significatives o una execució parcial. També cal destacar com a modificacions la no execució d'una petita part dels projectes per diferents casuístiques que

es detallen més endavant. En altres casos, les qüestions sobrevingudes també han obligat a modificar els terminis previstos per tenir enllestides les obres, allargant-los a vegades, fins i tot en alguns més enllà de la fi del mandat. I també s'han hagut de fer ajustos en la despesa pressupostada pels projectes en força casos a la vegada que s'han complementat pressupostos en altres per completar l'actuació.

A continuació es recullen de forma sintètica les principals eventualitats i reptes als que ha calgut fer front:

Obstacles normatius o competencials.

Com en el cas d'Urbanitzem el carrer Romaninar, on la llei impedia a l'Ajuntament sufragar la urbanització completa del carrer o el de Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola, on la gestió pròpia del Parc Natural impedia a l'Ajuntament fer algunes de les actuacions previstes.

Àmbits d'actuació amb afectació a actors privats.

En alguns projectes calia l'acord amb els propietaris de zones afectades o amb responsabilitats sobre la urbanització dels espais, com el cas del F.C. Barcelona

Desafiaments i aprenentatges en l'execució de projectes de pressupostos participatius a barcelona

La implementació dels 76 projectes seleccionats mitjançant pressupostos participatius ha revelat una sèrie de reptes i lliçons, subratllant la importància de la participació ciutadana en totes les fases del procés.

en el carril bici per Travessera de les Corts o el de la millora de les voreres de l'avinguda de Rio de Janeiro entre el carrer de Vèlia i el passeig de la Ciutat de Mallorca, on va caldre negociar i acordar la concreció amb tres comunitats propietàries d'una part del terreny afectat.

Dificultats administratives en la licitació de les obres.

Els imprevistos i els problemes en la contractació pública no són un fet excepcional i tampoc ho han estat en alguns projectes de pressupostos, alentint-los o fins i tot impossibilitant la seva execució en el mandat previst. Ha passat en projectes com el parc esportiu inclúsiu a Can Dragó o el de Fem possible el nou model d'hort urbà al Clot, tot i que finalment no s'ha executat per altres motius.

Decisió política de repensar determinats projectes.

En determinats casos, dificultats d'altres tipus sumades al fet que els projectes han cavalcats entre 2 mandats i amb un nou pla d'actuació municipal han generat canvis en els projectes que ha portat a posposar-los a actuacions complementàries o a desestimar-los.

Coincidència amb altres projectes o planificacions municipals.

Aquesta és una de les qüestions que s'ha repetit en més projectes de pressupostos participatius. En alguns casos el fet de ser inversions previstes d'alguna manera en plans i previsions municipals, ha tingut un efecte virtuos, ha facilitat la feina i simplement ha avançat la inversió. Però en altres casos la proposta ciutadana ha col·lisionat amb intencions contraposades o poc compatibles total o parcialment, com en el cas de l'adaptació de la plaça dels Àngels per als infants o la pacificació d'una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar. Aquest és sens dubte un repte de futur per assegurar la implementabilitat dels projectes sense limitar en excés la participació.

Col·lisió amb els usos previstos en el planejament urbanístic.

Hi ha espais que tenen usos veïnals o comunitaris que no coincideixen amb el planejament urbanístic, en general de forma provisional. Sigui per consolidar aquesta situació o aspirant a fer realitat uns nous usos per aquests espais en desús, hi ha hagut projectes de pressupostos que no coincidien amb la planificació

Sinergies entre pressupostos participatius i planificació municipal

La integració de projectes ciutadans amb plans municipals impulsa inversions i millora la participació, però en casos puntuals la proposta ciutadana impacta amb posicions contraposades o poc compatibles total o parcialment.

urbanística. Les conseqüències han estat diverses, des del cas de l'hort provisional urbà del Clot, on es va permetre el projecte inicialment, però finalment s'ha decidit prioritzar l'espai per a l'ús necessari i urgent per a habitatges protegits, al de la pista de bàsquet a Les Corts on un solar amb el mateix destí projectat, s'ha convertit en la seva ubicació temporal per decisió del propi Districte.

Terrenys contaminats i restes arqueològiques.

També hi ha hagut altra mena d'imprevistos físics que es poden trobar en transformacions ordinàries d'equipaments i espais, i que han fet modificar projectes o com a mínim endarrerir els terminis d'execució i incrementar el pressupost. Per exemple, en el cas del projecte de millora dels entorns de la muntanya de Montjuïc des del Poble-sec va ser necessari descontaminar primer els terrenys afectats. En casos en què s'ha actuat sobre edificis patrimonials, com els de la rehabilitació de la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris o el de Salvem la masia de Can Valent, la troballa de restes arqueològiques ha obligat a aturar les obres, documentar les troballes, allargant els períodes d'execució.

Emergència per sequera i projectes de verd.

En el moment que es va desenvolupar el procés participatiu hi va haver excepcionalitats tan importants com la pandèmia de la Covid-19. Altres situacions sobrevingudes han estat el període de sequera i el seu agreujament en els anys posteriors. Les mesures i restriccions que s'han anat imposant, han condicionat molt els projectes que tenien com a protagonista la vegetació i l'increment del verd urbà. Són casos com els de Fem créixer el verd a Les Corts, en que ha calgut modificar el calendari i Fem una Gràcia més verda, que directament no s'ha pogut executar.

Absència de promotors.

La multiplicitat d'espais de recollida de propostes de projectes, va fer que en una determinada proporció aquestes propostes s'incloguessin sense que cap entitat o persona se'n responsabilitzés. Tot i que per la lògica de la recerca de suports i vots, en la llista de projectes finals van ser pocs, les propostes sense promotors han generat dificultats i no han mantingut la lògica de fer una concreció i una execució amb protagonisme ciutadà, com en la renovació de l'enllumenat del carrer de Sorolla i la instal·lació de bancs adaptats per a la gent gran a Via Júlia.



Manca de concreció dels projectes.

En alguns casos, tot i els requeriments de la presentació de projectes i el treball tècnic conjunt per aterrar les propostes, aquestes van arribar com a projectes finals massa genèrics, fet que ha comportat problemes de previsió i dimensionament de les actuacions de transformació i sobrecàrrega de processos tècnics. És el cas, per exemple, del projecte per fer el Casal Font d'en Fargues més ecològic i sostenible.

Dubtes sobre la viabilitat observats amb retard.

En una línia semblant altres projectes sí que eren concrets, però la seva valoració tècnica inicial no va poder tenir en compte tots els elements implicats o simplement aquests van aparèixer més tard. Això va fer que la seva viabilitat compromesa no s'observés fins a l'execució dificultant-la i obligant a fer modificacions substancials, com en el cas del carril bici del passeig de Fabra i Puig.

De les dificultats i obstacles tant els promotors com l'administració han après i ha fet decidir els projectes adaptant-los a la realitat dia a dia. Per altra banda no tot han estat dificultats o obstacles. La fase d'execució

també ha permès fer canvis que d'una manera o altra ampliaven els horitzons dels projectes i del propi procés participatiu, per exemple:

Ampliacions de l'àmbit d'actuació.

Casuístiques diverses, han fet que alguns projectes se sumessin a altres actuacions previstes o simplement, incrementessin l'espai de transformació, com la renovació del poliesportiu Coves d'en Cimony o la recuperació per als vianants Europa-Anglesola-Numància.

Augments de pressupost.

En un sentit semblant i en alguns casos coincident, hi ha hagut projectes que han pogut disposar d'augment del pressupost inicial reservat. Bàsicament això ha estat possible per la no execució d'altres projectes que han deixat romanents disponibles i per la suma de partides pressupostàries aportades per altres agents, sobretot els districtes i algunes àrees. Alguns exemples són el projecte Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt o el parc inclusiu als Jardins Massana.

Adaptacions pressupostàries i planificació: resposta a imprevistos en projectes participatius

L'execució de projectes ha requerit ajustos en els pressupostos i terminis a causa d'imprevistos com a terrenys contaminats i troballes arqueològiques, la qual cosa ha implicat una constant adaptació a la realitat del terreny.

Participació ciutadana ampliada.


Diverses situacions han portat a dur a terme accions de participació per concretar els projectes guanyadors en el moment de planificar l'execució. En alguns casos, l'absència de promotors hi ha tingut a veure, en altres, com Acabem amb els espais foscos a Gràcia, la mateixa proposta incloïa la necessitat de fer unes marxes exploratòries obertes per detectar els canvis a implementar.

Un tercer cas són els projectes per renovar espais de joc infantils on en alguns casos es van fer sessions amb infants perquè decidissin com volien que fossin aquests espais, com els del passeig Sant Joan. Per últim l'existència d'altres actors i usuaris dels espais a transformar amb interès ho va fer convenient en casos com el de la millora del parc de l'Espanya Industrial.

**Diàleg i participació ciutadana: claus per a l'execució coherent de projectes urbans**

La participació activa de la ciutadania en la fase d'execució és essencial per a garantir la coherència i l'èxit dels projectes, permetent un seguiment i ajust continu.

Valoracions dels promotors dels projectes guanyadors

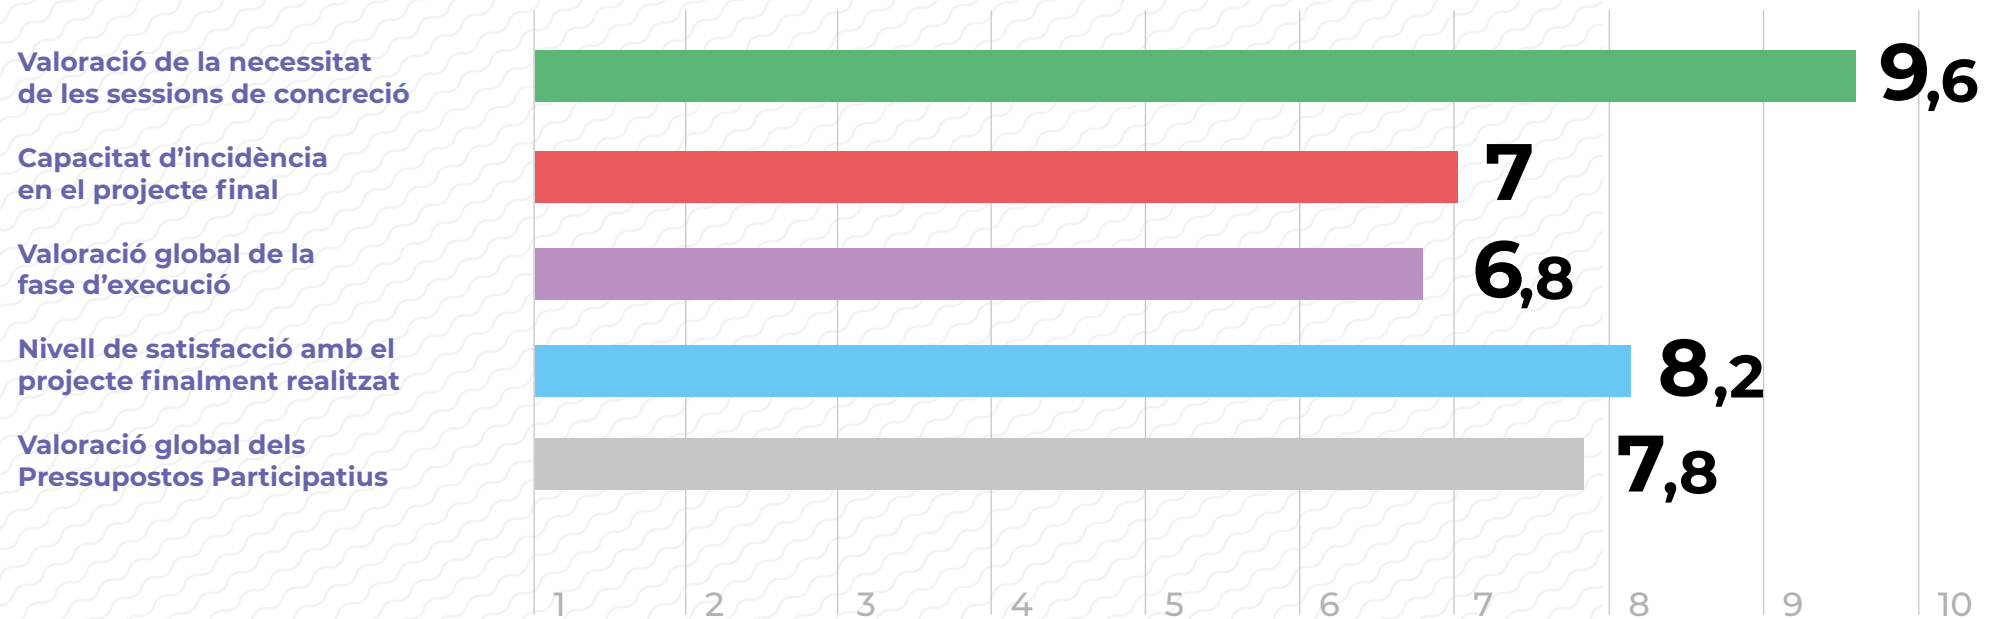

Font: Enquesta interna de valoració a promotors dels Pressupostos Participatius amb 83 respostes.

Projectes executats parcialment o no executats:

Ciutat Vella	Adaptem la plaça dels Àngels per als infants	Executat amb modificacions	A la mateixa plaça es va aprovar un projecte de remodelació d'edificis que feia incompatible iniciar l'actuació per la plaça. La plaça es remodelarà però al final de la construcció de l'edifici. D'acord amb els promotors, els diners es van destinar a un altre projecte amb el mateix objectiu en altres places del barri i per tant es pot dir que es va executar amb modificacions.
Eixample	Impulsem 5 "ecoxanfrans" al carrer Aragó	Execució parcial en projecte	El Govern del districte va decidir no implementar tots el xanfrans donat que l'actuació de pacificació de carrers s'havia fet en zones properes. Dels 5 previstos hi ha el compromís d'executar el de la cantonada de la seu del Districte en un futur. Per tant, es pot dir que està projectada l'execució parcial d'un 20% del mateix.
	Obrir carrils bici a Pça. Catalunya	Execució posposada de futur	Es decideix posposar el projecte a l'espera que finalitzin les obres de la Rambla. La voluntat és valorar posteriorment la necessària i imprescindible connexió amb els carrils bici de l'Eixample i Ciutat Vella per aquesta plaça.
	Pacifiquem el carrer Rosselló	No executat	El Govern del districte decideix no implementar aquest projecte, de moment.
Les Corts	Millorem el parc de la Colònia Castells	Executat parcialment	El projecte no es pot executar en el mandat 2020-2023 a l'espera del canvi de planejament, i al final de les obres d'urbanització del parc. En el mandat passat es decideix fer petites intervencions, avant-projecte i comunicació. Per tant podem dir que s'ha executat parcialment.
Sarrià - St. Gervasi	Urbanitzem el carrer Romaninar	No executable	Projecte no executable en ser una primera urbanització del carrer (segons la llei d'Urbanisme els propietaris han d'assumir-ne les despeses complementàries). El pressupost inicial hagués permès aportar a la urbanització la part de l'Ajuntament. Donat que els veïns no volen aportar la resta al projecte, no es va poder tirar endavant.
Gràcia	Fem una Gràcia més verda	Executat parcialment	Projecte no executable en situació d'emergència per sequera. S'ha fet el projecte executiu però no s'han pogut iniciar obres per mandat de l'ACA. Per tant podem dir que s'ha executat parcialment.
Horta - Guinardó	Millorem el llac del jardí del Baix Guinardó	No executat	Al mateix espai s'hi instal·larà una carpa per acollir provisionalment el Mercat de l'Estrella mentre es remodela. Això impedeix executar el projecte.
Nou Barris	Creem un parc esportiu incliusiu a Can Dragó	Execució posposada de futur	Per ampliació del projecte durant la concreció i dificultats sobrevingudes de contractació (desistiments, etc.) no ha estat possible l'execució durant el mandat. El Districte s'ha compromès amb els promotors a executar-lo en un futur.
Sant Martí	Fem possible el nou Hort Urbà al Clot	No executat	L'espai on s'havia d'instal·lar provisionalment l'hort estava reservat per habitatge. Com que en l'actual mandat es decideix reactivar i prioritzar l'ús inicial per la necessitat d'habitatge social, l'hort no es podrà ubicar en aquest espai.

Els pressupostos participatius: balanç qualitatiu.



Vivim temps de desafecció, crispació i malestars. La llunyania creixent, quan no directament la desconfiança, que sent la ciutadania respecte les institucions suposa un desafiament a afrontar, però també una oportunitat per refer el vincle cívic i treballar per l'aprofundiment democràtic. La participació ciutadana és, sens dubte, un instrument molt valuós en aquest sentit per acostar la presa de decisions i construir comunitat. I en aquest sentit els instruments de democràcia directa com **els pressupostos participatius, suposen un salt endavant per consolidar una nova cultura democràtica de la participació.**

L'objectiu principal dels pressupostos participatius és generar espais i canals que permetin a la ciutadania establir i deliberar sobre les necessitats, els reptes i les prioritats de la ciutat i projectes concrets que es volen executar durant el mandat. **Donar veu i protagonisme a la ciutadania en la gestió d'allò públic.**

Però els pressupostos participatius no només amplien la capacitat de decidir dels veïns de la ciutat, **també són una escola de ciutadania, que obliga a coresponsabilitzar-se de les propostes, a implicar-se**

en la gestió dels recursos econòmics, que convida a conèixer les complexitats i gestionar els entrebancs i els límits. Uns recursos que són finits i que cal prioritzar. I, a la vegada, assajar sobre noves maneres de construir projectes públics de forma col·lectiva entre la ciutadania i l'Administració, i promoure la coproducció eficaç d'inversions per als barris i districtes.

L'Ajuntament és una estructura complexa, organitzada en àrees, que tenen recursos i planifiquen, i districtes, que gestionen des de la proximitat i la realitat del veïnat. Els pressupostos participatius han permès estandarditzar els processos metodològics de la participació, sense ser només un encàrrec. Malgrat la novetat, els tensionaments i les dificultats per la manca d'experiència prèvia i de dimensionament del projecte, **els aprenentatges i els resultats compensen sobradament l'esforç organitzatiu, i marca una manera profitosa de treballar coordinadament districtes i àrees.**

Així mateix hem vist un complement en la cultura organitzativa. Han permès posar a treballar conjuntament equips d'àrees diferents.

Cap a una nova cultura de participació democràtica a Barcelona

Els pressupostos participatius representen una nova manera de fer ciutat, superant la separació entre representants i representats.

La seva consolidació a través del consens institucional i veïnal és fonamental per a la seva integració en la normalitat del funcionament institucional de la ciutat

Els òrgans executors han incorporat amb més intensitat la lògica que el client no és només l'àrea que fa l'encàrrec, sinó també la veïna que el proposa, i cal seure amb ella, escoltar-la i adaptar-s'hi. Incorporar tots aquests elements és la riquesa del procés, en què al final no treballem amb la mirada d'un, sinó la de molts.

Per tot això, els pressupostos participatius són també una oportunitat a ampliar la mirada sobre la participació. La participació no és un treball extra, no és afegir complexitat. La participació és la manera de construir millors projectes, millors transformacions.

Els pressupostos participatius són en definitiva una nova manera de fer ciutat, superant les lògiques de la separació estricta entre representants i representats, entre ciutadania i institució.

Per seguir caminant en aquesta direcció, per seguir transitant aquest camí **és necessària la consolidació d'aquest projecte, a través del consens institucional, associatiu i veïnal.**

Això permetrà que una edició rere una altra, els pressupostos participatius passin a formar part de la normalitat del funcionament institucional de la ciutat i contribueixin a edificar una nova cultura de la participació democràtica.

Aprenentatges per a una nova edició



Qualsevol projecte participatiu de l'envergadura dels pressupostos participatius a Barcelona implica una reflexió contínua sobre les possibles millores a introduir entre una edició i una altra. Però la novetat del projecte de pressupostos participatius a Barcelona 2020-23, fa que aquesta primera edició, en molts aspectes fos un autèntic assaig general. Malgrat l'èxit en molts sentits, és molt oportú identificar **els reptes que ha plantejat aquesta experiència i veure com es poden afrontar de cara a una nova edició**. Després de recollir les reflexions i experiències de molts agents que hi han participat, podem resumir-los i classificar-los de la següent manera:

La naturalesa del procés

Els pressupostos participatius requereixen d'un cert grau d'acord i consens polític i social per tirar-los endavant i consolidar-los, garantint-ne la continuïtat i estabilitat **i generant cada vegada un major coneixement, confiança i vincle per part de la ciutadania** i contribuint en definitiva a un reforç de la cultura participativa. Alhora i donada la seva envergadura i idiosincràsia es considera més oportú separar-lo del procés de confecció del PAM i els PAD, per facilitar la

comprensió de les regles de joc i diferenciar millor la iniciativa institucional d'un procés i l'impuls ciutadà de l'altre. També cal considerar la magnitud, l'esforç intern que suposa i posar en valor la transversalitat i l'enfocament en una cultura organitzativa compartida que introdueix aquesta nova manera de decidir i executar. En aquest sentit, cal repensar la distribució de funcions i els suports necessaris per evitar sobrecàrregues i colls d'ampolla i facilitar la valoració i tramitació de les propostes.

El calendari

Hem après que com més compacte sigui el procés millor i si s'aconsegueix situar tot el programa dins el mandat genera un impacte sobre la ciutadania perquè veu executat el seu projecte en un temps més curt i per a l'administració donat que queda lligat amb el programa municipal impulsat. L'aprenentatge principal de la primera edició és que la fase pròpiament participativa és una part del procés, però **la fase d'execució del conjunt de projectes requereix de molts mesos**. Si el tret de sortida s'endarrereix a l'inici de mandat o un fet com la pandèmia obliga a ampliar el calendari, és molt complicat poder executar el conjunt de propostes

Reflexió contínua per millorar els pressupostos participatius a Barcelona

La primera edició dels pressupostos participatius a Barcelona 2020-23 ha estat un assaig general que ha revelat molts reptes, destacant la necessitat de millores i aprenentatges continus per a futures edicions.

Separació i estandardització del procés: clau per a la comprensió i execució eficaç

Separar els pressupostos participatius del PAM i els PAD facilita la comprensió de les regles del joc, assegurant un enfocament organitzatiu compartit i evitant sobrecàrregues administratives.

abans d'acabar-lo. El debat no és tant si cal assumir que el procés requereix més de quatre anys, sinó com es poden escurçar processos sense afectar a la qualitat del procés o d'altra banda, com es pot esbremar al màxim la durada dels 4 anys dels mandats aprofitant del tot els 48 mesos.

El pressupost

L'èxit del projecte ha fet mantenir la xifra destinada al projecte. Cal consolidar la metodologia i assegurar que els projectes són factibles en 4 anys i per tant posposar **el creixement del pressupost destinat als pressupostos participatius**. Més enllà d'això, és important incorporar des de l'inici una quantitat destinada a sufragar imprevistos de les obres o l'increment dels preus de les primeres matèries durant el procés.

Els projectes finançables

De nou aquí els aprenentatges poden semblar ambivalents. Des d'un **punt de vista pràctic i de facilitar l'execució tècnica, la limitació a propostes de projectes d'inversió**, que fossin competència exclusiva municipal i amb un pressupost limitat per dalt i per baix, és un disseny necessari. Des del punt de

vista de la participació ciutadana, però, **una limitació excessiva pot generar incomprensió i frustració**, donat l'enorme ventall de destinacions de la despesa municipal. Emergeix també un debat complex sobre la **complementarietat o interferència de les propostes de transformacions amb les planificacions estratègiques municipals**, quan afecten el mateix tema o fins i tot quan ja estan directament previstes i només s'aspira a prioritzar-les abans en el temps.

El perfil dels participants i dels beneficiaris

La participació ciutadana sempre té biaixos i és que no tota la ciutadania té interès, se sent interpel·lada o participa de la mateixa manera. Els pressupostos participatius no n'han estat una excepció. Però **cal identificar els perfils absents i treballar per millorar-ne la diversitat**. Malgrat el desplegament territorial i les facilitats per recollir propostes, la seqüència de fases del procés amb lògica competitiva de recerca de suports i amb un paper important de la tecnologia, va anar produint una selecció de projectes i participants menys heterogènia. Va passar de ben segur, en termes d'origen i de nivell socioeconòmic, però especialment en termes d'edat, si observem les tipologies d'equipaments i

Compactació del calendari: execució eficient dins el mandat municipal

Un procés més compacte i alineat amb el mandat municipal permet a la ciutadania veure els seus projectes executats més ràpidament, optimitzant l'ús dels 48 mesos del mandat.

espais que van rebre més finançament. **El reforç de les accions específiques per mobilitzar els col·lectius menys actius** en la primera edició serà clau per millorar-ne la inclusivitat.

La metodologia del procés

Pel seu caràcter innovador, per la seva amplitud i mobilització de recursos i pel volum de participació ciutadana assolida, els pressupostos participatius han estat **un procés molt rellevant, especialment en l'àmbit de la democràcia directa**: la possibilitat de decidir directament sobre qüestions concretes. Pel seu disseny i pels efectes de la pandèmia en aquest, el procés va tenir menys component deliberatiu, un repte per a properes edicions, on **els debats i la recerca de consensos i estratègies comunitàries i de participació diversa i inclusiva poden complementar positivament la tria directa i individual de projectes**.

La importància de l'execució

Probablement, un dels aprenentatges més rellevants és la necessitat de **considerar el procés d'execució dels projectes guanyadors com una fase cabdal del procés participatiu**. La complexitat administrativa i física de la

ciutat, fa que sigui durant la definició de l'execució que s'acabin havent de prendre moltes decisions, on cal una interlocució i treball proper amb les persones o entitats promotores i els òrgans executors. És també aquí on es forja i s'aprèn una nova forma de fer que combina la cocreació i la corresponsabilitat.

La comunicació

El **desplegament comunicatiu inicial a través d'una campanya de difusió potent**, va ser un encert per un projecte que calia donar a conèixer des de zero i de forma ràpida. Caldria pensar, però en com es pot **mantenir un major nivell d'informació i comunicació** per veure com avança el procés un cop els projectes són triats. També cal veure com es pot potenciar i amplificar la comunicació feta per part dels mateixos promotors o generar campanyes més singulars i personalitzades.

Diversitat i inclusivitat: reptes en la participació ciutadana

La primera edició va mostrar biaixos en la participació, destacant la necessitat d'incloure perfils absents i millorar la diversitat de participants, especialment en termes d'edat i nivell socioeconòmic.

Comunicació i seguiment: elements crucials per a l'èxit continuat

Mantenir un alt nivell d'informació i comunicació durant tot el procés, així com potenciar la difusió per part dels promotors, és essencial per assegurar la transparència i el compromís ciutadà amb els pressupostos participatius.

Annex 1: Resum econòmic



- A 16 de maig de 2024 la **despesa executada en els projectes de Pressupostos Participatius 2020-23 és de 29.949.317€**. Això suposa un 2,8% més dels 29.145.000€ que sumaven els pressupostos inicialment previstos dels 76 projectes que van ser seleccionats amb el topall màxim dels 30 milions d'euros.
- Pel què fa al **propí procés participatiu s'hi van destinar un total de 750.275,03€**, dels quals 350.805,31€ corresponen a la coordinació i dinamització del procés, 318.937,06€ a despeses de comunicació i 80.533,66€ a serveis vinculats a la logística, l'accessibilitat i l'organització d'actes.

29.949.317€

+2,8% Dels 29.145.000€ inicialment previstos

750.275,03€

350.805,31€

Coordinació i dinamització del procés.

318.937,06€

Despeses de comunicació.

80.533,66€

Serveis vinculats a logística, accesibilitats i organització d'actes.

Taula d'imports inicials i finals per projectes

Districte	Títol del projecte	Categoria	Import inicial	Import final	Desviació	% Desv.
Ciutat Vella	Convertim l'associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible	Tecnologia	50.000 €	42.011 €	- 7.989 €	-16,0%
Ciutat Vella	Posem en valor la muralla romana	Memòria històrica	65.000 €	74.462 €	9.462 €	14,6%
Ciutat Vella	Enjardinem el Raval	Espais verds i horts urbans	180.000 €	200.000 €	20.000 €	11,1%
Ciutat Vella	Creem més àrees de joc infantil al Raval	Espais de joc infantil	600.000 €	1.310.000 €	710.000 €	118,3%
Ciutat Vella	Instal·lem una boia que mesuri l'acidificació del Mediterrani	Tecnologia	200.000 €	200.000 €	- €	0,0%
Ciutat Vella	Pacifiquem l'entorn de l'Escola Collaso i Gil	Equipaments educatius i entorns escolars	130.000 €	63.435 €	- 66.565 €	-51,2%
Ciutat Vella	Reduïm les barreres arquitectòniques del Raval	Millora de l'espai públic	785.000 €	808.000 €	23.000 €	2,9%
Ciutat Vella	Creem un carril bici a Joan de Borbó	Mobilitat i xarxa ciclista	920.000 €	1.205.000 €	285.000 €	31,0%
Ciutat Vella	Adaptem la plaça dels Àngels per als infants	Pacificació o remodelació de carrers	150.000 €	- €	- 150.000 €	-100,0%
Eixample	Impulsem cinc ecoxamfrans al carrer d'Aragó	Pacificació o remodelació de carrers	300.000 €	62.555 €	- 237.445 €	-79,1%
Eixample	Fem els parcs més accessibles per a tots els infants (Jardins Montserrat Roig)	Espais de joc infantil	200.000 €	256.382 €	56.382 €	28,2%
Eixample	Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample (Reorganització carrils Eixample)	Pacificació o remodelació de carrers	380.000 €	144.852 €	- 235.148 €	-61,9%
Eixample	Obrim carrils bici a plaça de Catalunya	Mobilitat i xarxa ciclista	600.000 €	37.762 €	- 562.238 €	-93,7%
Eixample	Pacifiquem el carrer Rosselló	Pacificació o remodelació de carrers	875.000 €	626.794 €	- 248.206 €	-28,4%
Eixample	Pacifiquem els entorns escolars del carrer d'En-tença	Equipaments educatius i entorns escolars	270.000 €	188.103 €	- 81.897 €	-30,3%

Districte	Títol del projecte	Categoria	Import inicial	Import final	Desviació	% Desv.
Eixample	Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi	Espais de joc infantil	250.000 €	321.144 €	71.144 €	28,5%
Eixample	Fem més verds i jugables els entorns de les escoles Els Llorers i L'Arbret	Equipaments educatius i entorns escolars	120.000 €	130.911 €	10.911 €	9,1%
Sants-Montjuïc	Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives	Tecnologia	70.000 €	78.573 €	8.573 €	12,2%
Sants-Montjuïc	Millorem el parc de l'Espanya Industrial	Espais verds i horts urbans	850.000 €	1.099.311 €	249.311 €	29,3%
Sants-Montjuïc	Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris	Equipaments i espais esportius	1.600.000 €	1.599.990 €	- 10 €	0,0%
Sants-Montjuïc	Pacifiquem Sants antic (Superilla Sants)	Pacificació o remodelació de carrers	200.000 €	228.902 €	28.902 €	14,5%
Sants-Montjuïc	Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic, i arreglem els camins (Camí escolar Montjuïc)	Equipaments educatius i entorns escolars	850.000 €	1.132.812 €	282.812 €	33,3%
Les Corts	Ampliem recursos per a entitats juvenils	Equipaments per col·lectius específics	52.000 €	49.657 €	- 2.343 €	-4,5%
Les Corts	Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts	Equipaments i espais esportius	70.000 €	68.018 €	- 1.982 €	-2,8%
Les Corts	Iniciem carril bici per Travessera de les Corts	Mobilitat i xarxa ciclista	345.000 €	374.523 €	29.523 €	8,6%
Les Corts	Pacifiquem l'entorn de Vallespir amb Travessera!	Equipaments educatius i entorns escolars	120.000 €	163.321 €	43.321 €	36,1%
Les Corts	Fem créixer el verd a les Corts	Espais verds i horts urbans	472.500 €	466.288 €	- 6.212 €	-1,3%
Les Corts	Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància (Reurbanització del carrer Europa)	Pacificació o remodelació de carrers	260.000 €	617.483 €	357.483 €	137,5%
Les Corts	Renovem la biblioteca Les Corts - Miquel Llangueras	Equipaments culturals	500.000 €	407.636 €	- 92.364 €	-18,5%
Les Corts	Millorar el parc de la Colònia Castells	Millora de l'espai públic	150.000 €	15.000 €	- 135.000 €	-90,0%

Taula d'imports inicials i finals per projectes

Districte	Títol del projecte	Categoria	Import inicial	Import final	Desviació	% Desv.
Sarrià-St. Gervasi	Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lourdes	Equipaments educatius i entorns escolars	50.000 €	- €	- 50.000 €	-100,0%
Sarrià-St. Gervasi	Creem un carril bici a la Via Augusta	Mobilitat i xarxa ciclista	1.100.000 €	972.011 €	- 127.989 €	-11,6%
Sarrià-St. Gervasi	Superilla al Farró - Pacifiquem el barri	Pacificació o remodelació de carrers	370.000 €	417.903 €	47.903 €	12,9%
Sarrià-St. Gervasi	Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes!	Millora de l'espai públic	340.000 €	210.563 €	- 129.437 €	-38,1%
Sarrià-St. Gervasi	Cultivem l'hort comunitari de Sarrià de Dalt	Espais verds i horts urbans	120.000 €	371.509 €	251.509 €	209,6%
Sarrià-St. Gervasi	Urbanitzem el carrer del Romaninar	Pacificació o remodelació de carrers	112.500 €	- €	- 112.500 €	-100,0%
Gràcia	Recuperem els camins de Valcarca a Collserola	Espais verds i horts urbans	50.000 €	45.871 €	- 4.129 €	-8,3%
Gràcia	Millorem els patis de l'Escola Pau Casals-Gràcia i obrim-los al barri	Equipaments educatius i entorns escolars	450.000 €	471.235 €	21.235 €	4,7%
Gràcia	Fem una Gràcia més verda	Espais verds i horts urbans	500.000 €	34.105 €	- 465.895 €	-93,2%
Gràcia	Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll	Mobiliari urbà	200.000 €	341.472 €	141.472 €	70,7%
Gràcia	Renovem l'àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn	Espais de joc infantil	225.000 €	324.092 €	99.092 €	44,0%
Gràcia	Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució	Espais de joc infantil	350.000 €	328.877 €	- 21.123 €	-6,0%
Gràcia	Instal·lem un lavabo públic a la plaça de les Dones del 36	Mobiliari urbà	150.000 €	165.617 €	15.617 €	10,4%
Gràcia	Acabem amb els espais foscos a Gràcia	Mobiliari urbà	300.000 €	300.000 €	- €	0,0%
Horta-Guinardó	Carril bici a la ronda del Guinardó	Mobilitat i xarxa ciclista	650.000 €	778.812 €	128.812 €	19,8%

Taula d'imports inicials i finals per projectes

Districte	Títol del projecte	Categoria	Import inicial	Import final	Desviació	% Desv.
Horta-Guinardó	Millorem el pati de l'Escola de les Aigües	Equipaments educatius i entorns escolars	185.000 €	202.353 €	17.353 €	9,4%
Horta-Guinardó	Renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre	Equipaments educatius i entorns escolars	300.000 €	441.924 €	141.924 €	47,3%
Horta-Guinardó	Fem el Casal Font d'en Fargues més ecològic i sostenible	Equipaments de proximitat	100.000 €	84.244 €	- 15.756 €	-15,8%
Horta-Guinardó	Renovem l'enllumenat del carrer de Sorolla	Mobiliari urbà	52.000 €	52.000 €	- €	0,0%
Horta-Guinardó	Rehabilem la part històrica i urbana del parc del Guinardó	Espais verds i horts urbans	1.600.000 €	1.630.000 €	30.000 €	1,9%
Horta-Guinardó	Millorem el llac dels jardins del Baix Guinardó	Espais de joc infantil	300.000 €	40.344 €	- 259.656 €	-86,6%
Nou Barris	Instal·lem bancs adaptats per a la gent gran	Mobiliari urbà	50.000 €	47.068 €	- 2.932 €	-5,9%
Nou Barris	Obrim aules informàtiques a la Trinitat Nova	Tecnologia	50.000 €	49.246 €	- 754 €	-1,5%
Nou Barris	Salvem Can Valent	Altres equipaments	1.175.000 €	1.099.547 €	- 75.453 €	-6,4%
Nou Barris	Reforestem Collserola	Espais verds i horts urbans	50.000 €	47.871 €	- 2.129 €	-4,3%
Nou Barris	Creem un parc esportiu inclusiu a Can Dragó	Espais verds i horts urbans	578.000 €	9.534 €	- 568.466 €	-98,4%
Nou Barris	Millorem les voreres de l'avinguda de Rio de Janeiro entre el carrer de Vèlia i el passeig de la Ciutat de Mallorca	Pacificació o remodelació de carrers	270.000 €	605.637 €	335.637 €	124,3%
Nou Barris	Fem un parc agrari urbà de Can Valent	Espais verds i horts urbans	700.000 €	1.163.588 €	463.588 €	66,2%
Nou Barris	Fem un carril bici al passeig de Fabra i Puig	Mobilitat i xarxa ciclista	650.000 €	781.353 €	131.353 €	20,2%
Nou Barris	Iniciem el procés per adequar la terrassa de La Cosa Nostra en un espai jove	Equipaments de proximitat	50.000 €	20.000 €	- 30.000 €	-60,0%

Taula d'imports inicials i finals per projectes

Districte	Títol del projecte	Categoria	Import inicial	Import final	Desviació	% Desv.
Sant Andreu	Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer	Equipaments educatius i entorns escolars	193.000 €	224.851 €	31.851 €	16,5%
Sant Andreu	Pacifiquem l'entorn de l'Escola Ramon Llull	Equipaments educatius i entorns escolars	85.000 €	85.000 €	- €	0,0%
Sant Andreu	Renovem el paviment del passeig de Fabra i Puig	Millora de l'espai públic	910.000 €	1.022.738 €	112.738 €	12,4%
Sant Andreu	Reformem la seu de l'entitat T'acompanyem	Equipaments de proximitat	50.000 €	50.000 €	- €	0,0%
Sant Andreu	Renovem la vorera de l'avinguda Meridiana davant del CAP Sant Andreu	Millora de l'espai públic	175.000 €	158.836 €	- 16.164 €	-9,2%
Sant Andreu	Millorem el Parc de La Pegaso	Espais verds i horts urbans	585.000 €	525.000 €	- 60.000 €	-10,3%
Sant Andreu	Instal·lem aplicacions per a la subtitulació simultània d'esdeveniments en 16 equipaments del districte de Sant Andreu	Tecnologia	50.000 €	50.000 €	- €	0,0%
Sant Andreu	Construïm el primer parc inclusiu als Jardins Massana	Espais de joc infantil	525.000 €	1.624.771 €	1.099.771 €	209,5%
Sant Andreu	Pacifiquem una zona del Casc antic de Sant Andreu de Palomar	Pacificació o remodelació de carrers	400.000 €	200.009 €	- 199.991 €	-50,0%
Sant Martí	Construïm una cuina a l'Escola La Pau	Equipaments educatius i entorns escolars	400.000 €	444.549 €	44.549 €	11,1%
Sant Martí	Convertim el pati de l'Escola la Farigola en un pulmó verd del barri	Equipaments educatius i entorns escolars	350.000 €	340.278 €	- 9.722 €	-2,8%
Sant Martí	Fem una superilla al Camp de l'Arpa del Clot	Pacificació o remodelació de carrers	390.000 €	405.760 €	15.760 €	4,0%
Sant Martí	Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris	Equipaments de proximitat	1.000.000 €	1.002.489 €	2.489 €	0,2%

Taula d'imports inicials i finals per projectes

Districte	Títol del projecte	Categoria	Import inicial	Import final	Desviació	% Desv.
Sant Martí	Pacifiquem els entorns de l'Escola Pere IV i de l'Institut Quatre Cantons	Equipaments educatius i entorns escolars	250.000 €	145.339 €	- 104.661 €	-41,9%
Sant Martí	Fem possible el nou model d'hort urbà al Clot	Espais verds i horts urbans	725.000 €	236.850 €	- 488.150 €	-67,3%
Sant Martí	Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou	Pacificació o remodelació de carrers	365.000 €	423.147 €	58.147 €	15,9%
TOTAL			29.145.000 €	29.949.317 €	804.317 €	2,8%

Taula d'imports inicials i finals per projectes


Objecte despesa	Import pressupostat	Import executat
Coordinació i dinamització del procés	470.596 €	350.805 €
Ciutat Vella	26.840 €	21.407 €
Eixample	33.411 €	29.451 €
Sants-Montjuïc	35.231 €	24.246 €
Les Corts	18.998 €	17.947 €
Sarrià-Sant Gervasi	25.566 €	22.238 €
Gràcia	26.487 €	20.948 €
Horta-Guinardó	39.799 €	28.373 €
Nou Barris	42.826 €	27.730 €
Sant Andreu	31.573 €	28.900 €
Sant Martí	34.765 €	26.415 €
Àrees municipal i actes de ciutat	55.561 €	35.963 €
Diversitat funcional	26.323 €	22.209 €
Infància	23.912 €	12.984 €
Joves	20.199 €	8.911 €
Suport a la participació i coordinació del procés participatiu	29.104 €	23.083 €
Logística, accessibilitat i actes	81.117 €	80.533 €
Dispositius mòbils activitats de participació a l'espai públic	18.150 €	18.150 €
Serveis d'accessibilitat i acollida d'infants	14.762 €	4.132 €
Suport a la votació	42.760 €	39.735 €

Annex 2

Fitxes dels projectes



Mapejat dels projectes

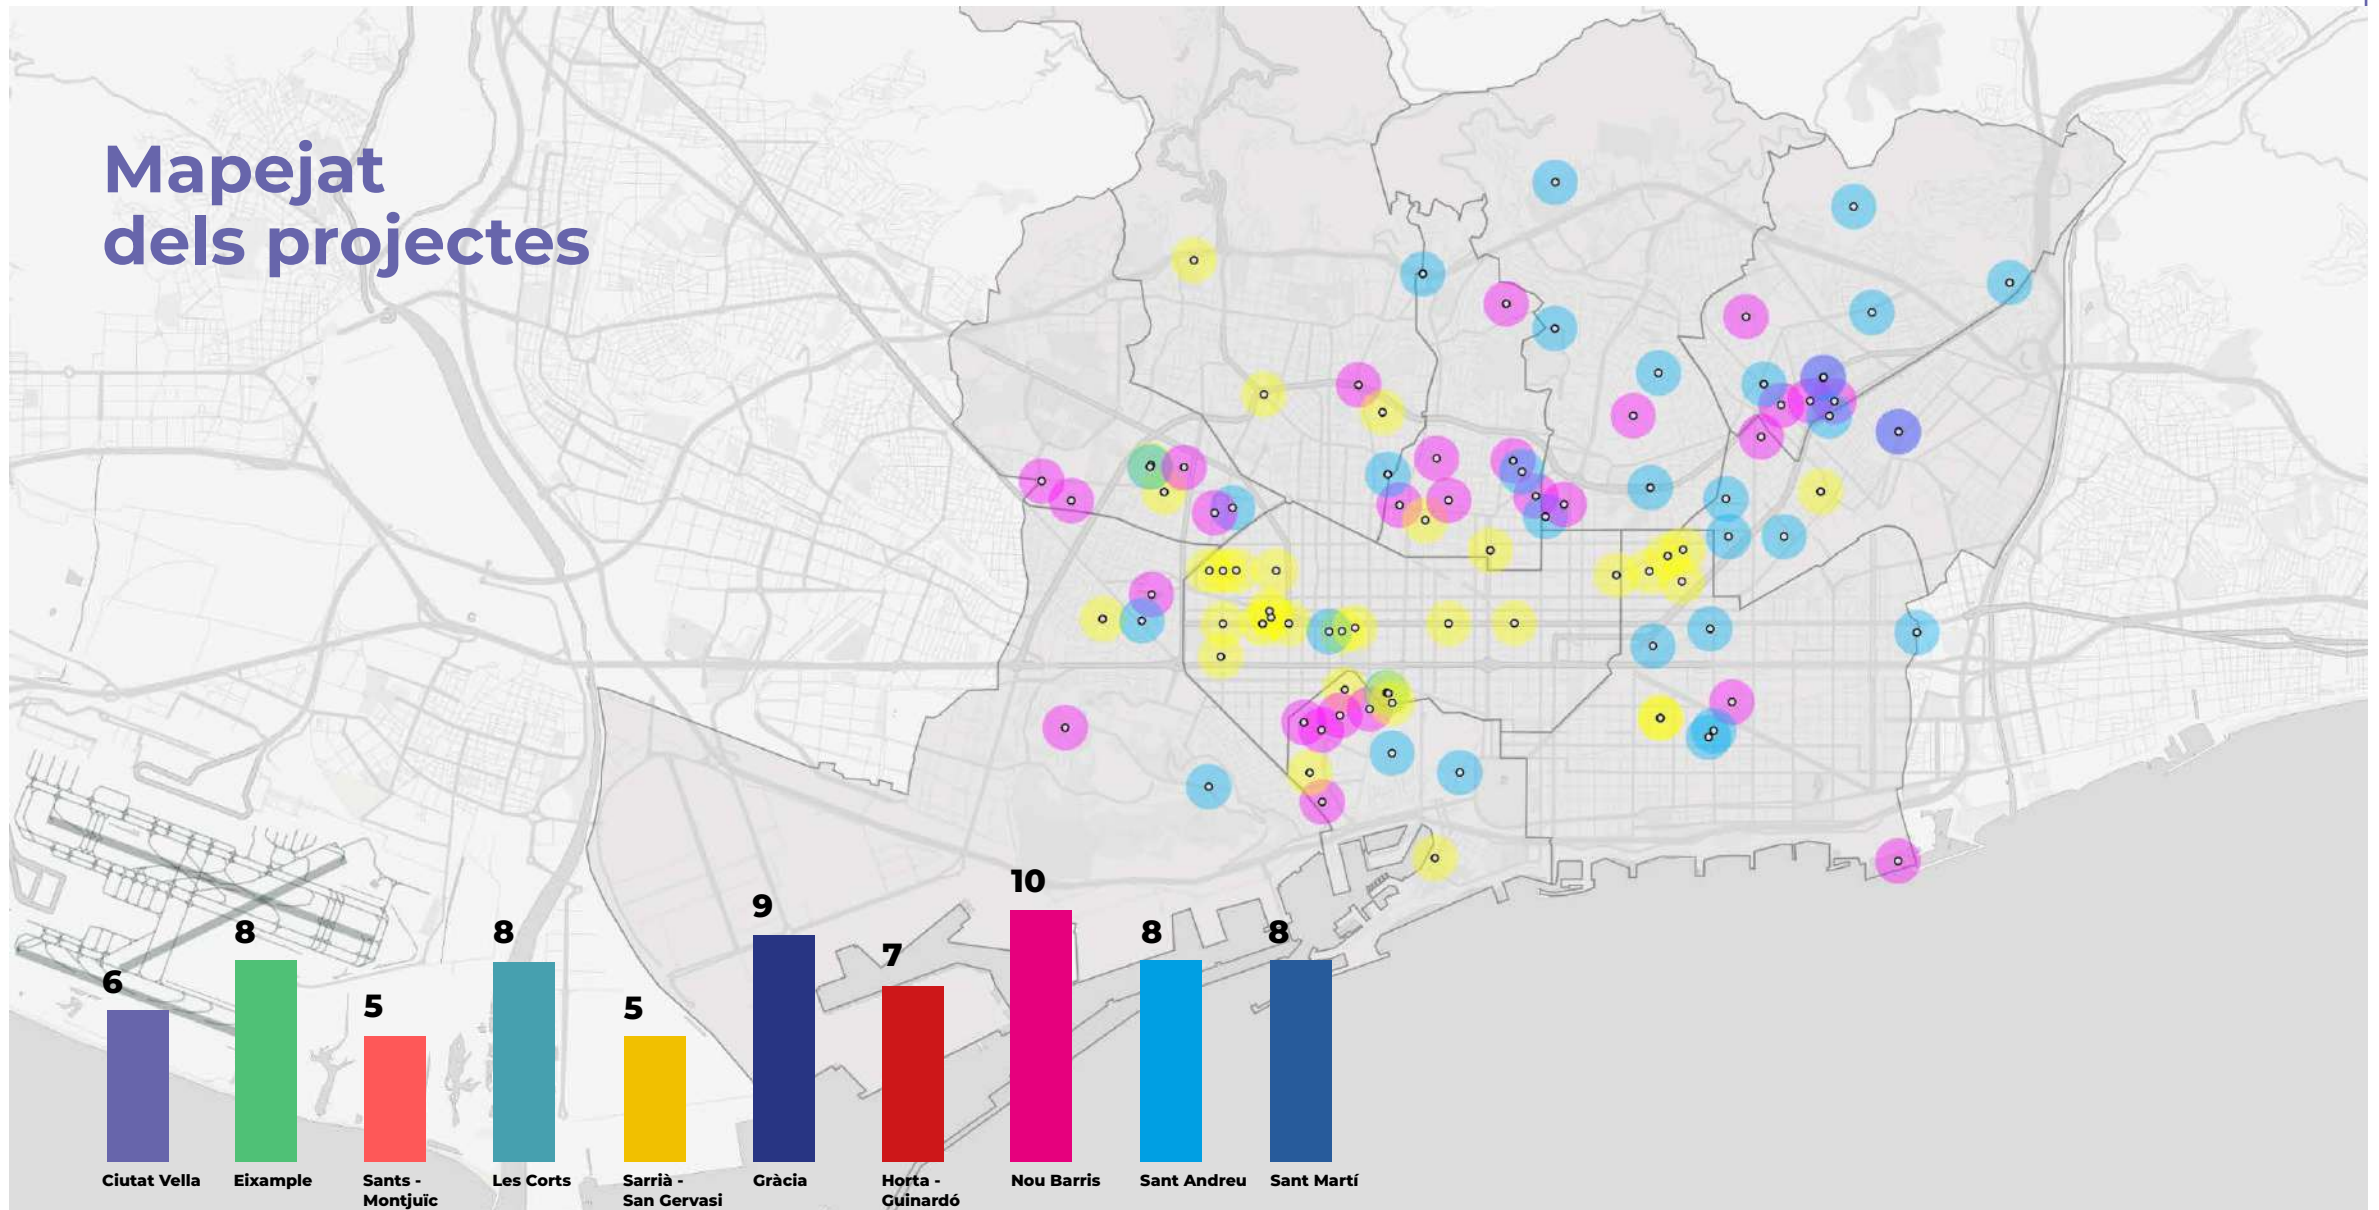

Projecte:**Adaptem la plaça dels Àngels
per als infants**Districte: **Ciutat Vella** Barri: **el Raval****Descripció**


El projecte contempla crear una zona de joc infantil a la plaça dels Àngels per tal de diversificar i els usos de l'espai cap a l'obtenció d'un model de plaça més veïnal i que sigui un punt de trobada per a tota la comunitat del barri del Raval.

Observacions sobre el procés d'execució

El 12/01/23 es va fer reunió amb els promotors del projecte i se'ls va comunicar que no s'executava a l'espera de les obres d'ampliació del MACBA. El pressupost es va passar al projecte "Creem més àrees de joc infantil al Raval."

Categoria**Pacificació o remodelació
de carrers****Promotors****Xarxa Veïnal del Raval -
Comissió d'urbanisme.****Executor****BIMSA****Estat actual****No realitzable****Pressupost inicial****150.000€****Pressupost final****-€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.450**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Fotografia no disponible

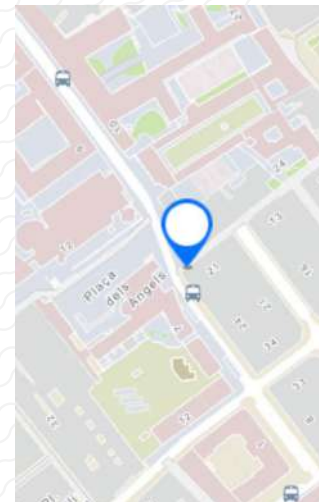

Projecte: Enjardinem el Raval

Districte: **Ciutat Vella** Barri: **el Raval**

Descripció

Es planteja actuar sobre les zones annexes al Dispensari Antituberculós proper a la plaça de Terenci Moix; en concret, es contempla millorar-ne el verd i potenciar-ne un ús veïnal accessible i inclusiu.

Observacions sobre el procés d'execució

D'aquesta proposta tampoc es va trobar el promotor i s'ha treballat internament a nivell tècnic el projecte a executar.

Categoria

**Espais verds i horts
urbans**

Promotors

**Vine a parlar de la salut
als barris de Ciutat Vella
(trobada)**

Executor

BIMSA

Estat actual

Finalitzat (12/2023)

Pressupost inicial

180.000€

Pressupost final

200.000€

Nombre de suports a la fase de votació


1.980

[Enllaç projecte](#)

ABANS



DESPRÉS

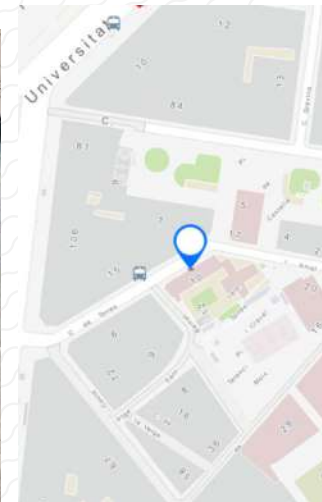


Projecte:**Convertim l'associació veïnal en un punt de servei informàtic accessible**Districte: **Ciutat Vella** Barri: **Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera****Descripció**

El projecte planteja habilitar un espai de serveis informàtics i posar-lo a disposició de la gent del barri, en especial de les persones de mobilitat reduïda, perquè esdevingui un punt d'accés a internet i un espai de capaciació i d'acompanyament per mitigar la bretxa digital (tràmits per internet, formació, consultes, etc.).

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte inclou millorar l'accessibilitat del local instal·lant-hi una rampa d'entrada i adequant-ne el lavabo per poder-hi accedir amb cadira de rodes. També preveu adequar la infraestructura per impartir-hi sessions de formació i dotar l'espai d'equips informàtics nous. Es van consensuar amb l'associació de veïns les actuacions a realitzar i les dates d'execució.

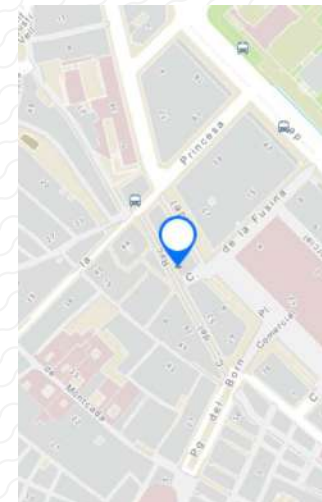Categoria
Tecnologia**Promotors**
Associació Veïnal Casc Antic**Executor**
Districte**Estat actual**
Finalitzat (12/2023)**Pressupost inicial****50.000€****Pressupost final****42.011,06€****Nombre de suports a la fase de votació****1.325**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:

Creem més àrees de joc infantil al Raval

Districte: Ciutat Vella Barri: el Raval

Descripció

Es planteja millorar els ecosistemes lúdics del Raval creant-hi espais accessibles i inclusius, tant de joc induït com fortuït, que cobreixin les necessitats de les diverses franges d'edat. Els espais que es contempla remodelar són les àrees de joc de la plaça de les Caramelles; de la plaça de Vicenç Martorell; de la placeta de Martina Castells i el carrer de l'Arc del Teatre, cantonada amb Ramon Berenguer el Vell.

Observacions sobre el procés d'execució

Es van definir quatre espais a treballar i el 23/5/22 es va fer amb els promotors una sessió específica d'informació i contrast del projecte, presentant les propostes pels quatre espais.

Categoria

Espais de joc infantil

Promotors

Xarxa Veïnal del Raval - Comissió d'urbanisme

Executor

BIMSA

Estat actual

En obres (Previsió 10/2024)

Pressupost inicial

600.000€


Pressupost final

1.310.000€

Nombre de suports a la fase de votació

1.428

Enllaç projecte

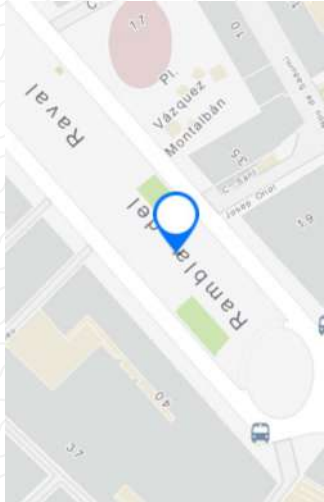

Projecte:

Creem un carril bici al passeig de Joan de Borbó

Districte: Ciutat Vella **Barri:** la Barceloneta

Descripció

Aquest projecte planteja millorar la mobilitat al barri. Es contempla habilitar un carril bici al passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona que connecti amb altres trams de la xarxa de carrils bici (front marítim, plaça del Mar i Via Laietana), i instal·lar-hi aparcaments de bicicletes.

Observacions sobre el procés d'execució

No es va trobar al promotor de la proposta i s'ha treballat internament a nivell tècnic i s'ha consensuat amb el Port el projecte final.

Categoria

Mobilitat i xarxa ciclista

Promotors

Lektort Torik
@lektort_torik

Executor

BIMSA

Estat actual

En obres
Previsió 06.2024

Pressupost inicial

920.000€


Pressupost final

1.205.000€

**Nombre de suports
a la fase de votació**

1.224

[Enllaç projecte](#)

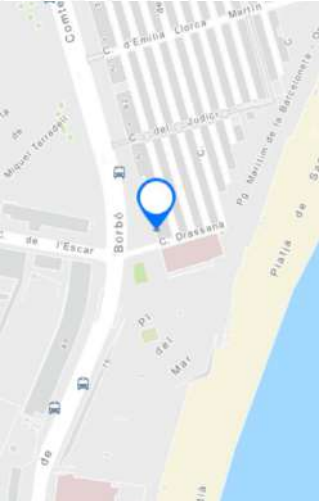


Projecte:**Instal·lem una boia per mesurar l'acidificació del Mediterrani**Districte: **Ciutat Vella** Barri: **la Barceloneta****Descripció**

El projecte planteja instal·lar una estació de sensors al Parc dels Esculls per mesurar variables oceanogràfiques i poder preveure l'avançament del canvi climàtic.

Categoria
Tecnologia**Promotors**
Pablo Cermeno
@pablo_cermeno**Executor**
Districte**Pressupost inicial****200.000€****Pressupost final****200.000€****Observacions sobre el procés d'execució**

Atès que el CSIC ja tenia prevista la instal·lació d'una boia, es va acordar amb el promotor del projecte que el pressupost es dediqués a completar-la amb més sensors que permetessin recollir més dades.

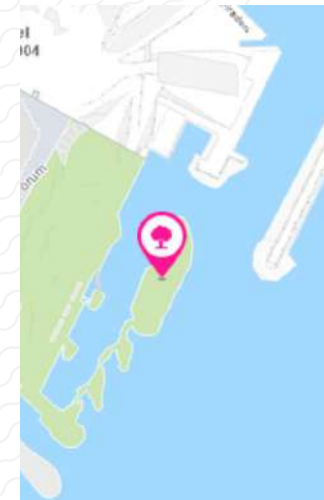
Estat actual
En procés (12/2023)**Nombre de suports**
a la fase de votació**1.154**[Enllaç projecte](#)**DESPRÉS**

Projecte:**Pacifiquem l'entorn de l'Escola Collaso i Gil**Districte: **Ciutat Vella** Barri: **el Raval****Descripció**

Es planteja dignificar i fer més visible l'entrada d'aquesta escola des del carrer de l'Abat Safont. El projecte contempla eixamplar la vorera fins a la meitat del carrer de l'Abat Safont mitjançant la reducció de la zona d'aparcament i el desplaçament dels contenidors d'escombraries. També contempla separar la zona de la calçada instal·lant-hi mobiliari bàsic, com ara jardineres i elements per seure. Es pretén crear un entorn escolar més segur i amb menys trànsit.

Observacions sobre el procés d'execució

Juntament amb els promotors de la proposta, es va incorporar a la direcció i l'AFA de l'escola per definir el projecte.

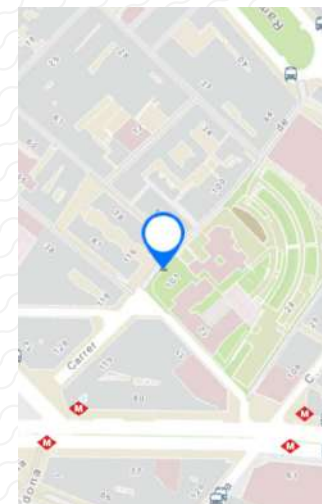Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors****Comissió d'educació de la Xarxa Veïnal del Raval****Executor****BIMSA****Estat actual****Finalitzat (08/2023)****Pressupost inicial****130.000€****Pressupost final****63.435€****Nombre de suports a la fase de votació****1.304**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Posem en valor la muralla romana**Districte: **Ciutat Vella** Barri: **el Barri Gòtic****Descripció**

El projecte planteja dur a terme una intervenció arqueològica de restauració i adequació de la muralla romana, així com un projecte de museització per obrir l'espai al públic de manera ocasional.

Observacions sobre el procés d'execució


Atès que la rehabilitació del tram de muralla s'ha executat en un edifici que no és de propietat municipal, es va afegir la museització de l'espai per oferir visites a la ciutadania. La rehabilitació d'aquest monument permetria que les persones usuàries del centre poguessin fer de guies d'aquest tram de la muralla quan algú el volgués visitar, tal com es va fer durant la commemoració del mil·lenari, o permetria prendre part en la Nit dels Museus o en el 48H Open House Barcelona.

Categoria**Memòria històrica****Promotors**

COGD Ciutat Vella SCCL
entitat gestora del Centre
Ocupacional Sínia.

Executor

**Districte/Entitat/
Patrimoni/Arqueologia**

Estat actual**Finalitzat (12/2023)****Pressupost inicial****65.000€****Pressupost final****74.462,19€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.530**[Enllaç projecte](#)**TRAM DE MURALLA****PLAFONS DE MUSEITZACIÓ**

Projecte:
Reduïm les barreres arquitectòniques al Raval

Districte: **Ciutat Vella** Barri: **el Raval**

Descripció

El projecte contempla eliminar les barreres arquitectòniques del Raval per millorar la mobilitat de la gent gran, de les persones amb discapacitat i de les que van amb un cotxet, perquè sigui més accessible i inclusiu per a tothom. La intervenció contempla una actuació en el carrer Sant Antoni que comporta adequar el terra, eliminar les voreres estretes i impulsar que el darrer tram de la distribució urbana de mercaderies es faci amb carretó i eliminar alguns esglaons que provoquen moltes caigudes en zones molt concretes.

Observacions sobre el procés d'execució

Es va acordar amb els promotors dues actuacions diferents en el marc del projecte: l'eliminació de diferents graons i la pacificació d'un tram del carrer Sant Antoni Abad. Les obres d'aquest carrer es van endarrerir pels problemes que es van presentar amb els serveis soterrats.

Categoria

Millora de l'espai públic

Promotors

**Fundació Tot Raval
- Comissió de Salut
Comunitària**

Executor

BIMSA

Estat actual

**En obres (Previsió
06/2024)**

Pressupost inicial

785.000€

Pressupost final

808.000€

**Nombre de suports
a la fase de votació**


1.261

[Enllaç projecte](#)

ABANS



DESPRÉS

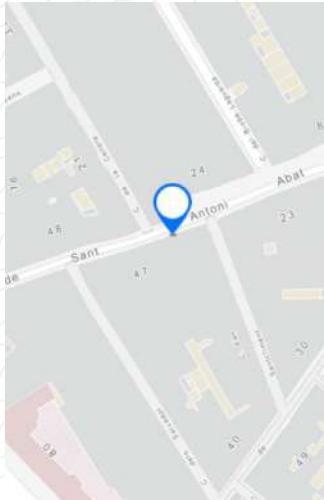

Projecte:**Fem els parcs més accessibles per a tots els infants**Districte: **Eixample** Barri: **la Sagrada Família****Descripció**

Renovació dels jocs infantils dels jardins de Montserrat Roig, i supressió de les barreres arquitectòniques per fer-los accessibles per a tots els infants.

Observacions sobre el procés d'execució

La promotora del projecte participa de la fase de definició de l'avantprojecte, però després renúncia a continuar com a promotora degut a que marxa a viure fora de Barcelona. El pressupost s'ha incrementat sensiblement per garantir l'accessibilitat dels jocs infantils.

Categoria


Espais de joc infantil

Promotor

Noemí

Executor

BIMSA

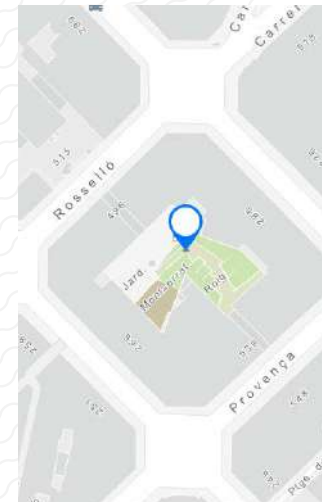Estat actual**En obres (Previsió final 06/2023)****Pressupost inicial****200.000€****Pressupost final****256.382€****Nombre de suports a la fase de votació****2.676**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:

Districte: Eixample

Barri: l'Antiga Esquerra de l'Eixample

Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi

Descripció
El projecte contempla fer un espai de joc infantil nou, millor i més jugable, a la part superior de la plaça del Doctor Letamendi.

Observacions sobre el procés d'execució
El projecte s'ha realitzat segons les previsions inicials a excepció del pressupost, que s'ha hagut d'incrementar per tal de dotar d'una major identitat a l'àrea de jocs infantils, que finalment també ha incorporat criteris d'accessibilitat.

Categoria
Espais de joc infantil

Promotors
Claudia

Executor
BIMSA


Estat actual
Finalitzat
Abril 2024

Pressupost inicial
250.000€

Pressupost final
321.144€

**Nombre de suports
a la fase de votació**
2.104

[Enllaç projecte](#)

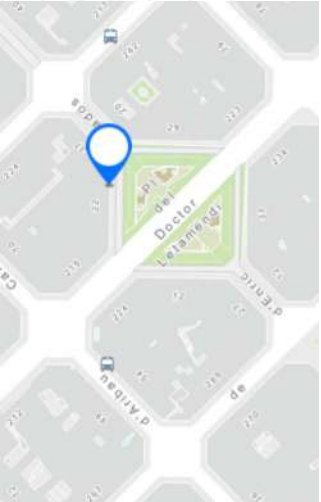

Projecte:**Fem més verds i jugables els entorns de les escoles Els Llorers i L'Arbret**Districte: **Eixample** Barri: **la Nova Esquerra de l'Eixample****Descripció**

Es proposa repensar i transformar els espais d'accés a aquestes escoles per adaptar-los a les necessitats dels infants. Es pretén aconseguir espais públics segurs, verds, jugables i saludables al voltant dels centres educatius i, alhora, s'impulsa la socialització i la cohesió comunitària.

Observacions sobre el procés d'execució

Per al contrast i definició del projecte es va realitzar una sessió participativa amb les famílies de les escoles, i posteriorment dos sessions amb infants del centre. La proposta inicial ha estat sensiblement modificada donada la detecció d'unes canalitzacions que impedié la ubicació de parterres, que han estat substituïts per una tanca. Les restriccions per la sequera han impedit la plantació del verd prevista inicialment, que queda pendent d'executar.

Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors**

AMPA Els Llorers, Escola Els Llorers, AFA L'Arbret, Escola Bressol L'Arbret, Camí Amic i Espai Apacheta.

Executor**Districte****Estat actual****Finalitzat (12.2023)****Pressupost inicial****120.000€****Pressupost final****108.191,13€****Nombre de suports a la fase de votació****1.738**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:
**Impulsem cinc ecoxamfrans
al carrer d'Aragó**

Districte: Eixample

Descripció

El projecte contempla crear cinc ecoxamfrans, dissenyats amb urbanisme tàctic, per recuperar per a les persones els espais que ara ocupen els vehicles. A la vegada, es planteja disposar de més punts d'estada i de trobada per al veïnat, ara pràcticament inexistents en aquesta via.

Observacions sobre el procés d'execució

Després d'acordar amb els promotors la proposta definitiva del projecte d'urbanisme tàctic als 5 ecoxamfran, es van fer els treballs de redacció de projecte i licitació de l'obra. Finalment el mes de juliol de 2023 es considera convenient no procedir a la seva execució, amb la conseqüent indemnització a l'empresa licitadora de l'obra. El Districte es compromet a assumir en aquest mandat de forma directa una futura intervenció estructurant amb un únic ecoxamfrà (el planificat inicialment a la seu de districte).

Categoria

**Pacificació o remodelació
de carrers**

Promotors

Eixample Respira

Executor

BIMSA

Estat actual

Executat parcialment

Pressupost inicial

300.000€

Pressupost final

62.555€

**Nombre de suports
a la fase de votació**

2.805

[Enllaç projecte](#)

ABANS



DESPRÉS

Fotografia no disponible



Projecte:

Obrim carrils bici a la plaça de Catalunya

Districte: Eixample **Barri:** la Dreta de l'Eixample

Descripció

Es planteja millorar les connexions entre l'Eixample i Ciutat Vella mitjançant un carril bici segregat a la plaça de Catalunya.

Categoria

Mobilitat i xarxa ciclista

Promotors

Albert, Rafael, (Xarxa Veïnal del Raval)

Executor

BIMSA

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte contemplava la realització d'un carril bici en sis trams, quatre d'ells que rodejaven la Plaça de Catalunya i dos més que la connectaven amb la plaça d'Urquinaona, un per la Ronda Sant Pere i un altre pel carrer de Fontanella. D'aquests trams, inicialment es va decidir que els dos de la Ronda Sant Pere no es realitzarien per manca de pressupost. També es va detectar dificultats tècniques de connexió amb la Rambla de Catalunya i amb l'Av. de Portal de l'Àngel, a més del recorregut i reubicació al tram de la parada de l'aerobús. Després de concretar una proposta amb els promotors al juliol del 2022, al juliol de 2023 es decideix que el cal fer una revisió integral del projecte una vegada finalitzades les obres de la Rambla de Catalunya per tal de definir millor la seva connexió.

Pressupost inicial

600.000€

Pressupost final

35.789,56€

Nombre de suports a la fase de votació

2.332


[Enllaç projecte](#)

ABANS



DESPRÉS

Fotografia no disponible

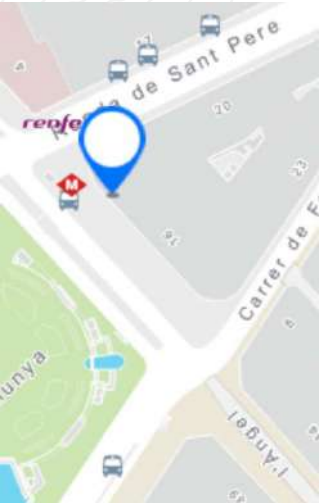

Projecte:
Pacifiquem el carrer Rosselló

Districte: Eixample **Barri:** l'Antiga Esquerra de l'Eixample

Descripció

Es proposa complementar la xarxa d'eixos verds prevista per al barri amb una actuació al carrer del Rosselló que connecti La Model (hi ha dues escoles), els Jardins de Montserrat, l'Espai de Gent Gran, l'Escola Industrial (hi ha diversos centres educatius i esportius) i l'Hospital Clínic.

Observacions sobre el procés d'execució

S'han realitzat sis reunions amb els promotors per tal de redefinir la proposta inicial, donat que tècnicament es van identificar diversos elements significatius que requerien un canvi en la proposta, que finalment va quedar reduïda a una proposta de mínims. El procés d'execució va arribar fins a la redacció del projecte: estudis previs, contractació i redacció de l'avantprojecte i del projecte executiu. Finalment el mes de maig de 2023 el projecte no s'aprova administrativament i l'obra no es licita.

Categoria

Pacificació o remodelació de carrers

Promotors

Xavier (AVV Esquerra Eixample i Camí Amic)

Executor

BIMSA

Estat actual

No executat

Pressupost inicial

875.000€

Pressupost final

31.793,58€

Nombre de suports a la fase de votació

2.816

[Enllaç projecte](#)

ABANS



DESPRÉS

Fotografia no disponible



Projecte:**Pacifiquem els entorns escolars del carrer d'Entença****Districte:** Eixample **Barri:** l'Antiga Esquerra de l'Eixample**Descripció**

El projecte planteja pacificar el carrer d'Entença, ampliar l'entorn de l'escola Joan Miró i de la Llar d'Infants Àgora, i reduir un carril entre la Gran Via de les Corts Catalanes i l'avinguda de Roma. Així es disminueix la contaminació acústica i atmosfèrica i es pot habilitar un cordó de serveis al carrer d'Entença.

Observacions sobre el procés d'execució

Dels quatre trams planificats inicialment, un es va acordar executar en una futura fase, degut a la utilització del carril a eliminar i que s'ha de dedicar temporalment a la desviació de diverses línies d'autobús (cosa que finalment no s'ha portat a terme). També es va acordar amb els promotors fer una proposta de mínims que fes viable la seva execució. Aquests elements han fet reduir el pressupost notablement.

Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors**

AMPA Joan Miró, AFI Entença, AFA Xirinacs, Llar d'Infants Àgora, AVV Eixample Esquerra.

Executor**BIMSA****Estat actual****Finalitzat****Desembre 2023****Pressupost inicial****270.000€****Pressupost final****164.369,03€****Nombre de suports a la fase de votació****1.687**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:

Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample

Districte: Eixample **Barri:** l'Antiga Esquerra de l'Eixample

Descripció

Es planteja que cap dels carrers de 20 metres d'amplada que hi ha al barri conservi quatre carrils de trànsit, que equivalen als que tenen algunes autopistes. El projecte contempla eliminar un carril de circulació en els carrers d'Aribau i de Muntaner (entre l'avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes).

Observacions sobre el procés d'execució

Es va acordar amb els promotors fer una proposta de mínims que fes viable la seva execució, en tant que es tracta de 10 trams d'illa en dos carrers. Aquest element ha fet reduir el pressupost notablement.

Categoria

Pacificació o remodelació de carrers

Promotors

Xavier (AVV Esquerra Eixample i Camí Amic)

Executor

BIMSA

Estat actual

Finalitzat
Febrer 2024

Pressupost inicial

380.000€


Pressupost final

95.830,43€

Nombre de suports a la fase de votació

2.516

[Enllaç projecte](#)

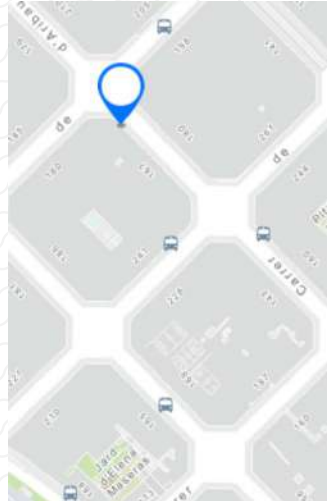


Projecte:**Millorem el parc de l'Espanya Industrial**Districte: **Sants-Montjuïc** Barri: **Hostafrancs****Descripció**

Remodelar i millorar alguns espais del parc de l'Espanya Industrial, com ara la zona de grades, el llac, l'àrea de gespa i la zona de jocs. També col·locar-hi baranes, millorar-ne l'enllumenat, remodelar-ne les portes d'accés i instal·lar-hi un circuit esportiu de cal·listènia.

Observacions sobre el procés d'execució

Tot i augmentar la partida pressupostària, no es possible executar totes les demandes. Finalment s'actua sobre la millora i ampliació del parc infantil, reubicació de les taules ping-pong, adequació de les pistes bàsquet, reubicació, ampliació i millora de l'àrea gossos, nous parterres i nova zona de cal·listènia. A causa del decret de sequera també hi ha un canvi de destinació de la partida destinada al verd, que es reinverteix en millores que no estaven previstes inicialment com l'arranjament de les escales que comuniquen amb la passarel·la, reposició de peces de paviment, la instal·lació d'un tancat a la zona de petanca, entre d'altres.

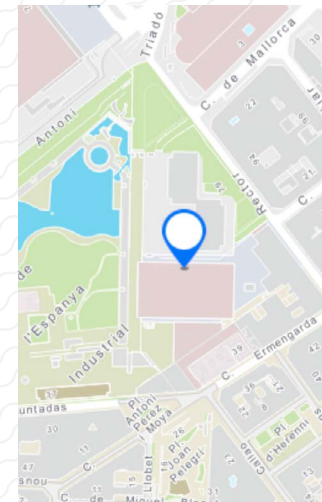Categoria**Espais verds
i horts urbans****Promotors****Associació de Veïns
d'Hostafrancs i Centre Social
de Sants****Executor****BIMSA****Estat actual****Finalitzat****Pressupost inicial****850.000€****Pressupost final****1.099.311€****Nombre de suports
a la fase de votació****3.351**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives**Districte: **Sants-Montjuïc****Descripció**


Col·locar pantalles LED multifunció i sistemes de megafonia en determinades instal·lacions esportives, així com renovar-ne els dispositius actuals.

Categoria**Equipaments i espais esportius****Promotors**

Unió Esportiva de Sants i Taula d'Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Executor**Districte****Observacions sobre el procés d'execució**

L'actuació del projecte consisteix en la instal·lació de videomarcadors en comptes de pantalles LED multifunció i sistemes de megafonia. L'actuació es realitza als Centre Esportius Municipals de l'Espanya Industrial i al camp de futbol de l'Energia.

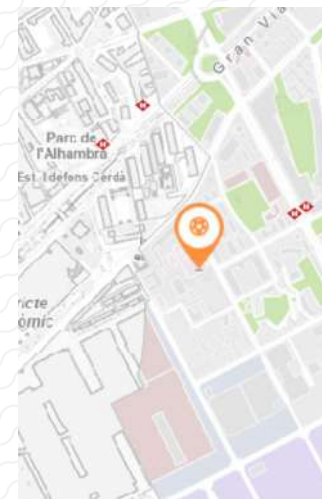Estat actual**Finalitzat.****Desembre 2022****Pressupost inicial****70.000€****Pressupost final****78.572,94€****Nombre de suports a la fase de votació****1.824**[Enllaç projecte](#)**DESPRÉS**

Projecte:**Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins**Districte: **Sants-Montjuïc** Barri: **Poble-sec****Descripció**

Arreglar els camins perquè facilitin la comunicació del nucli urbà del Poble-sec amb les escoles i els diversos equipaments que hi ha a la muntanya de Montjuïc. Això permetrà crear espais segurs, didàctics, inclusius i útils per a tothom, en un context de recuperació ecològica de la muntanya.

Observacions sobre el procés d'execució


L'actuació comporta d'una banda millorar el camí que mena a les escoles i instal·lar-hi una il·luminació adequada, així com habilitar-hi zones d'estada, incloent-hi l'àrea de la font de la Palmera, i de l'altra renovar la zona d'esbarjo coneguda com a «el Marcelino», utilitzada com a espai lúdic a la sortida de l'escola, millorant-ne els elements d'estada i instal·lant-hi elements de joc nous.

Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors**

AMPA Escola El Bosc i AMPA Escola Tres Pins

Executor

BIMSA

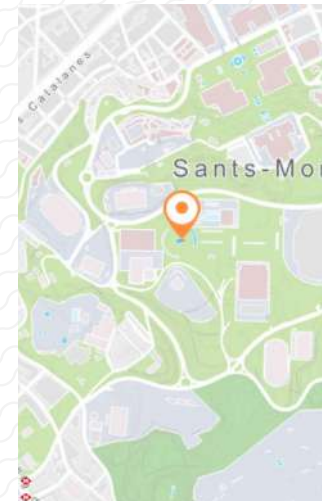Estat actual**Finalitzat.****Desembre 2023****Pressupost inicial****850.000€****Pressupost final****1.132.812€****Nombre de suports a la fase de votació****2.413**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte: Pacifiquem Sants-Antic

Districte: **Sants-Montjuïc** Barri: **Sants**

Descripció

es plantegen diverses mesures per pacificar el perímetre comprès entre la carretera de Sants (nord) i els carrers de Gavà (sud), d'Olzinelles (est) i de Gaiarre (oest), de manera que ofereixi unes condicions de trànsit, comoditat i seguretat pensades per prioritzar els vianants.

Observacions sobre el procés d'execució

Instal·lació hidrojardineres, pilones bancs i altres elements de pacificació i pintura de terra a la Plaça Ibèria, i als carrers d'Ibèria, de la Ferreria, d'Almeria i Rossend Arús. A la plaça Ibèria també s'hi preveu la instal·lació de bancs de formigó curvilinis.

Categoria

Pacificació o remodelació de carrers

Promotors

AFA Montserrat, AFA Gayarre, GFD Proa i AV de la Plaça de la Farga

Executor

BIMSA

Estat actual

En obres. Previsió final juny 2024

Pressupost inicial

200.000€

Pressupost final



228.902€

Nombre de suports
a la fase de votació

2.483

[Enllaç projecte](#)

DESPRÉS

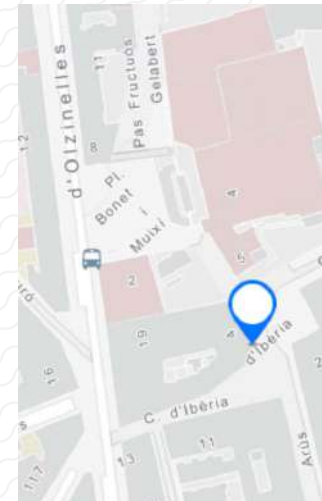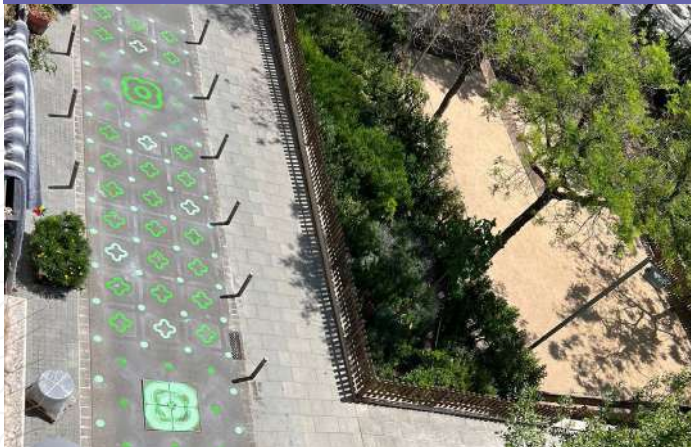

Projecte:

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris

Districte: Sants-Montjuïc Barri: Parc de Montjuïc

Descripció

Dur a terme una reforma integral d'aquest camp esportiu, per a la pràctica de criquet i d'una manera segura i adequada i obrir-lo a altres esports minoritaris.

Observacions sobre el procés d'execució

Entre altres coses es planteja, un camp de gespa amb un pitch, un túnel de batada, un punt d'aigua, enllumenat, vestidors, espais per seure, un magatzem, xarxes i dur a terme el tancament del camp.

Categoria

Equipaments i espais esportius

Promotor

Cricket Barcelona

Executor

BIMSA

Estat actual

Finalitzat.
Febrer 2024

Pressupost inicial

1.6M€

Pressupost final

1.599.990€

Nombre de suports a la fase de votació


2.890

[Enllaç projecte](#)

ABANS



DESPRÉS

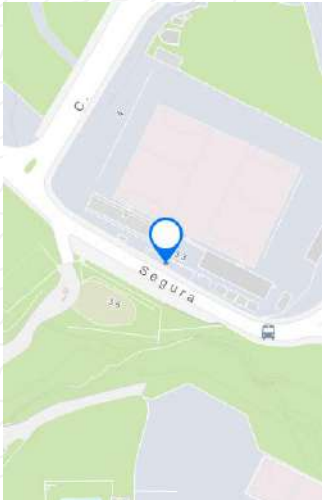

Projecte:**Ampliar recursos per a entitats juvenils**Districte: **Les Corts** Barri: **Les Corts****Descripció**

El projecte pretén donar un impuls a les entitats del barri posant a la seva disposició les infraestructures necessàries per dur a terme les seves activitats.

Categoria

Equipaments per col·lectius específics

Promotors

Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts

Executor

Districte

Pressupost inicial**52.000€****Pressupost final****49.656,60€****Observacions sobre el procés d'execució**

S'han comprat taules, cadires i carpes per a les activitats dels joves i entitats del Districte. També s'ha fet un projecte de lones ignífugues amb imatges de festes de foc per protegir els comerços i portals en el recorregut dels correfocs i diables.

Estat actual**Finalitzat.****Desembre 2023****Nombre de suports a la fase de votació****819**[Enllaç projecte](#)**DESPRÉS**

Projecte:
Fem créixer el verd a Les Corts

Districte: Les Corts

Descripció

Es planteja introduir verd i natura en diferents racons del districte. Es proposa instal·lar un jardí vertical en una paret mitgera i cobrir un mur de verd. Aquesta actuació millora la qualitat de l'aire i la temperatura ambient i, per tant, beneficiarà la salut del veïnat

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte inclou obrir finestres a la paret mitgera dels Jardins de Goday, posar plaques fotovoltaiques i cobrir en verd la resta de la paret. El decret de sequera ha dificultat el calendari d'execució.

Categoria

**Espais verds
i horts urbans**

Promotors

**Trobada "Emergència
climàtica a Les Corts"**

Executor

IMPU

Pressupost inicial

472.500€

Pressupost final

466.287,61€

**Nombre de suports
a la fase de votació**

908

Estat actual



En projecte.

Inici obra octubre 2024

ABANS



PREVISIÓ D'INTERVENCIÓ

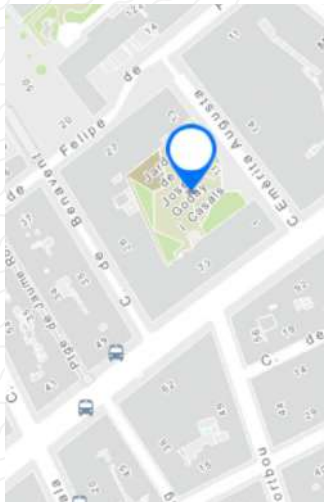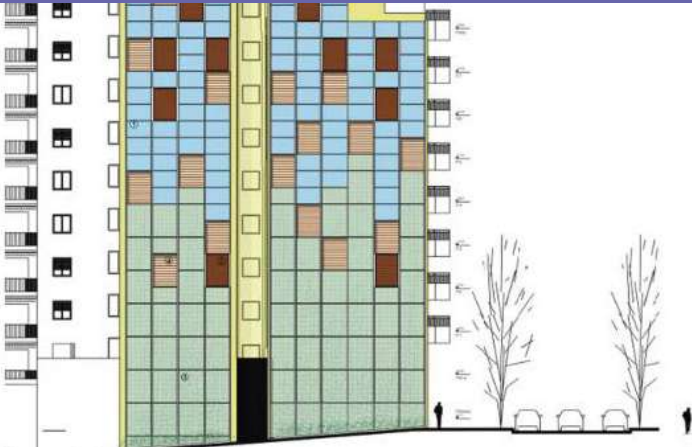


[Enllaç projecte](#)

Projecte:**Iniciar carril bici per Travessera de Les Corts****Districte:** Les Corts**Descripció**

Proposa impulsar un estudi tècnic per renovar Travessera de Les Corts i pacificar aquesta via i millorar la seguretat dels vianants i de les bicicletes així com construir un carril bici transversal.

Categoria**Mobilitat i xarxa ciclista****Promotors****Alberto Raso****Executor****BIMSA****Pressupost inicial****345.000€****Pressupost final****374.523€****Observacions sobre el procés d'execució**

Aquest projecte és dins del tram de la Travessera de les Corts entre la Gran Via de Carles III i Riera Blanca, que connectarà la xarxa ciclista amb l'Hospitalet de Llobregat. El projecte té diversos agents de finançament entre l'Ajuntament de Barcelona i el FC Barcelona, per tant aquesta obra s'ha d'executar en diverses etapes. S'actua en el tram entre el carrer de Joan Güell i la Gran Via de Carles III, que connecten amb els dos eixos verticals entre l'avinguda Diagonal i el districte de Sants, i amb la remodelació de l'entorn del Camp Nou.

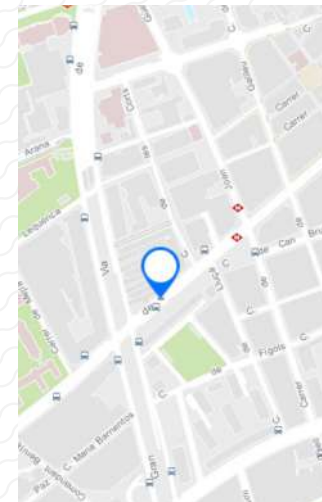
Estat actual**Finalitzat.****Abril 2024****Nombre de suports
a la fase de votació****1.212**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Instal·lar un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts**Districte: **Les Corts** Barri: **Les Corts****Descripció**

El projecte planteja instal·lar una pista de bàsquet 3x3 en el solar situat al carrer de Morales, cantonada amb el carrer Montnegre per tal de promoure l'esport i la integració de la gent del barri.

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte al final ha instal·lat una pista de bàsquet i elements de calistenia per promoure l'esport al carrer.

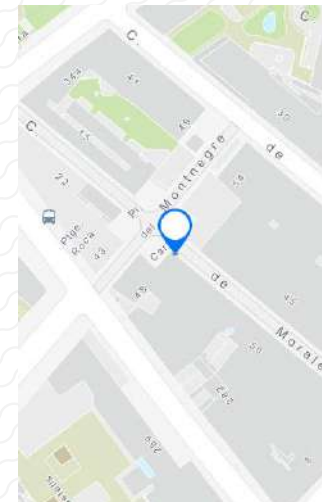
Categoria**Equipaments i espais esportius****Promotor****Alejandro****Executor****Districte****Estat actual****Finalitzat (12/2022)****Pressupost inicial****70.000€****Pressupost final****68.017,74€****Nombre de suports a la fase de votació****764**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Millorar el parc de la Colònia Castells**Districte: **Les Corts** Barri: **Les Corts****Descripció**

La proposta planteja elaborar el projecte executiu de les obres del parc de la Colònia Castells destinades a rehabilitar les cases del passatge de Piera, les quals cal conservar per preservar la memòria històrica de l'antiga Colònia Castells.

Categoria**Millora de l'espai públic****Promotors****Daniel i Carmen****Executor****Districte / IMU****Pressupost inicial****150.000€****Pressupost final****15.000€****Observacions sobre el procés d'execució**

El projecte no es pot executar a l'espera del canvi de planejament urbanístic. En el mandat passat es decideix fer petites intervencions per tal de protegir les casetes. Es fa avantprojecte i un treball de memòria històrica amb lones coincidint amb l'obertura del parc.

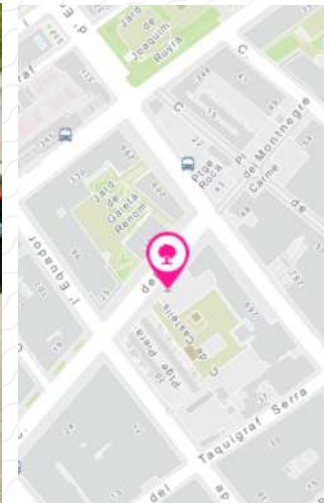
Estat actual**Executat parcialment
maig 2024****Nombre de suports
a la fase de votació****746**[Enllaç projecte](#)**COLÒNIA CASTELLS****DESPRÉS**

Projecte:**Pacificar l'entorn de Vallespir amb Travessera!**Districte: **Les Corts** Barri: **Les Corts****Descripció**

La proposta proposa fer una intervenció tàctica al carrer del Vallespir, des de la cantonada de la Travessera de les Corts fins al carrer del Marquès de Sentmenat perquè l'entorn de l'Escola Duran i Bas sigui més confortable i fomenti la jugabilitat. Al projecte s'han incorporat diversos elements, com ara bancs, jardineres i estructures jugables.

Observacions sobre el procés d'execució

Aquest projecte s'ha treballat conjuntament amb l'AFA de l'escola Duran i Bas. Finalment ha calgut modificar alguna cosa per poder garantir la mobilitat del barri.

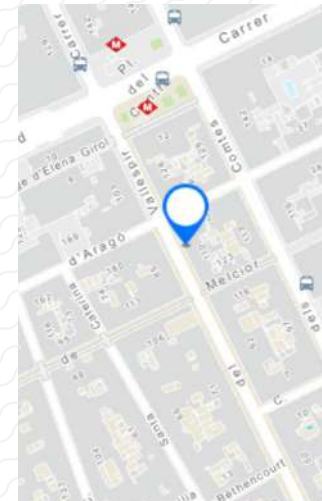Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors****AFA Escola Duran i Bas****Executor****BIMSA****Estat actual****Finalitzat.****Novembre 2023****Pressupost inicial****120.000€****Pressupost final****163.321€****Nombre de suports a la fase de votació****1.009**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:

**Recuperar per als vianants
Europa-Anglesola-Numància**

Districte: **Les Corts** Barri: **Les Corts**

Descripció

Volem crear una plaça nova al barri de les Corts, i aprofitem el projecte «Protegim les Escoles» per convertir en zona de vianants el carrer d'Anglesola-carrer d'Europa, des del carrer de Gandesa fins al de Numància

Categoria

**Pacificació o remodelació
de carrers**

Promotors

Joan Caba, Carme Poll
(presidenta AFA Anglesola) i
Alejandro Casero i AFA Xiroi

Executor

BIMSA

Pressupost inicial

260.000€

Pressupost final

617.483€

Nombre de suports
a la fase de votació

792

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte ha incrementat de pressupost per poder realitzar obra estructural i no tàctica. Finalment Districte realitzarà les dues fases del projecte. S'ha treballat conjuntament amb els promotors per introduir millores.

Estat actual

En projecte.


Inici obres juliol 2024

ABANS



PENDENT D'OBRES

Fotografia no disponible

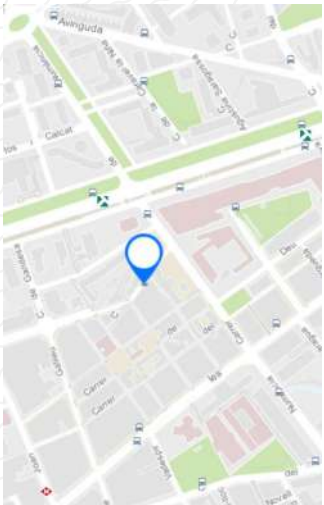

[Enllaç projecte](#)

Projecte:**Renovar la Biblioteca
Les Corts-Miquel Llongueras**Districte: **Les Corts** Barri: **la Maternitat i Sant Ramon****Descripció**

Es planteja renovar i modernitzar la biblioteca per dignificar l'espai de cultura del barri i fer-lo acollidor i accessible per a tothom. Es proposa ampliar-ne l'espai multimèdia, comprar mobiliari i ordinadors nous, i incorporar la terrassa als espais de la biblioteca. També es vol millorar el sistema de climatització per fer-ho més sostenible des d'un punt de vista mediambiental.

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte ha millorat molt els espais de la biblioteca, s'ha fet una feina conjunta amb Biblioteques i l'equipament per trobar les millors solucions.

Categoria**Equipaments culturals****Promotors**

Usuàries de la biblioteca
(representada per Carmen),
Consorti de Biblioteques,
Associació de Discapacitats
visuals de Catalunya B1B2B3

Executor**BIMSA****Estat actual****Finalitzat.****Novembre 2023****Pressupost inicial****500.000€****Pressupost final****407.636€****Nombre de suports
a la fase de votació****620**[Enllaç projecte](#)**FAÇANA EQUIPAMENT****DESPRÉS**

Projecte:**Crear un carril bici a la Via Augusta**Districte: **Sarrià - Sant Gervasi****Descripció**

Habilitar un carril bici a la Via Augusta, des del carrer de Ganduxer fins a la plaça de Borràs.

Categoria**Mobilitat i xarxa ciclista****Promotors**

Virginia, Marta, Juan Pablo i Pol

Executor**BIMSA**


Pressupost inicial

1.100.000€

Pressupost final

972.011€Nombre de suports
a la fase de votació**1.009****Observacions sobre el procés d'execució**

El projecte amplia la xarxa ciclista enllaçant el tram de Laforja i Ganduxer. Amb aquest projecte es realitza de Ganduxer fins a Dolors Monserdà. També es realitza el projecte executiu fins a PI Borràs pendent d'assegurar el voladís de Via Augusta.

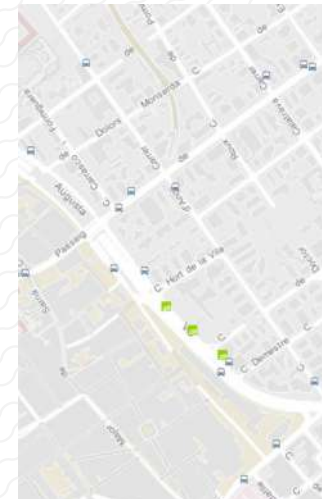Estat actual**Finalitzat.****Agost 2023****ABANS****DESPRÉS**[Enllaç projecte](#)

Projecte:**Cuidem la infància i el medi ambient a l'Escola Lourdes****Districte:** Sarrià - Sant Gervasi **Barri:** Sant Gervasi - Galvany**Descripció**


Volem millorar l'entorn de l'escola i garantir la seguretat dels infants —en especial des de preescolar (P3) fins a segon de primària— a la sortida del centre educatiu. Per això, proposem ampliar la vorera de la via Augusta, així com incorporar vegetació i mobiliari a l'entorn.

Observacions sobre el procés d'execució

La millora de l'entorn de l'escola a Via Augusta ha quedat integrada en les obres del carril bici Via Augusta, vetllant per la seguretat dels infants i millorant amb mobiliari urbà i arbres.

Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors**

Escola Lurdes: Mireia (directora del centre) i Oriol (professor responsable dels projectes sostenibles); AFA Escola Lurdes: David (director), Clara (arquitecta i responsable del projecte Protegim les Escoles), Laura (arquitecta i responsable del projecte)

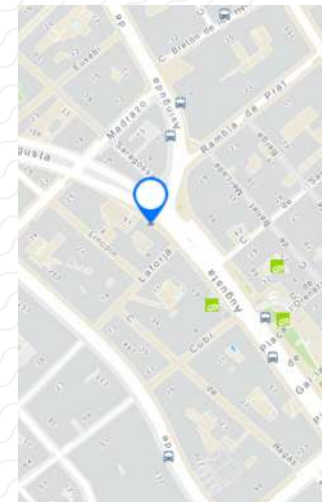Executor**BIMSA****Estat actual****Finalitzat.****Agost 2023****Pressupost inicial****50.000€****Pressupost final****Import inclòs en actuació Carril Bici****Nombre de suports a la fase de votació****698**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:
Cultivar l'hort comunitari de Sarrià de Dalt

Districte: Sarrià - Sant Gervasi **Barri:** Sarrià

Descripció

Proposem crear un hort ecològic de gestió comunitària amb l'objectiu de generar cohesió social a la zona de Sarrià de Dalt. Volem potenciar un nou espai de trobada i revalorar l'ús d'una peça de titularitat municipal amb la clara vocació d'impulsar la sobirania alimentària i l'educació en valors de l'horticultura.

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte ha patit un increment de pressupost per poder garantir la neteja de les terres de cultiu. S'ha treballat molt conjuntament amb els promotors per trobar solucions consensuades a les dificultats que han anat sorgint, fins i tot al començament de les obres.

Categoria

Espais verds i horts urbans

Promotors

Hort de Can Ràfols (Daniel i Leo), Associació de veïns de Sarrià (Eduardo i Eva), El Centre de Sarrià (Montserrat), L'esplai Movi de Sarrià (Pepe i Anna), ASSIS - Centre d'acollida persones sense llar (Enric)

Executor

BIMSA

Estat actual

En obres. Previsió final setembre 2024

Pressupost inicial

120.000€




Pressupost final

371.509€

Nombre de suports a la fase de votació

613

[Enllaç projecte](#)

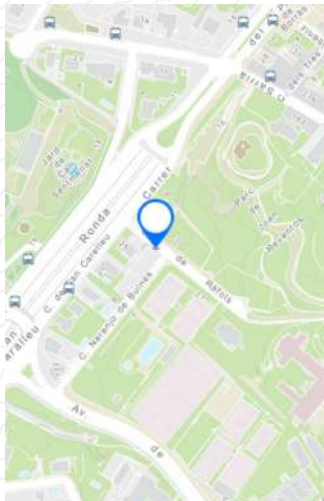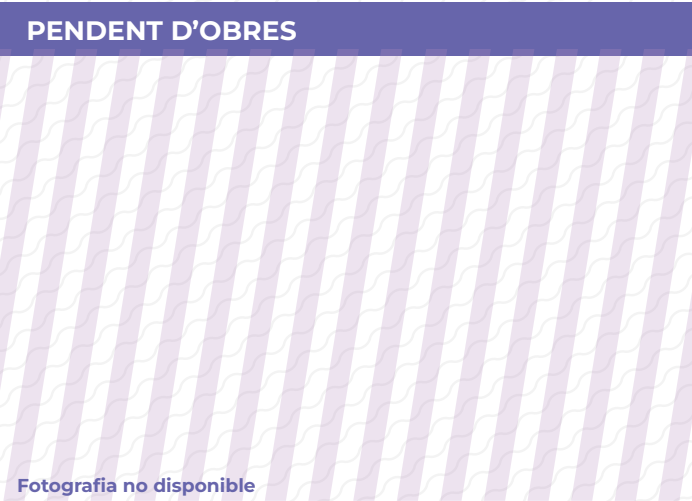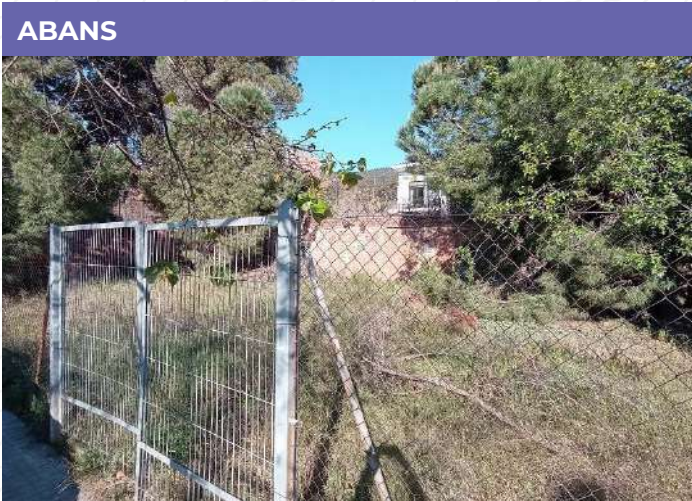

Projecte:**Guanyar espai per als vianants al carrer de Balmes!**Districte: **Sarrià - Sant Gervasi** Barri: **Sant Gervasi - la Bonanova****Descripció**

Volem ampliar l'espai per als vianants al carrer de Balmes, entre la ronda del General Mitre i la plaça de Joaquim Folguera. Per això, plantegem una actuació tàctica que comporti la implantació d'un carril de serveis i la millora de la mobilitat a la cruïlla amb el carrer de Bertran.

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte ha tingut alguna modificació donada la intervenció de les obres de la línia 9 de metro que afecten a la zona de la plaça Joaquim Folguera.

Categoria**Millora de l'espai públic****Promotors****Santi Maruny****Executor****BIMSA****Estat actual****Finalitzat.****Setembre 2023****Pressupost inicial****340.000€****Pressupost final****210.563€****Nombre de suports
a la fase de votació****946**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:
Superilla al Farró - Pacificar el barri

Districte: Sarrià - Sant Gervasi **Barri:** el Putxet i el Farró

Descripció

Al llarg dels anys s'han fet diverses intervencions al barri del Farró per pacificar-ne els carrers. Aquestes intervencions, però, eren inconnexes entre si i no han aconseguit aquest objectiu. Plantegem dissenyar una estratègia que interpreti el barri com un tot -com una superilla- a partir de tres accions clau.

Observacions sobre el procés d'execució

Les intervencions es concentren a l'àrea emmarcada pel carrer de Balmes, la ronda del General Mitre, l'avinguda de la Riera de Cassoles i la Via Augusta. Consisteix a incorporar cinc voreres passants, on es pavimentarà la calçada al mateix nivell que la vorera, amb panot diferenciats, i s'incorporaran guals de pujada i baixada dels vehicles per reduir-ne la velocitat.

Categoria

Pacificació o remodelació de carrers

Promotors

Carme i altres veïns del Farró

Executor

BIMSA

Estat actual

En obres. Previsió final setembre 2024

Pressupost inicial

370.000€


Pressupost final

417.903€

Nombre de suports a la fase de votació

686

[Enllaç projecte](#)

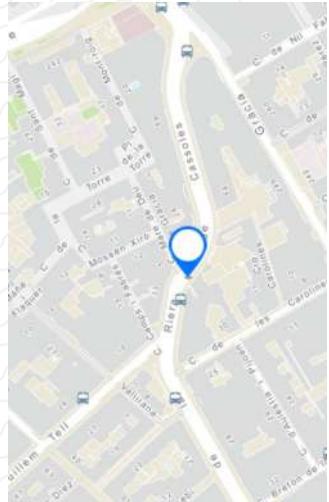

Projecte:**Urbanitzem el carrer de Romaninar**Districte: **Sarrià - Sant Gervasi** Barri: **Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes****Descripció**

Volem urbanitzar el carrer del Romaninar per millorar-ne les condicions d'accés i la salubritat.

Categoria

Pacificació o remodelació de carrers

Promotors

Mercè, Jordi, Ramon i Néstor

Executor

IMU

Pressupost inicial

112.500€


Pressupost final

0**Observacions sobre el procés d'execució**

Aquest projecte no s'ha pogut realitzar donat que es tracta d'una primera urbanització del carrer (com marca la Llei d'Urbanisme en aquests casos els propietaris han d'assumir-ne una part de les despeses amb un conveni amb l'Ajuntament). Aquest acord amb els veïns no es va poder duu a terme.

Estat actual**No executat**Nombre de suports
a la fase de votació**360**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Fotografia no disponible

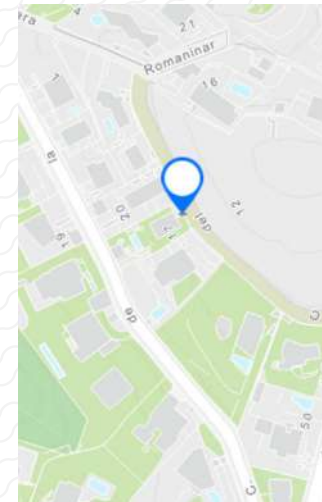

Projecte:**Fem una Gràcia més verda****Districte:** Gràcia**Descripció**

Es proposa incorporar elements de verd urbà en diferents punts del Districte de Gràcia per tal de millorar-ne la qualitat de l'aire i d'afavorir la salut de tots els veïns i veïnes.

Categoria

Espais verds i horts urbans

Promotors

Sense promotores

Executor

BIMSA

Pressupost inicial**500.000€****Pressupost final****34.105€****Observacions sobre el procés d'execució**


S'ha redactat el projecte executiu per incrementar el verd en els carrers Taxdirt (entre Sardunya i Pau Alsina), Topazi (entre Plaça del Diamant i Rubí), Trav. Gràcia (Gran de Gràcia - Vïc), Gràcia (escola Patronat Domènech), Martí (entre Escorial i d'Alegre de Dalt), i Bruniquer (Joanic - Torrent Flors). El projecte no s'ha pogut executar per restriccions en la plantació de vegetació derivades del protocol de sequera.

Estat actual

No executat

**Nombre de suports
a la fase de votació****2.885**[Enllaç projecte](#)**ABANS****PENDENT D'OBRES**

Fotografia no disponible

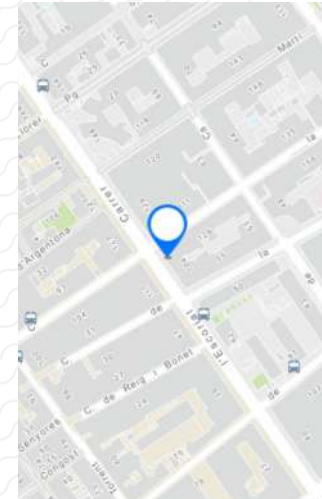


Projecte:**Acabem amb els espais foscos a Gràcia**Districte: **Gràcia****Descripció**

El projecte preveu il·luminar els carrers identificats en els resultats de les passejades realitzades pel Consell de Dones, així com detectar nous punts foscos i implementar les actuacions pendents —fins a exhaurir el pressupost— per aconseguir zero espais foscos a Gràcia.

Observacions sobre el procés d'execució

El mes d'abril del 2022 es va realitzar col·laborativament 5 marxes exploratòries (no mixtes) pels 5 barris del districte de Gràcia per avaluar els elements que condicionen la percepció d'inseguretat amb perspectiva feminista. A partir de les marxes es va elaborar un llistat d'actuacions relacionades amb l'enllumenat, l'arbrat, la configuració dels carrers, etc. Es van avaluar tècnicament les relacionades amb la millora de l'enllumenat, resultant un llistat d'actuacions a prioritzar per executar-les fins a exhaurir el pressupost.

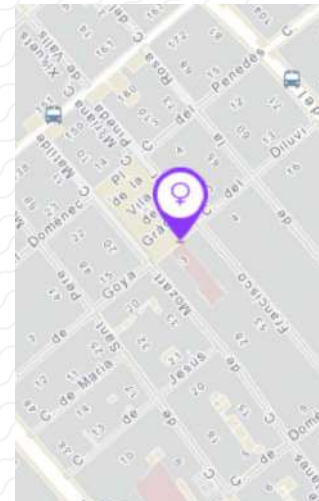Categoria**Mobiliari urbà****Promotors****Consell de Dones de Gràcia****Executor****BIMSA****Estat actual****Finalitzat.****Desembre 2023****Pressupost inicial****300.000€****Pressupost final****300.000€****Nombre de suports a la fase de votació****2.220**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:
**Instal·lem un lavabo públic a la
plaça de les Dones del 36**

Districte: Gràcia **Barri:** la Vila de Gràcia

Descripció

Es proposa la instal·lació d'uns lavabos autorentables que contribueixin a mantenir la plaça neta i garanteixin l'equilibri entre la vida veïnal i els diferents usos de l'espai públic.

Observacions sobre el procés d'execució

S'han valorat diverses ubicacions a la plaça per no generar nous racons ni espais foscos. La instal·lació del lavabo ha requerit una petita intervenció d'obra civil per fer-hi arribar els subministraments necessaris, aquesta intervenció ha incrementat el pressupost en 15.616 €.

Categoria
Mobiliari urbà

Promotors
Sense promotors

Executor
Districte


Estat actual
Finalitzat.
Febrer 2024

Pressupost inicial
150.000€

Pressupost final
165.616,91€

**Nombre de suports
a la fase de votació**
1.348

[Enllaç projecte](#)

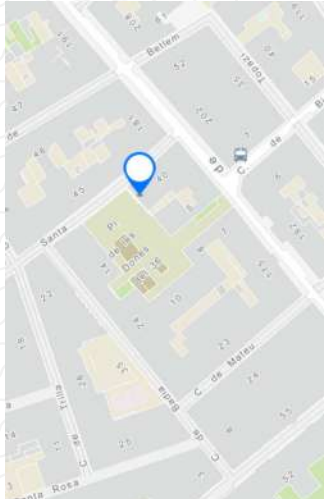


Projecte:**Millorem els patis de l'Escola Pau Casals i obrim-los al barri****Districte:** Gràcia **Barri:** el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova**Descripció**

Es proposa convertir el pati de l'Escola Pau Casals en un pati amb color, natura, espais amb ombres i un paviment amable. Crear espais que ofereixin un ampli ventall d'oportunitats educatives i d'experimentació, que despertin la imaginació, s'adaptin als diferents interessos i necessitats de tots els infants, per fomentar-ne un ús inclusiu. Adequar les instal·lacions per promoure l'ús del pati per part d'altres entitats i col·lectius del barri, per al foment de l'esport i el moviment.

Observacions sobre el procés d'execució

El pressupost s'ha incrementat en 21.234,57 € per incloure elements imprescindibles per les promotores i que quedaven fora del projecte per falta de pressupost: Compra de cistelles de mini bàsquet, instal·lació d'un sistema de megafonia al pati, i l'arranjament de l'enllumenat, que no tenia sentit pel canvi d'orientació del pati.

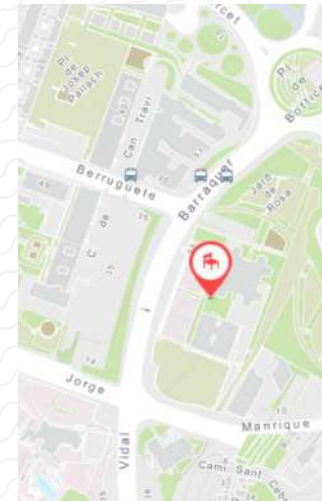Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors****AFA de l'Escola Pau Casals-Gràcia****Executor****CEB****Estat actual****Finalitzat.****Novembre 2023****Pressupost inicial****450.000€****Pressupost final****471.234,57€****Nombre de suports a la fase de votació****1.377**[Enllaç projecte](#)**FAÇANA EQUIPAMENT****DESPRÉS**


Projecte:**Recuperem els camins de Vallcarca a Collserola****Districte:** Gràcia **Barri:** Vallcarca i els Penitents**Descripció**

Aquest projecte planteja recuperar els camins que antigament connectaven Gràcia amb la muntanya de Collserola, per tal de tornar a relacionar la ciutat amb la natura mitjançant la creació d'itineraris per recórrer a peu i per practicar-hi activitat física.

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte presentat contemplava tres actuacions: Un estudi dels camins que antigament connectaven Gràcia amb la muntanya de Collserola, implantar una senyalització específica dels camins: panells informatius, indicacions i senyalització a terra, i rehabilitar un camí que millori la connexió entre la plaça d'Alfonso Comín i la carretera de les Aigües.

S'han executat les 2 primeres actuacions, donat que la muntanya de Collserola no és competència del Districte.

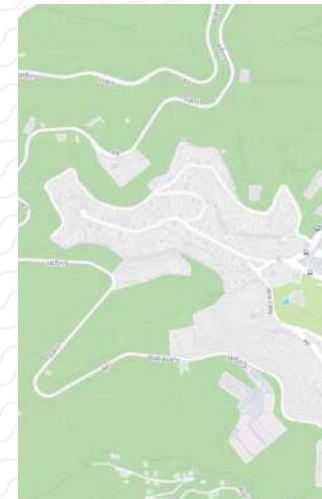Categoria**Espais verds i horts urbans****Promotors****Sense promotores****Executor****Districte****Estat actual****Finalitzat.****Febrer 2023****Pressupost inicial****50.000€****Pressupost final****45.871,09€****Nombre de suports a la fase de votació****2.655**[Enllaç projecte](#)**DESPRÉS**


Projecte:**Reformem els serveis i vestuaris per fer més accessible el llac - piscina de la Creueta del Coll**Districte: **Gràcia** Barri: **el Coll****Descripció**

Es proposa reordenar i redistribuir l'edifici que hi ha al costat del bar, de manera que el llac-piscina i el parc de la Creueta del Coll disposin de lavabos i de vestidors accessibles.

Categoria**Mobiliari urbà****Promotors****Taula Comunitària El Coll****Executor****BIMSA****Pressupost inicial****200.000€****Pressupost final****341.472€****Observacions sobre el procés d'execució**

El projecte en execució es va validar amb els membres de la Taula d'Urbanisme del Coll, inclou lavabos i vestidors públics i accessibles.

Per requisits tècnics del projecte de reforma, el cost s'ha incrementat en 140.000 €

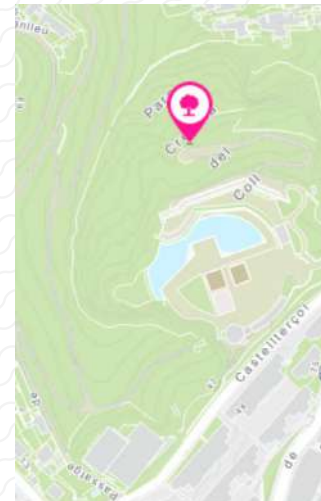Estat actual**Finalitzat.****Nombre de suports a la fase de votació****1.492**[Enllaç projecte](#)**DESPRÉS**

Projecte:

Remodelem el parc infantil de la plaça de la Revolució

Districte: Gràcia **Barri:** la Vila de Gràcia

Descripció

Es proposa ampliar i millorar l'àrea de jocs infantils de la plaça Revolució, incorporant elements de joc per als infants de totes les edats, així com elements que facin ombra, per tal que la plaça esdevingui un espai més agradable i jugable.

Observacions sobre el procés d'execució

El 5 de novembre de 2021 es va fer una sessió participativa amb infants a la Pl. Revolució per recollir les seves necessitats i demandes per la nova àrea de jocs. El 31 de març de 2022 i el 28 de juny es va presentar el projecte al veïnat i comerciants de la plaça, les esmenes derivades d'aquestes reunions i condicionants tècnics identificats per les àrees municipals han implicat modificacions en el projecte i endarrerit l'execució.

Categoria

Espais de joc infantil

Promotors

Dones de la Plaça Romaní

Executor

BIMSA

Estat actual

En projecte.

Inici obra juny 2024

Pressupost inicial

350.000€

Pressupost final

328.877€

**Nombre de suports
a la fase de votació**



1.249

[Enllaç projecte](#)

ABANS



PREVISIÓ D'INTERVENCIÓ

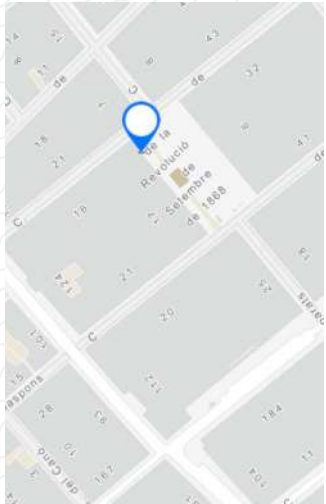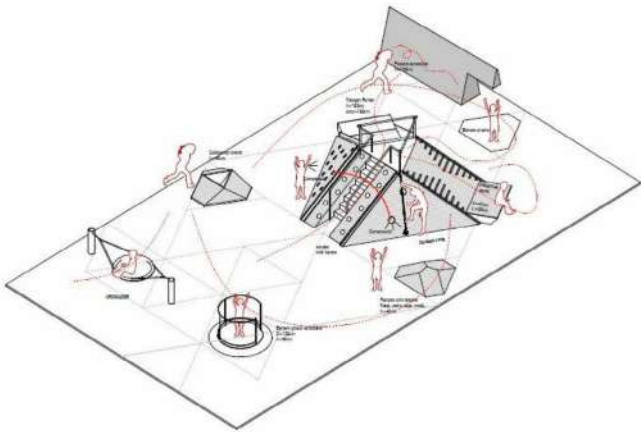

Projecte:

Renovem l'àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l'entorn

Districte: Gràcia **Barri:** el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Descripció

Es planteja renovar l'àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan- concretament, la que està situada entre el carrer de la Indústria i el de Còrsega-, així com el mobiliari que inclou.

Categoria

Espais de joc infantil

Promotors

AVV Passeig de Sant Joan

Executor

BIMSA

Observacions sobre el procés d'execució

El 3 de novembre de 2021 es va realitzar una sessió participativa amb infants davant dels jocs infantils per recollir les seves necessitats i demandes per la nova àrea de jocs.
El pressupost s'ha incrementat en 100.000 € per garantir l'accessibilitat dels jocs infantils.

Estat actual

Finalitzat.

Maig 2024

Pressupost inicial

225.000€

Pressupost final

324.092€

Nombre de suports a la fase de votació

1.350

[Enllaç projecte](#)



Projecte:
Rehabilitem la part històrica del parc del Guinardó

Districte: Horta – Guinardó **Barri:** el Guinardó

Descripció
El projecte renova el parc del Guinardó, rehabilitant els elements històrics i la vegetació. També millora la part més urbana mitjançant una distribució més adequada de les instal·lacions i dels espais per optimitzar els usos de la zona.

Observacions sobre el procés d'execució
L'execució de l'obra s'ha endarrerit fins a la data prevista de finalització d'obra al mes de gener del 2025.

Categoria
Espais verds i horts urbans

Promotors
Model de barri

Executor
BIMSA



Estat actual
En obres.
Previsió final gener 2025

Pressupost inicial
1.600.000€

Pressupost final
1.630.000€

Nombre de suports a la fase de votació
1.597

[Enllaç projecte](#)

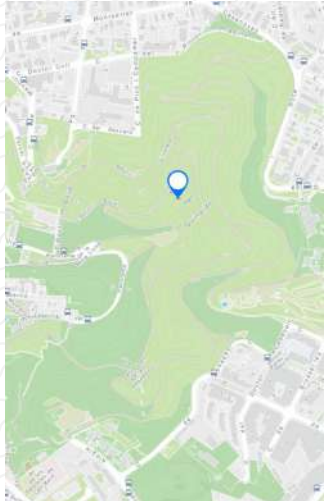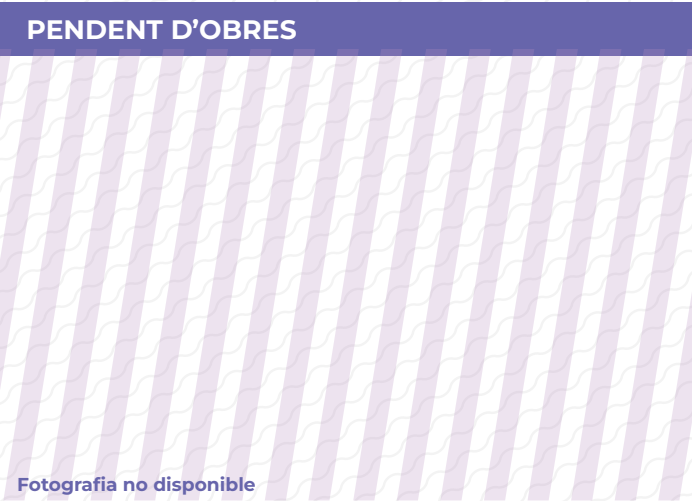


Projecte:**Carril bici a la Ronda del Guinardó**Districte: **Horta – Guinardó** Barri: **el Guinardó****Descripció**

El projecte crea un carril bici a la ronda del Guinardó, des del carrer de Teodor Llorente fins al carrer de Cartagena.

Categoria**Mobilitat i xarxa ciclista****Promotors****Víctor****Executor****BIMSA****Pressupost inicial****650.000€****Pressupost final****763.599€****Observacions sobre el procés d'execució**

L'entrega de l'obra es va endarrerir del temps inicialment previst degut a diferents episodis de pluja. L'entrega d'obra es va fer a l'abril de 2022.

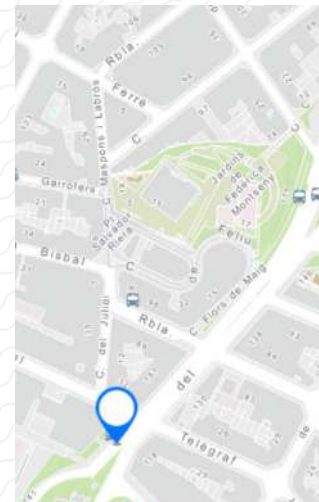
Estat actual**Finalitzat.****Abril 2022****Nombre de suports
a la fase de votació****1.418**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Fem el Casal Font d'en Fargues
més ecològic i sostenible****Districte:** Horta – Guinardó **Barri:** la Font d'en Fargues**Descripció**

El projecte fa front a l'emergència climàtica i consta d'un seguit d'actuacions orientades a mitigar el canvi climàtic i a adaptar-s'hi. El projecte contempla diferents accions: fer del Casal un refugi climàtic, afavorint bones condicions de confort tèrmic per tal de permetre l'estada de població en casos de onada de calor: crear una cancel·la d'entrada de vidre i perfils d'acer, substitució del paviment de lames de fusta per nou paviment de rajoles, instal·lació d'una font a l'entrada i millora i/o actualització de la programació domòtica.

Observacions sobre el procés d'execució

La inconcreció del projecte va motivar reunions extraordinàries amb les persones promotores per a fer, en primer terme, el diagnòstic de l'edifici i, posteriorment la concreció de les actuacions per a la millora energètica de l'equipament adaptades al pressupost.

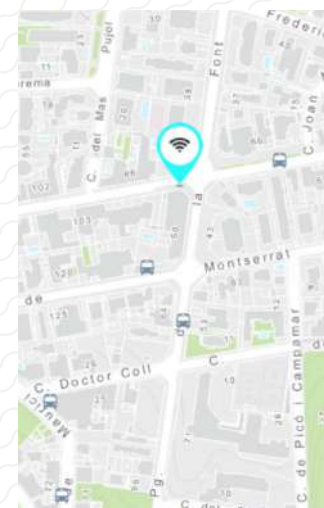Categoria**Equipaments de
proximitat****Promotors****Associació Casal Font
d'en Fargues****Executor****Districte****Estat actual****Finalitzat.****Gener 2023****Pressupost inicial****100.000€****Pressupost final****84.244,12€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.262**[Enllaç projecte](#)**DESPRÉS**

Projecte:

Millorem el llac dels jardins del Baix Guinardó

Districte: Horta – Guinardó **Barri:** el Baix Guinardó

Descripció

Amb aquest projecte pretenem canviar els usos del llac del parc del Baix Guinardó. L'objectiu consisteix a transformar-lo en un espai de joc i d'estada, adreçat, sobretot, als infants i a la gent jove.

Categoria

Espais de joc infantil

Promotors

Anna i AAVV Baix Guinardó

Executor

BIMSA

Pressupost inicial

300.000€

Pressupost final

40.344€

Observacions sobre el procés d'execució

El procés d'execució del projecte va arribar fins a la redacció inicial del projecte: estudis previs, concurs d'arquitectura, contractació i redacció de l'avantprojecte. Posteriorment, arran de la coincidència en el temps i l'espai amb un altre projecte, la realització d'aquest es va veure afectada. Finalment el mes d'octubre de 2023 el projecte no s'aprova administrativament i l'obra no es licita.

Estat actual

No executat

Nombre de suports a la fase de votació

1.374

ABANS



DESPRÉS

Fotografia no disponible



[Enllaç projecte](#)

Projecte:**Millorem el pati de l'Escola de les Aigües**Districte: **Horta-Guinardó** Barri: **el Baix Guinardó****Descripció**

Volem transformar el pati obert de l'Escola de les Aigües en un jardí ple de vegetació i d'elements naturals, que representi un pulmó verd i un refugi climàtic per al Baix Guinardó, i que fomenti la salut del barri i impulsi la diversitat de joc des d'una perspectiva de gènere.

Observacions sobre el procés d'execució

Obra entregada segons els terminis previstos.

Categoria

**Equipaments
educatius i entorns
escolars**


Promotors

**AFA Escola
de les Aigües**

**Inclusió perspectiva
de gènere
Pendent de valorar**

Estat actual

**Finalitzat
(Novembre 2022)**

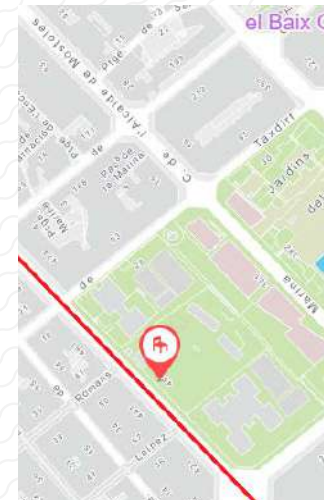Pressupost inicial**185.000€****Pressupost final****202.352,84€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.442**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**


Projecte:**Renovem el Poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre**Districte: **Horta – Guinardó** Barri: **el Carmel****Descripció**

El projecte planteja renovar la pista del poliesportiu de Coves d'en Cimany perquè els infants i adolescents puguin tenir un lloc on practicar esport. La intervenció contempla la rehabilitació del paviment, pintura, senyalització de la pista i instal·lació d'elements esportius.

També es col·loca una nova zona d'àgora per crear jocs diversos i es procedeix a la reforma de les instal·lacions dels lavabos i al reforç de la tanca perimetral.

Observacions sobre el procés d'execució

La proposta inicial del projecte no contemplava algunes de les actuacions que posteriorment es van valorar necessàries dur a terme com, per exemple, la tanca perimetral o la remodelació dels lavabos. Finalment, es van incorporar totes les actuacions al pressupost, amb la satisfacció de les promotores. L'entrega de l'obra va patir alguna complicació, degut a que aquesta pista s'utilitza els caps de setmana de manera no autoritzada.

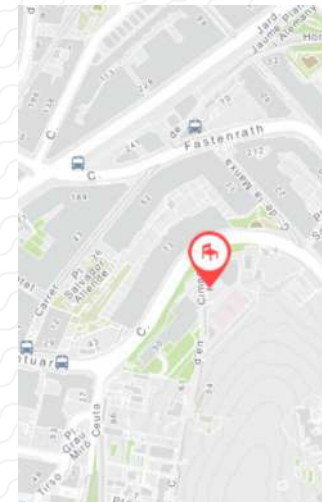
Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors****Olga Cruz i Neus Anglada****Executor****CEB****Estat actual****Finalitzat.****Febrer 2023****Pressupost inicial****300.000€****Pressupost final****441.924,45€****Nombre de suports a la fase de votació****1.079**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Renovem l'enllumenat del carrer de Sorolla**Districte: **Horta – Guinardó** Barri: **Montbau****Descripció**

El projecte contempla renovar l'enllumenat del carrer de Sorolla i d'altres emplaçaments propers del barri.

Categoria**Mobiliari urbà****Promotors****AAVV Montbau****Executor****Enllumenat****Pressupost inicial****52.000€****Pressupost final****51.930€****Estat actual****Finalitzat.****Novembre 2022****Nombre de suports
a la fase de votació****899**[Enllaç projecte](#)**Observacions sobre el procés d'execució**

Aquest projecte va sorgir d'una trobada amb la ciutadania. El fet de no disposar de promotor/a, va motivar que ens adrecessim a l'associació de veïns/es de Montbau per concretar-lo. Es va acordar la realització d'un estudi lumínic de tot el barri de Montbau i en base a aquest es van desplegar tota una sèrie d'accions, per millorar la il·luminació. Algunes d'elles van ser assumides dins del projecte de pressupostos participatius i d'altres des del propi Districte o des d'altres Àrees (parcs i jardins,...). Finalment, les actuacions que es van dur a terme al barri de Montbau, com a pressupostos participatius van ser: Parc infantil al costat de la sala polivalent (carrer Arquitectura): 9.076 euros. Sorolla (amb canvis de suports i llumeneres): 22.636 euros. Substitució de lluminàries plaça Mossen Ferran palau: 11.470 euros. Substitució de punts de llum façana carrer Domènech i Montaner: 8.748 euros.

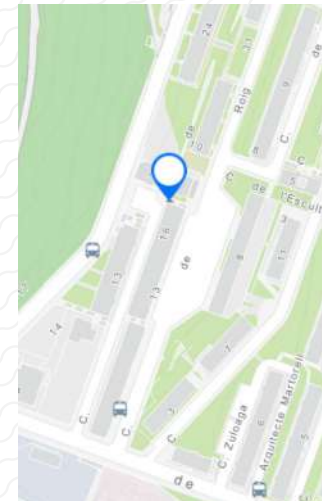ABANS**DESPRÉS**

Projecte:**Creem un parc esportiu inclusiu a Can Dragó**Districte: **Nou Barris** Barri: **Porta****Descripció**


El projecte planteja millorar l'espai esportiu i lúdic situat entre l'avinguda Meridiana, l'avinguda Rio de Janeiro i el camp de futbol, de manera que sigui accessible per a tothom: des dels infants i la gent jove fins a les persones adultes i les persones amb discapacitat.

Observacions sobre el procés d'execució

Un cop seleccionat el projecte, els promotors van demanar incloure el trasllat d'una area de gossos. Com des de pressupostos no es podia perquè no havia estat previst ni valorat, el districte va dir que assumirà el cost. Això convertia el projecte en un projecte en fases donat que primer havia de marxar el pipican i després executar el projecte de millora de l'espai esportiu inclòs l'espai que deixava lliure el trasllat. Primer el districte va haver de aconseguir el pressupost i llavors van començar la contractació per part de BIMSA. L'empresa contractada va iniciar el projecte però va renunciar, es va haver de fer una nova contractació que no es va entendre amb els tècnics de l'Ajuntament a l'hora de dissenyar el projecte finalment l'administració va rescindir la contractació. Donat que s'havia de fer una altra contractació i tenir el disseny per per iniciar execució i que no entrava dins del període que restava per executar els projectes de pressupostos, el projecte va caure. El districte va comunicar als promotors que ell executaria el projecte durant aquest mandat.

Categoria**Espais verds
i horts urbans****Promotors****Convivim Porta****Executor****BIMSA****Estat actual****No executat.****Pressupost inicial****578.000€****Pressupost final****9.534€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.504**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Fotografia no disponible

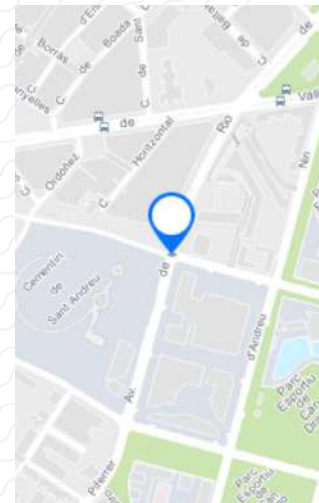

Projecte:**Fem un parc agrari urbà de Can Valent**Districte: **Nou Barris** Barri: **Porta****Descripció**

Planteja un projecte amb finalitats ecosocials i educatives consistent a habilitar una rambla verda que inclogui horts comunitaris, un bosc comestible i un hort terapèutic.

Observacions sobre el procés d'execució


El projecte ha anat avançant el l'execució amb contacte constant i visites in situ dels promotors conjuntament amb l'equip de redacció i execució del projecte. Els entrebancs sorgits s'han parlat i superat.

Categoria**Espais verds
i horts urbans****Promotors**

Assemblea d'aturades i aturats de Nou Barris, Associació de veïns i veïnes de Porta, Associació 500x20, Asociación de artesanos y artesanas de Nou Barris, AsiA (Associació Salut i Agroecologia), Ecologistes en Acció, Escola d'Hosteleria i Turisme, Porta'm

Executor**BIMSA****Estat actual****En projecte.****Inici obres febrer 2025****Pressupost inicial****700.000€****Pressupost final****1.163.588€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.140**[Enllaç projecte](#)**ABANS****PENDENT D'OBRES**

Fotografia no disponible

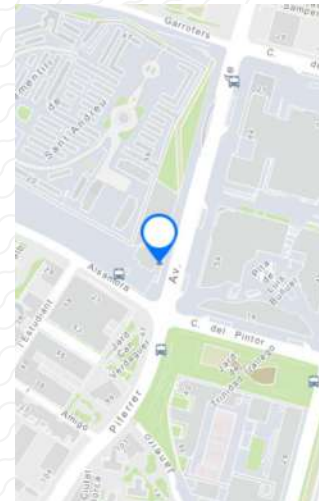


Projecte:**Iniciem el procés per adequar la terrassa de La Cosa Nostra en un espai jove**Districte: **Nou Barris** Barri: **Can Peguera****Descripció**

Tramitar el planejament i possible redacció del projecte per a l'adequació futura de la terrassa del Casal de Barri La Cosa Nostra, a Can Peguera, en una sala per a joves dins del mateix espai. Hi ha diverses sales polivalents, però cap no és específica per a gent jove.

Categoria**Equipaments de proximitat****Promotors****Casal La Cosa Nostra i AAVV Can Peguera****Executor****Districte****Pressupost inicial****50.000€****Pressupost final****20.000€****Observacions sobre el procés d'execució**

S'ha fet la redacció del pla especial de l'avantprojecte i del planejament derivat.

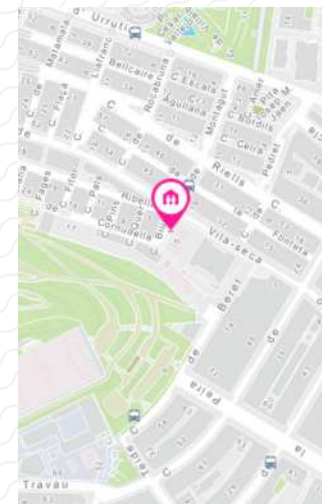Estat actual**Finalitzat.****falta data finalització****Nombre de suports a la fase de votació****827**[Enllaç projecte](#)**CASAL DE BARRI LA COSA NOSTRA**

Projecte:**Instal·lem bancs adaptats per a la gent gran**Districte: **Nou Barris** Barri: **Porta****Descripció**


Aquest projecte contempla la instal·lació de bancs adaptats per a la gent gran.

Categoria**Mobiliari urbà****Promotors**

Veï o veïna del barri de Porta a un Punt Mòbil.

Executor**Districte****Pressupost inicial****50.000€****Pressupost final****47.067,8€****Observacions sobre el procés d'execució**

El projecte recollit en un punt mòbil i sense promotor amb qui interlocutar demava la col·locació dels bancs en la Via Júlia. Com en el moment de l'execució feia poc que s'havien canviat els de aquella zona, es va decidir fer la instal·lació en la zona de Porta.

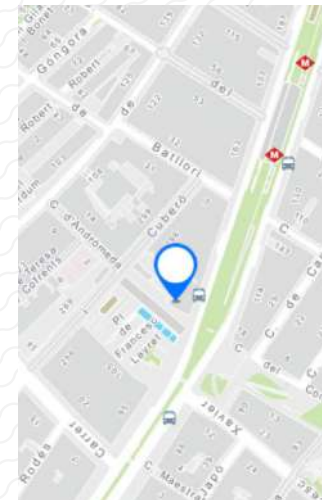Estat actual**Finalitzat.****Gener 2022****Nombre de suports
a la fase de votació****1.455**[Enllaç projecte](#)**DESPRÉS**

Projecte:
Millorem les voreres de l'avinguda de Rio de Janeiro entre el carrer de Vèlia i el passeig de la Ciutat de Mallorca

Districte: Nou Barris **Barri:** Porta

Descripció
Planteja reurbanitzar aquest tram de l'avinguda de Rio de Janeiro per millorar-ne l'accessibilitat.

Categoria
Pacificació o remodelació de carrers

Promotors
Convivim Porta

Executor
BIMSA

Observacions sobre el procés d'execució
Es va treballar conjuntament amb els promotors en el disseny del projecte un cop acordat es van adonar des del districte que una part del terreny afectat per l'execució era propietat de les comunitats de veïns properes. Es va haver d'iniciar contacte amb les tres comunitats propietaries per tal que donessin el vist-i-plau a l'execució del projecte, es va trigar uns mesos donat que aquestes tenien demandes pel districte a canvi d'accedir a les obres. Finalment es va obtenir el permís de totes tres però va fer que l'execució del projecte es retardés.



Estat actual
En projecte.
Inici obra octubre 2024

Pressupost inicial
270.000€

Pressupost final
605.637€

Nombre de suports a la fase de votació
985

[Enllaç projecte](#)

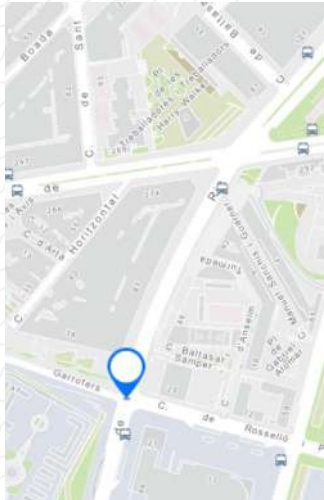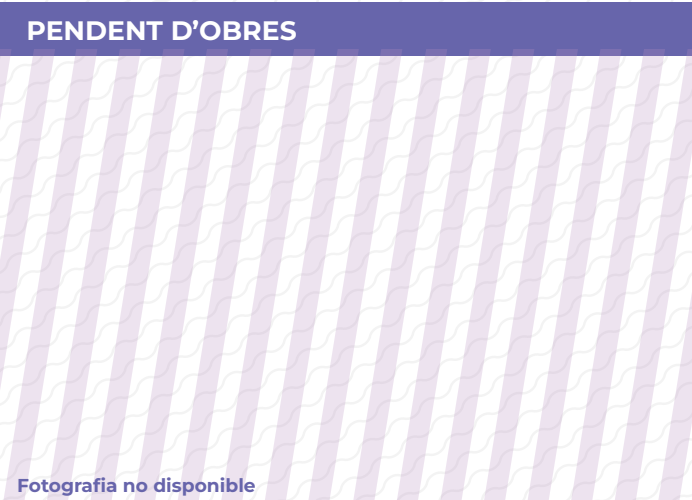

Projecte:**Obrim aules Informàtiques a la Trinitat Nova**Districte: **Nou Barris** Barri: **la Trinitat Nova****Descripció**

El projecte planteja habilitar aules informàtiques al barri de la Trinitat Nova perquè totes les persones puguin accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Categoria

Equipaments per col·lectius específics

Promotors

José (Taula Oberta), José (Taula Oberta), José (Bruixas y Bruixots), Ramón (AAVV).

Executor

Districte


Pressupost inicial

50.000€

Pressupost final

49.246,47€Nombre de suports
a la fase de votació**1.073****Observacions sobre el procés d'execució**

S'ha realitzat la compra del material i s'ha formalitzat el document de cessió amb l'entitat promotora. En l'equipament s'ha creat un grup motor per impulsar el projecte amb entitats, equipaments i serveis. S'ha establert un acord de col·laboració amb l'institut tecnològic de Barcelona. S'han realitzant les primeres accions formatives al casal de barri, el projecte ja forma part del dia a dia del casal de barri.

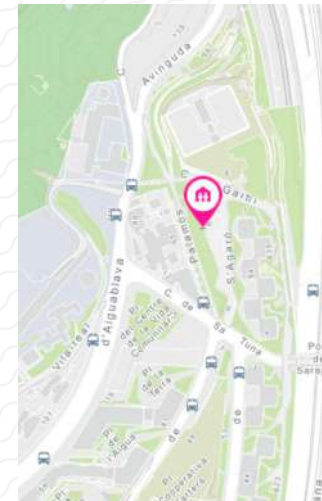Estat actual**Finalitzat.****Setembre 2022****DESPRÉS**[Enllaç projecte](#)

Projecte:

Obrim un carril bici al passeig de Fabra i Puig

Districte: Nou Barris Barri: Porta

Descripció
Aquest projecte contempla habilitar un carril bici al passeig de Fabra i Puig, entre l'avinguda Meridiana i la plaça del Virrei Amat.

Observacions sobre el procés d'execució
Un cop escollit el projecte el districte i mobilitat que havia donat el vist i plau van començar a trobar dificultats en la seva execució a la vegada que el teixit comercial de Fabra i Puig es posicionava a la contra. Va passar el temps amb poca informació als promotors sobre que estava succeint el que va provocar que aquests s'adrecessin al síndic de greuges. Finalment el districte va comunicar als promotors que no es podia executar el projecte perquè no havia estat valorada tota l'afectació que suposava per exemple en tema de serveis (escombraries...) per això els proposa, realitzar el carril bici del carrer Escòcia i fer un estudi de mobilitat del Fabra i Puig per tenir quina és la forma de poder dibuixar un carril per Fabra i Puig sense afectar la mobilitat. Els promotors van acceptar, es va refer el pressupost, sobraven diners del pressupostos inicial, es informar als promotors que anirien a la bossa comú de pressupostos i van decidir que preferien invertir-los en fomentar el carril bici en Nou barris, per això el projecte queda definit finalment com: Carril bici a carrer Escòcia i estudi de mobilitat de Fabra i Puig des de meridiana a Passeig Valldaura i Estudi de carril bici a Passeig valldaura. Pendants de l'execució del carril bici del carrer Escòcia i del retorn.

Categoria
Mobilitat i xarxa ciclista

Promotors
M^a Paz Ricart Barrabés i Laia Martínez Sitjà



Executor
BIMSA

Pressupost inicial
650.000€

Pressupost final
781.353€

Nombre de suports a la fase de votació
1.225

Estat actual
En projecte.
Inici obra juliol 2024.

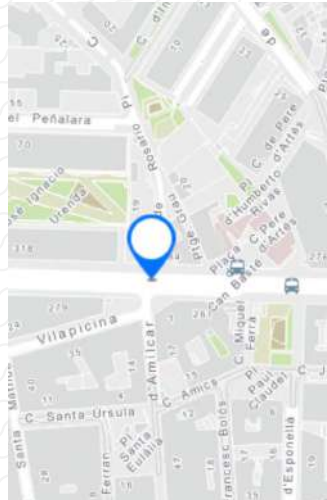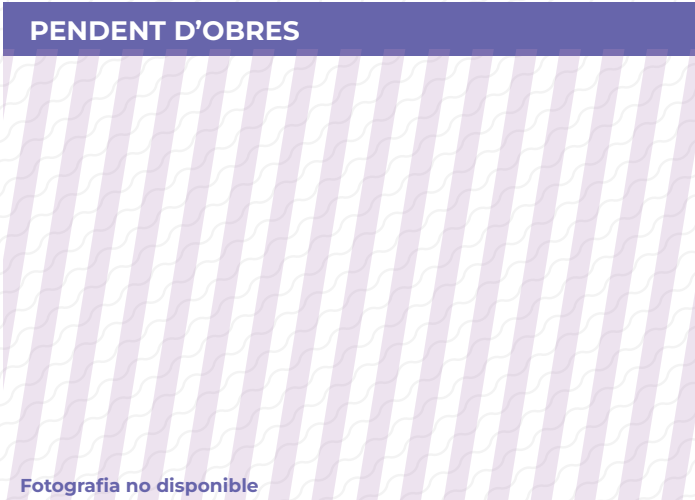

Fotografia no disponible

[Enllaç projecte](#)

Projecte:
Reforestem Collserola**Districte:** Nou Barris**Descripció**

Aquest projecte contempla reforestar les parcel·les situades fora del parc natural per augmentar la biodiversitat.

Categoria

Espais verds i horts
urbans

Promotors

Consell de Barri de
Canyelles

Executor

Districte/Consorti/Parc

Pressupost inicial**50.000€****Pressupost final****9534€****Observacions sobre el procés d'execució**

Restauració paisatgística del Torrent de Canyelles:

Tasques realitzades: retirada de canya, retirada de deixalles, retirada d'estructures en runa, revegetació de l'àmbit, arranament de la Font Vella de Canyelles, arranament de l'antiga mina de Canyelles i arranament de camins.


Estat actual**Finalitzat.****Gener 2022.****Nombre de suports
a la fase de votació****1.889**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:
Salvem Can ValentDistricte: **Nou Barris** Barri: **Porta****Descripció**

El projecte planteja la rehabilitació i consolidació de la masia de Can Valent.

Observacions sobre el procés d'execució

La definició del projecte va anar variant durant el procés del pressupostos finalment va quedar amb la rehabilitació de l'estructura de la masia. Durant les obres es van trobar restes arqueològiques, es van haver d'aturar les obres i valorar les troballes. Això va fer que s'allargués el temps d'execució. Tot i això el projecte està finalitzat.

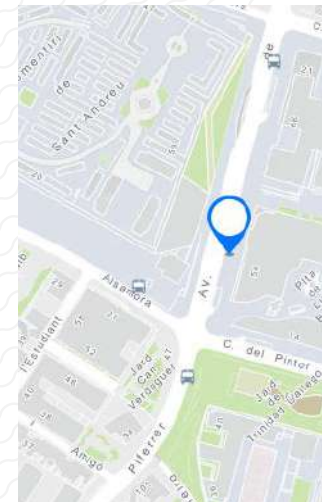Categoria**Altres equipaments****Promotor****Arxiu Històric Roquetes
Nou Barris****Executor****BIMSA/Districte (inclou
1.105.000 que gestiona
Dte)****Estat actual****Finalitzat
Setembre 2022****Pressupost inicial****1,175M€****Pressupost final****1.099.547,01€****Nombre de suports
a la fase de votació****945**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Millorem el parc de la Pegaso**Districte: **Sant Andreu** Barri: **la Sagrera****Descripció**

Millorar del parc -en concret, l'accessibilitat dels voltants i de l'interior- perquè sigui més amable i relacional, i transformar el prat en un espai compartit que combini activitats de joc infantil, exercici per a la gent gran, una zona de pícnic i una zona separada de passeig de gossos.

Observacions sobre el procés d'execució

A través d'una feina tècnica important s'aconsegueix fer encaixar totes les necessitats i demandes i fins i tot ampliar l'espai de gossos en una altra zona del parc de la que tenia prèviament assignada i que era un dels neguits que fa activar la proposta.

Categoria

**Espais verds
i horts urbans**

Promotors

AVV de La Sagrera

Executor

BIMSA

Estat actual

Finalitzat.

Desembre 2023

Pressupost inicial

585.000€


Pressupost final

525.000€

**Nombre de suports
a la fase de votació**

2.004

[Enllaç projecte](#)

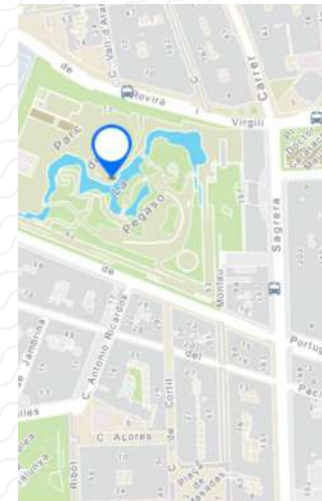ABANS**DESPRÉS**

Projecte:

Construïm el primer parc inclusiu de Barcelona als Jardins de Massana

Districte: Sant Andreu **Barri:** el Congrés i els Indians

Descripció

Millorar del parc -en concret, l'accessibilitat dels voltants i de l'interior- perquè sigui més amable i relacional, i transformar el prat en un espai compartit que combini activitats de joc infantil, exercici per a la gent gran, una zona de pícnic i una zona separada de passeig de gossos.

Observacions sobre el procés d'execució

Aquest projecte ha comportat un esforç tècnic molt gran i s'han mobilitzat molts més recursos dels previstos per donar resposta a les demandes de la promotora. Inicialment va costar d'ubicar en un lloc concret, després delimitar l'àmbit d'actuació i finalment decidir quins elements de joc i altres serveis es podien instal·lar o no.

Categoria

Espais de joc infantil

Promotors

Ana

Executor

BIMSA

Estat actual

En projecte.

Inici obra juny 2024

Pressupost inicial

525.000€

Pressupost final

1.624.771€

Nombre de suports a la fase de votació

1.564

[Enllaç projecte](#)

ABANS



PENDENT D'OBRES



Fotografia no disponible




Projecte:**Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer**Districte: **Sant Andreu** Barri: **la Sagrera****Descripció**

La millora que es planteja per als patis d'aquesta escola preveu renovar el mobiliari, oferir propostes de joc diverses i inclusives, adequar el paviment de les pistes, utilitzar materials naturals perquè les terrasses dels patis d'educació infantil siguin més amables, aconseguir espais ombrívols i instal·lar una font d'aigua.

Observacions sobre el procés d'execució

Reconduït a través de Transformem els patis. La proposta de transformem els patis no cobria les expectatives dels promotors, ja que només comptaven la pista central. Finalment es va poder reconduir i donar resposta a totes les peticions de l'AFA (els tres patis, la caseta i l'hort) ampliant el pressupost inicial previst.

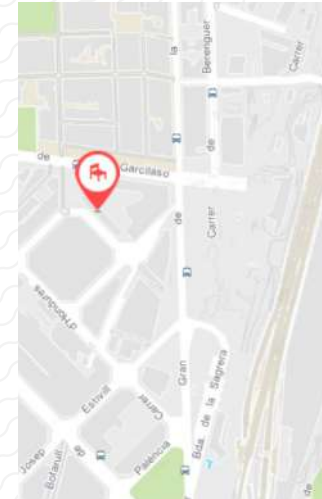
Categoria**Equipaments educatius
i entorns escolars****Promotors****Escola El Sagrer, AFA
Escola El Sagrer****Executor****CEB****Estat actual****Finalitzat.****Desembre 2023****Pressupost inicial****193.000€****Pressupost final****224.851,1€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.090**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Instal·lem aplicacions per a la subtitulació simultània d'esdeveniments en 16 equipaments del districte**Districte: **Sant Andreu****Descripció**

Instal·lar aplicacions de reconeixement de veu amb subtitulació en 16 equipaments municipals del districte de Sant Andreu. Contempla millorar l'accessibilitat de les persones amb discapacitat auditiva o baixa visió, perquè així puguin participar plenament en diverses activitats: conferències, consells de barri, cursos i tallers...

Observacions sobre el procés d'execució

Hi va haver dificultats a l'hora de fer una contractació pública força atípica dels aparells i el software corresponent. També n'hi va haver en relació a la implementació. Es van fer formacions pel personal dels equipaments perquè aprenguessin a utilitzar els dispositius. Hi ha el compromís d'ampliar la programació d'actes on s'utilitzen.

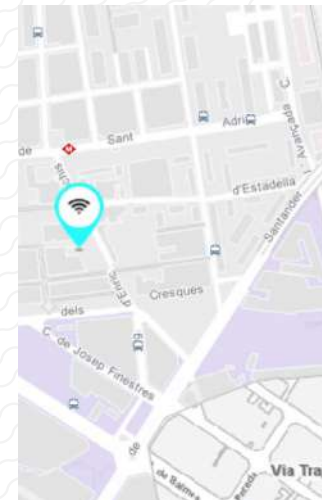
Categoria
Tecnologia**Promotors**
Maria Urbano**Executor**
Districte**Estat actual**
Finalitzat.
Desembre 2023**Pressupost inicial****50.000€****Pressupost final****50.000€****Nombre de suports
a la fase de votació****862**[Enllaç projecte](#)**FAÇANA EQUIPAMENT****DESPRÉS**

Projecte:**Pacifiquem l'entorn de l'Escola Ramon Llull**Districte: **Sant Andreu** Barri: **el Congrés i els Indians****Descripció**

Pacificar el carrer de Biscaia, des del número 439 fins al carrer d'Olesa, per tal que sigui d'ús prioritari per als vianants. Es respectarà la zona de càrrega i descàrrega del supermercat i es deixarà lliure el gual que hi ha al costat de l'escola.

Observacions sobre el procés d'execució

Projecte en el marc de Protegim les escoles. Es va anar més enllà de la proposta i es va pacificar un tros del carrer Matanzas (ja que hi ha un altre edifici de l'escola) i es van desplaçar contenidors. Es van fer ajustaments amb un supermercat, una empresa missatgeria i unes terrasses per qüestions d'accés dels serveis.

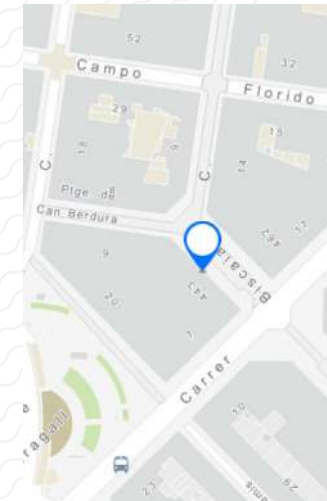Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors****Escola Ramon Llull i AFA
Escola Ramon Llull****Executor****BIMSA****Estat actual****Finalitzat.****Desembre 2023****Pressupost inicial****85.000€****Pressupost final****85.000€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.038**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Pacifiquem una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar**Districte: **Sant Andreu** Barri: **Sant Andreu de Palomar****Descripció**


Pacificar una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar amb l'objectiu de reduir-hi el trànsit, augmentar la seguretat dels veïns i veïnes, aportar benestar a la gent del barri i impulsar el comerç local.

Categoria**Pacificació o remodelació de carrers****Promotors****Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar (sessió extraordinària)****Executor****BIMSA****Pressupost inicial****400.000€****Pressupost final****200.009€****Observacions sobre el procés d'execució**

Molta dificultat per concretar el projecte. Aprofitant l'estudi del pla de mobilitat de la pacificació del nucli antic de Sant Andreu, es va mantenir una reunió on es va acordar que amb el pressupost s'elaborarien els projectes executius de cinc carrers (tres avantprojectes, dos executius: Sant Narcís, Hipòlit, reurbanització Sant Adrià i Otger, c. Marqués de Santillana, C. Cuba, Riera de Sant Andreu entre Gran de Sant Andreu i Bascònia) i s'executaran durant el següent mandat.

Estat actual**En projecte.****Inici obra agost 2025.****Nombre de suports a la fase de votació****1.133**[Enllaç projecte](#)**ABANS****PENDENT D'OBRES**

Fotografia no disponible

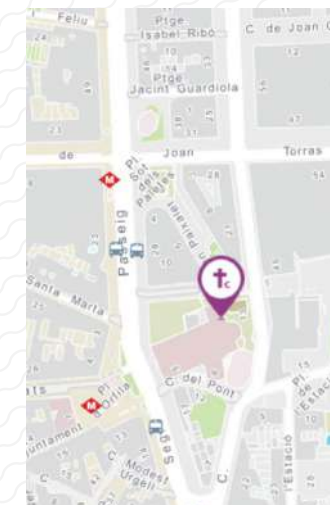

Projecte:**Reformem la seu de l'entitat
T'acompanyem**Districte: **Sant Andreu** Barri: **Navas****Descripció**

Millorar la instal·lació elèctrica del local i dotar-lo d'aire condicionat. La seu d'aquesta associació presenta una ventilació molt deficient.

Categoria**Equipaments de
proximitat****Promotors****T'acompanyem****Executor****Districte**


Pressupost inicial

50.000€

Pressupost final

50.000€**Observacions sobre el procés d'execució**

Es desenvolupa el projecte segons l'establert.

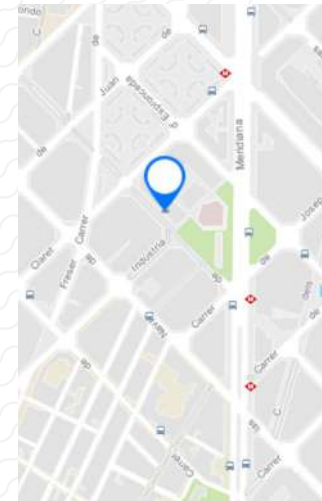Estat actual**Finalitzat.****Desembre 2023**Nombre de suports
a la fase de votació**989**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Renovem el paviment del passeig de Fabra i Puig de Fabra i Puig**Districte: **Sant Andreu** Barri: **Sant Andreu de Palomar****Descripció**

Renovar el paviment del passeig de Fabra i Puig; en concret, el tram central, des del carrer Gran de Sant Andreu fins al carrer de Concepción Arenal

Categoria**Millora de l'espai públic****Promotors**

Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar
(sessió extraordinària)

Executor**BIMSA****Observacions sobre el procés d'execució**

Es va desenvolupar amb relativa facilitat. L'únic obstacle que va sorgir feia referència a la dificultat de col·locar els vetlladors de les terrasses.


Estat actual**Finalitzat.****Desembre 2023****Pressupost inicial****910.000€****Pressupost final****1.022.738€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.083**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Renovem la vorera de l'avinguda Meridiana davant del CAP Sant Andreu**Districte: **Sant Andreu** Barri: **Sant Andreu de Palomar****Descripció**

Ampliar i renovar la vorera de l'avinguda Meridiana, concretament el tram comprès entre els números 418 i 424, situat davant del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Sant Andreu, per evitar caigudes, facilitar la mobilitat de totes les persones, i millorar l'enllumenat d'aquest tram o de tot el carrer.

Observacions sobre el procés d'execució

Les persones promotores del prop CAP van quedar molt satisfetes amb la reurbanització de la vorera. A posteriori s'ha observat que potser caldria haver ampliat els àmbits d'actuació de la transformació. I de fet hi ha el compromís futur de reprendre-ho.

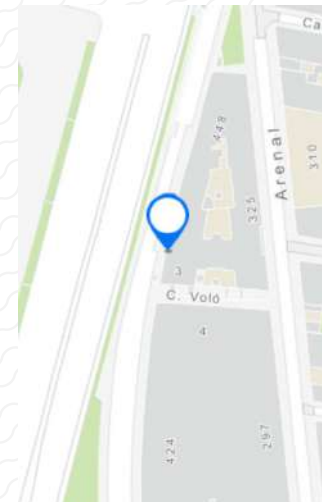Categoria**Millora de l'espai públic****Promotors****Debat sectorial de salut, cures i envelliment.****Executor****BIMSA****Estat actual****Finalitzat.****Desembre 2023****Pressupost inicial****175.000€****Pressupost final****158.836€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.382**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou**Districte: **Sant Martí** Barri: **el Parc i la Llacuna del Poblenou****Descripció**

Plantegem l'execució de diverses mesures, tant per millorar la seguretat viària com per crear espais multifuncionals destinats a l'ús esportiu i cultural de les famílies i del veïnat.

Categoria

Pacificació o remodelació de carrers

Promotors

Col·lectiu Superilla Poblenou

Executor

BIMSA

Pressupost inicial

365.000€

Pressupost final

423.147€Nombre de suports
a la fase de votació**1.645****Observacions sobre el procés d'execució**


A l'inici hi va haver dificultats per arribar a acords sobre la transformació que calia aconseguir amb les obres. Els promotors demanaven un espai semblant a una pista esportiva i un lloc tipus "grada" on poder fer concerts o actes semblants i finalment es va arribar a un acord per a poder incloure aquesta demanda amb un tipus d'elements no fixes.

Estat actual

En projecte. Previsió inici obres gener 2025

ABANS**PENDENT D'OBRES**

Fotografia no disponible

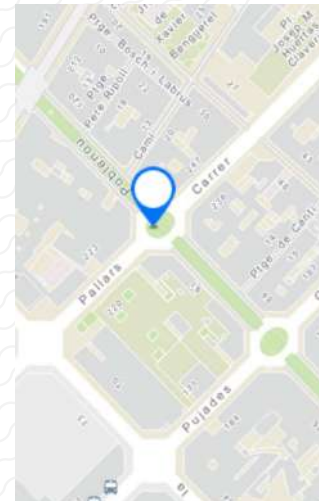[Enllaç projecte](#)

Projecte:**Construïm una cuina a l'Escola La Pau**Districte: **Sant Martí** Barri: **la Verneda i la Pau****Descripció**

Proposem construir una cuina a l'Escola La Pau perquè l'alumnat pugui prendre un àpat digne, cuinat i preparat el mateix dia i que compleixi les recomanacions nutricionals. Aquesta cuina donaria resposta a unes necessitats que el barri, l'alumnat i les seves famílies fa anys que reivindiquen.

Observacions sobre el procés d'execució

Es va desenvolupar amb relativa facilitat. L'únic obstacle que va sorgir feia referència a la dificultat de col·locar els vetlladors de les terrasses.

Categoria

Equipaments educatius i entorns escolars

Promotor

AMPA i equip directiu de l'Escola La Pau


Executor

CEB

Estat actual

Finalitzat.

Desembre 2022

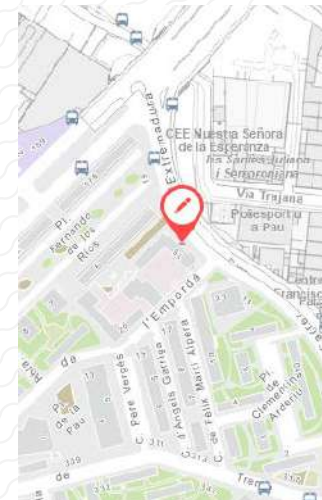Pressupost inicial**400.000€****Pressupost final****444.548,87€****Nombre de suports
a la fase de votació****1.804**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Convertim el pati de l'Escola La Farigola en un pulmó verd del barri**Districte: **Sant Martí** Barri: **el Clot****Descripció**

Plantegem obrir al barri el pati de l'Escola La Farigola del Clot i fer que esdevingui un pulmó verd per als nostres infants. Per això, cal adaptar-lo a les noves demandes pedagògiques i climàtiques incorporant-hi espais de joc, vegetació, zones ombrívols i aigua.

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte es va desenvolupar segons el calendari inicial. Amb molta il·lusió i ganes per part dels promotors i comunitat de l'escola. Es va fer inauguració.

Categoria**Equipaments educatius i entorns escolars****Promotors**

AFA Escola La Farigola del Clot, Escola La Farigola del Clot i Xino-Xano Associació de Lleure

Executor**CEB****Estat actual****Finalitzat.****Desembre 2023****Pressupost inicial****350.000€****Pressupost final****340.277,62€****Nombre de suports a la fase de votació****2.430**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Projecte:**Fem possible el nou model d'hort urbà al Clot**Districte: **Sant Martí** Barri: **el Clot****Descripció**


Plantegem impulsar un hort urbà comunitari, col·laboratiu, inclusiu i innovador, pensat perquè respongui a les necessitats de la comunitat i fonamentat en l'educació en agricultura i en biodiversitat urbana, per a ús del veïnat, de les entitats que hi vulguin participar i del Casal de Gent Gran Joan Casanelles.

Observacions sobre el procés d'execució

El projecte no s'executarà degut a que el terreny està qualificat com a habitatge social, vial i espais lliures. Aquesta informació ja es tenia quan es va seleccionar aquest projecte, però es va decidir fer-ho donat que no hi havia previsió de construir habitatges a curt-mig termini. Amb el canvi de govern això ha canviat i el projecte ha caigut, generant frustració i malestar entre veïns i entitats que han estat esperant molt de temps. També cal dir que durant la redacció del projecte executiu va haver-hi problemes amb l'estudi d'arquitectes encarregat del projecte. Fins a tal punt que, a la meitat del procés, va abandonar i es va haver de tornar a licitar, generant molt d'endarreriment.

Categoria**Espais verds i horts urbans****Promotors****Dovella Respira****Executor****BIMSA****Estat actual****No executat****Pressupost inicial****725.000€****Pressupost final****236.850€****Nombre de suports a la fase de votació****2.011**[Enllaç projecte](#)**ABANS****DESPRÉS**

Fotografia no disponible



Projecte:

Fem una superilla al Camp de l'Arpa del Clot

Districte: Sant Martí **Barri:** el Camp de l'Arpa del Clot

Descripció

Plantegem pacificar el nucli històric del Camp de l'Arpa creant-hi una «illa de convivència» amb carrers que donin preferència als vianants. També contemplem augmentar-ne l'espai públic, el verd urbà i les zones d'estada, així com reduir-ne la contaminació atmosfèrica i acústica, i impulsar-hi el comerç de proximitat.

Observacions sobre el procés d'execució

L'inici i finalització de les obres ha patit endarreriments. Hi ha hagut molt bona sintonia entre els arquitectes redactors i el grup promotor. Molt receptius i facilitadors a l'hora d'incloure les peticions que tenien els promotors.

Categoria

Pacificació o remodelació de carrers

Promotors

Dovella Respira

Executor

BIMSA

Estat actual

**En obres. Previsió final
setembre 2024**

Pressupost inicial

390.000€

Pressupost final

405.760€

**Nombre de suports
a la fase de votació**

2.205

[Enllaç projecte](#)



Projecte:**Pacifiquem els entorns de l'Escola Pere IV i de l'Institut Quatre Cantons**Districte: **Sant Martí** Barri: **el Poblenou****Descripció**

Plantegem millorar les zones properes a l'Escola Pere IV i a l'Institut Quatre Cantons; concretament, el carrer de Bilbao i el Camí Antic de València. Per això, contemplem diverses intervencions de pacificació, de creació de zones verdes i d'espais per als vianants, i de millora de l'enllumenat.

Observacions sobre el procés d'execució

Hi ha hagut endarreriments a l'inici i finalització de les obres.

Categoria

Equipaments educatius i entorns escolars

Promotors

AMPA Pere IV i AFA Quatre Cantons

Executor

BIMSA

Estat actual

Finalitzat.

Desembre 2023

Pressupost inicial

250.000€


Pressupost final

145.339€

Nombre de suports a la fase de votació

1.671

[Enllaç projecte](#)

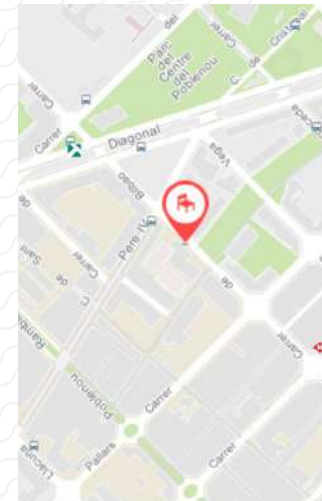ABANS**DESPRÉS**

Projecte:
Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris

Districte: Sant Martí **Barri:** Provençals del Poblenou

Descripció

Plantegem reformar l'interior del casal de joves, situat en una nau annexa de Can Ricart, per revitalitzar aquest espai històric del Poblenou, ara abandonat. La reforma preveu ampliar el casal per impartir-hi tallers d'activitats i habilitar-hi un espai per a l'agrupament escolta.

Observacions sobre el procés d'execució

Encara no ha començat l'execució. El procés ha estat molt lent, primer per la dificultat per arribar a acords i després per la presència a l'edifici de restes arquitectòniques amb interès arqueològic. El departament de Patrimoni de la Generalitat havia de donar el seu consentiment i això ha requerit temps. Per part de l'estudi d'arquitectes, bona sintonia amb els promotors.

Categoria
Equipaments de proximitat

Promotors
Observatori del barri del Poblenou, La Xemeneia, Coordinadora d'Entitats Juvenils del Poblenou, Agrupament Escolta L'Avenç i Taula Eix Pere IV

Executor
BIMSA

Estat actual
En projecte.
Inici obra agost 2024

Pressupost inicial
1.000.000€

Pressupost final
1.002.489€

Nombre de suports a la fase de votació
1.859


[Enllaç projecte](#)

FAÇANA EQUIPAMENT



PENDENT D'OBRES

Fotografia no disponible

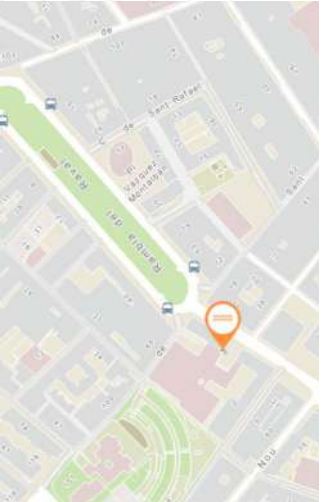



Ajuntament de
Barcelona
