

Comissió de seguiment de Pressupostos participatius 2020-2023

Districte de Sant Andreu

**DECIDIM.
BARCELONA**





1. Estat dels projectes - Octubre 2022

PERCENTATGE D'EXECUCIÓ

Obres finalitzades

- Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer
- Renovem el paviment del passeig de Fabra i Puig
- Reformem la seu de l'entitat T'acompanyem
- Renovem la vorera del CAP Sant Andreu 100%
- Pacifiquem l'entorn de l'Escola Ramon Llull
- Millorem el parc de la Pegaso
- Instal·lem aplic. subtitulació simultània 16 equipaments

Obres iniciades

- - 50-95%

Obres licitades

- Construïm el primer parc inclusiu als Jardins de Massana 35-50%

Redacció projecte final


- Pacifiquem una zona del casc antic de St Andreu Palomar 30-35%

Participació - Redacció inicial avantprojecte


0-30%



2. Calendari de previsió finalització dels projectes

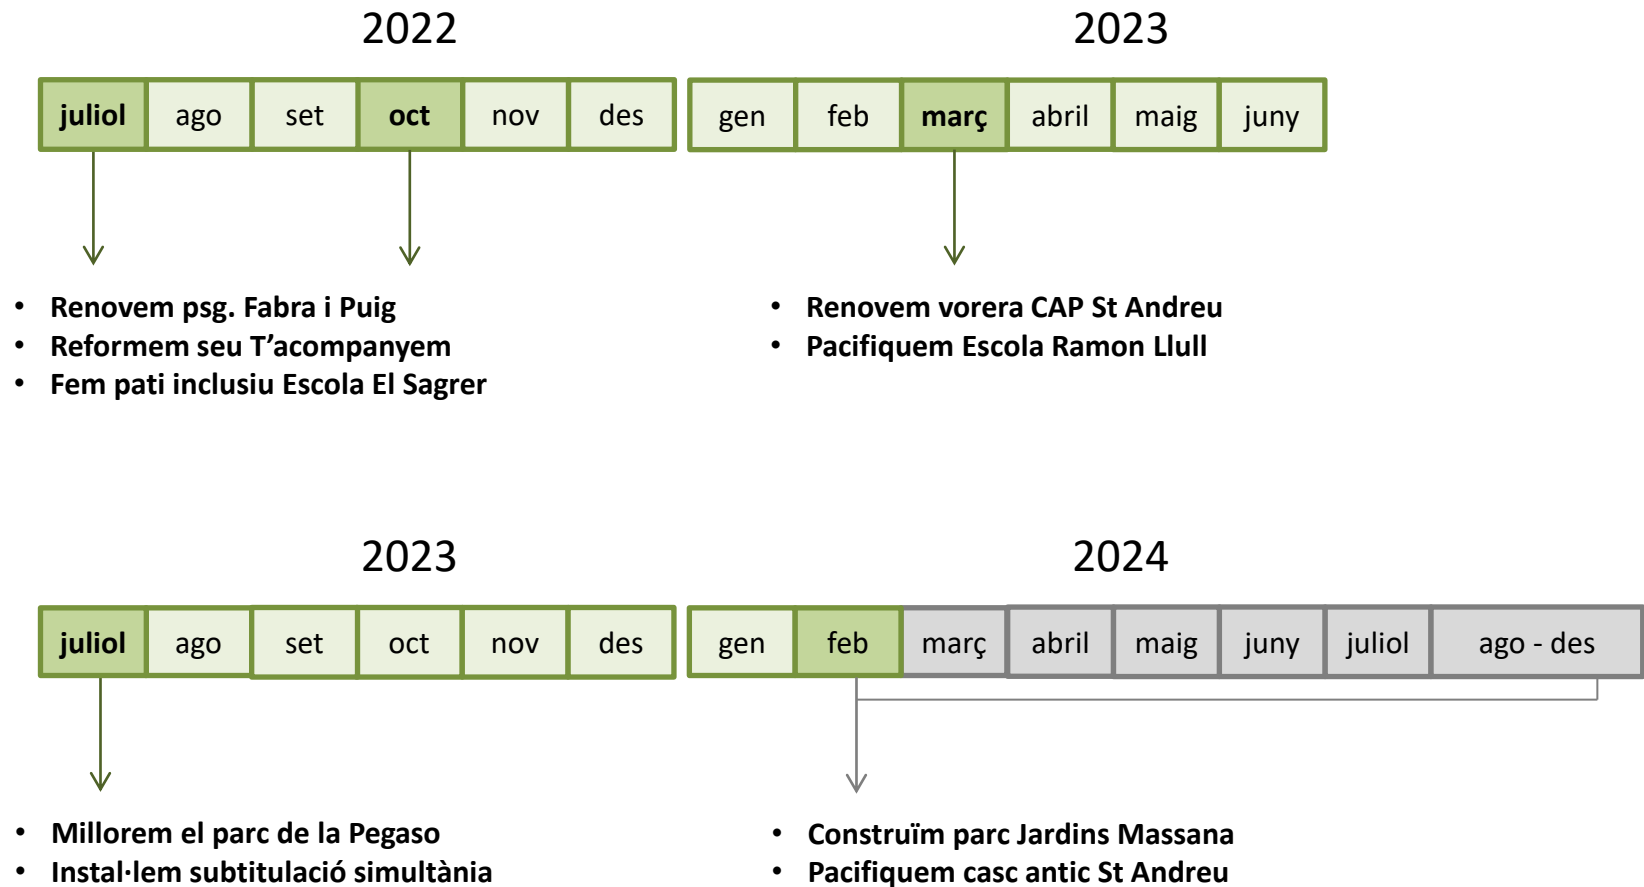

Projecte 1: “Millorem el parc de la Pegaso”



Import	585.000 €
Finalització d'obres	Agost 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Ecologia Urbana, Parcs i Jardins.
Participació	Validació projecte amb promotores
Inclou	- Millores accessibilitat al parc - Muntanyeta - Pradera: usos lúdics compartits i joc infantil (taules, tirolina accessible, cautxú) - Ampliació espai gossos (a l'altra zona del parc).



Projecte 2: “Construïm el primer parc inclusiu de Barcelona als Jardins de Massana”



Import	*985.000 €
Inici i finalització d'obres	Maig 2024 (durada 8 mesos)
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Ecologia Urbana, Parcs i Jardins, Institut Infància, IMPD.
Participació	Validació projecte amb promotores.
Inclou	- Distribució d'usos, tipologia d'elements de joc, i concrecions finals.

**Augment de l'import a conseqüència de l'augment del preu dels materials i de les certificacions dels elements de joc a instal·lar.*

Projecte 3: “Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant del CAP Sant Andreu”



Import	175.000 €
Finalització d'obres	Gener 2023
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Mobilitat
Participació	Validació projecte amb promotores
Inclou	- Ampliació de la vorera. - Condicionaments de l'estacionament PMR, terrassa en calçada del bar, marquesina parada de l'autobús i desnivell vorera i entrada secundària CAP.


Projecte 4: “Pacifiquem una zona del casc antic de Sant Andreu de Palomar”



Import	160.000 €
Inici i finalització d'obres	2024-2025
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte, Mobilitat
Participació	Sessions obertes de participació ciutadana. Validació del projecte amb promotor, AVVs i comunitats de veïnes.
Inclou	- Redacció projecte executiu: ☐ c. Sant Adrià i c. Otger ☐ c. Marquès de Santillana i c. Cuba - Redacció avantprojecte: ☐ Riera de Sant Andreu (c. Gran i c. Bascònia) ☐ c. Sant Hipòlit ☐ c. Sant Narcís




Projecte 5: “Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer”



Import	193.000 €
Finalització d'obres	Octubre 2022
Òrgan executor	CEM
Òrgans municipals implicats	CEM, Districte
Participació	Validació projecte amb promotores
Inclou	- Pista central i descans - Pati P3, pati P4-P5, caseta i hort

Projecte 6: “Renovem el paviment del psg de Fabra i Puig”



Import	910.000 €
Finalització d'obres	Juliol 2022
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Districte
Participació	Validat projecte amb promotores
Inclou	- Continuïtat amb 1r tram. - Revisió material pavimentació.


Projecte 7: “Pacifiquem l’entorn de l’Escola Ramon Llull”



Import	85.000 €
Finalització d’obres	Desembre 2022
Òrgan executor	BIMSA
Òrgans municipals implicats	Ecologia Urbana, Mobilitat
Participació	Validació projecte amb promotores
Inclou	- Incorpora trasllat contenidors i trànsit rodat. - Per concretar ubicació terrasses restauració.



Projecte 8: “Reformem la seu de l'entitat T'acompanyem”



Import	50.000 €
Finalització d'obres	Juliol 2022
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	Districte
Participació	Validació amb promotores
Inclou	- Sistema elèctric i clima. - Manteniment i millora infraestructures.

Projecte 9: “Instal·lem aplicacions de subtitulació simultània d’esdeveniments en 16 equipaments districte”



Import	50.000 €
Finalització d’obres	Juliol 2023
Òrgan executor	Districte
Òrgans municipals implicats	Districte, IMPD, IMI
Participació	Validació amb promotores
Inclou	- Equipar streaming a 10 equipaments - Complementar equip a 10 equipaments - Equipar completament 6 equipaments



3. Enquestes de valoració

Valorar la fase d'execució del vostre projecte. El període d'execució dels projectes de pressupostos participatius no és uniforme.

Enllaç: <https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577>

OPCIÓ A: EXECUTAT COMPLETAMENT

- Millorem el parc de la Pegaso
- Fem un pati més inclusiu a l'Escola El Sagrer
- Renovem la vorera del CAP Sant Andreu
- Renovem el paviment del passeig de Fabra i Puig
- Pacifiquem l'entorn de l'Escola Ramon Llull
- Reformem la seu de l'entitat T'acompanyem
- Instal·lem aplic. subtitulació simultània 16 equipaments

OPCIÓ B: NO EXECUTAT COMPLETAMENT (PROJECTE APROVAT/LICITAT)

- Construïm el primer parc inclusiu als Jardins de Massana
- Pacifiquem una zona del casc antic de St Andreu de Palomar

*La durada aproximada de resposta és d'uns **10 minuts**. El registre de les teves respostes no recollirà cap dada personal.*



4. Recull d'aportacions i compromisos

Millorem el parc de la Pegaso

-

Construïm parc Jardins Massana

-

Renovem la vorera de l'av. Meridiana davant del CAP Sant Andreu

-

Pacifiquem casc antic St Andreu

-

Instal·lem subtitulació simultània

-



**Ajuntament
de Barcelona**

