

# Estació de Sants

## Comissió de Seguiment




07 d'octubre de 2025


# Entorns estació Sants


- 1. Àmbits d'actuació.*
- 2. Mobilitat actual a l'entorn*
- 3. Nou encaix de les actuacions i properes fases Municipals*
- 4. Seguiment de les obres d'Adif: Fase 1*

# 01

## Àmbits d'actuació

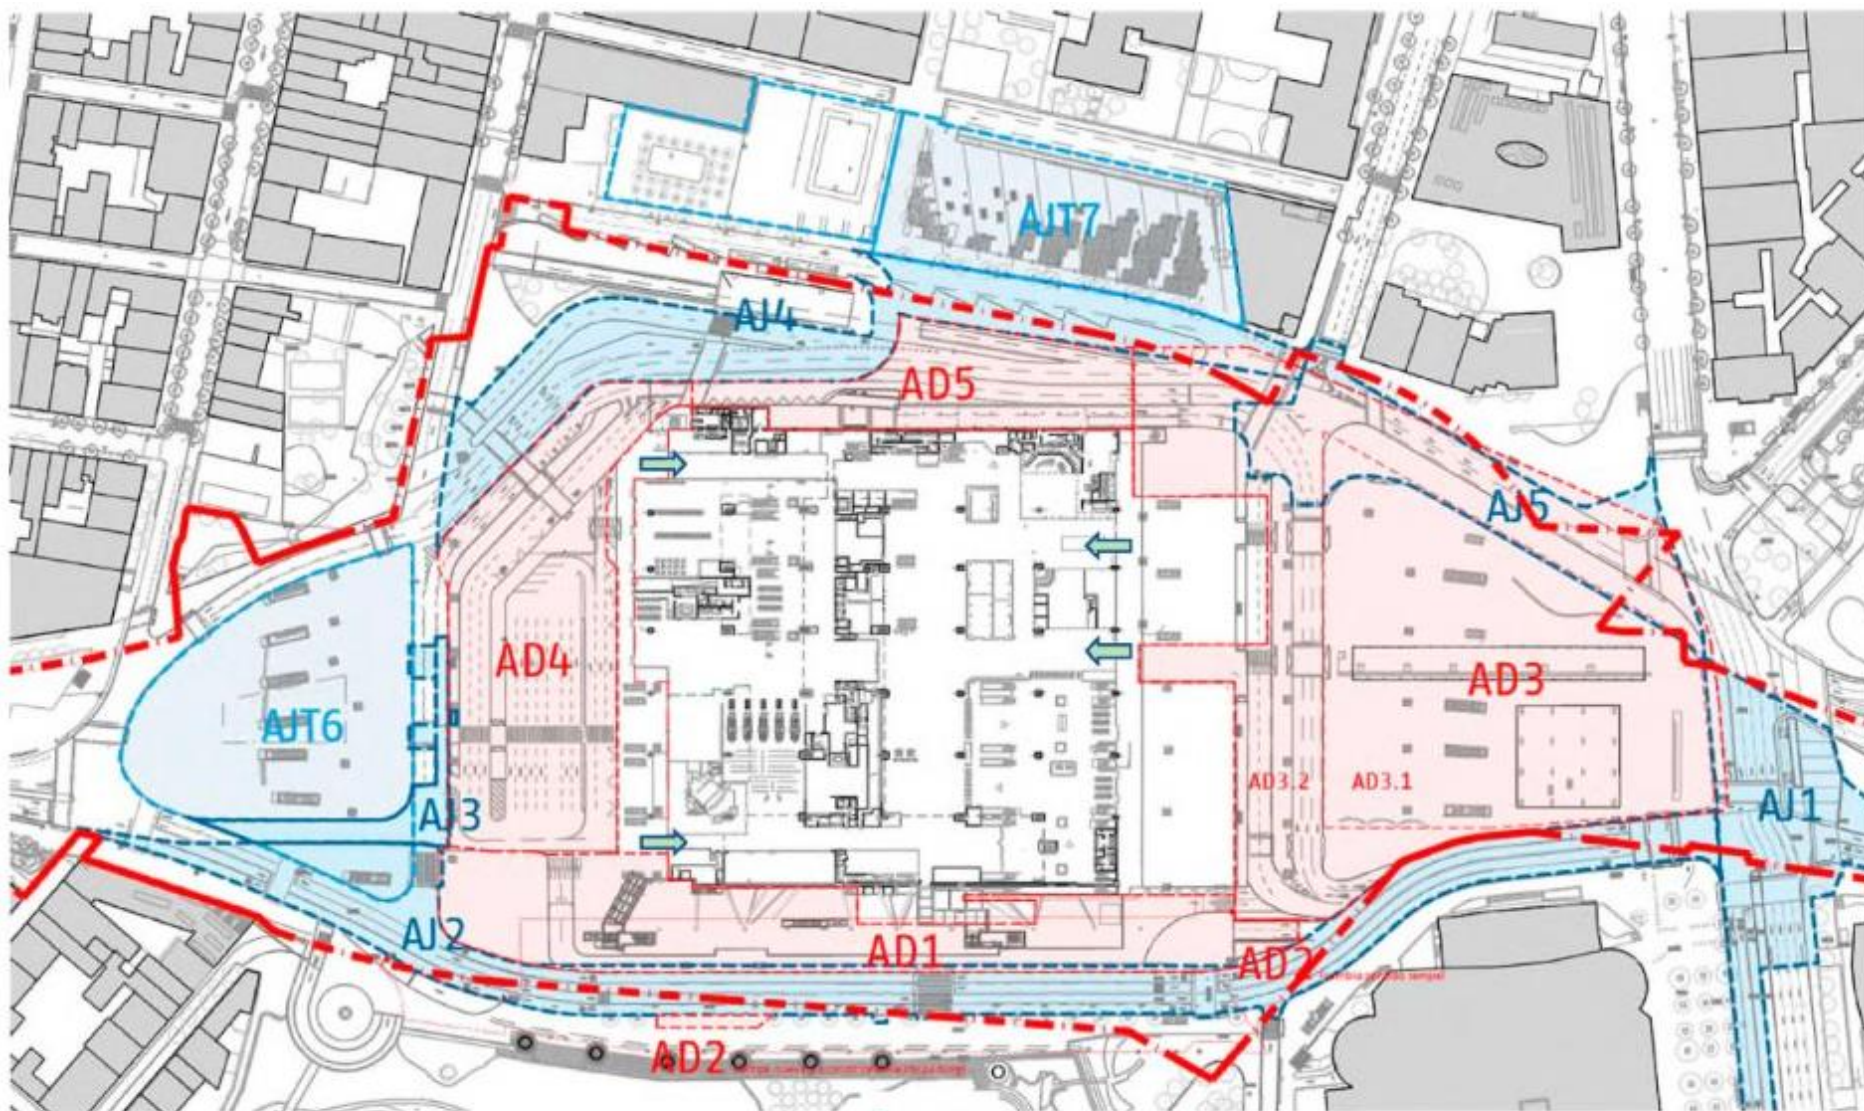

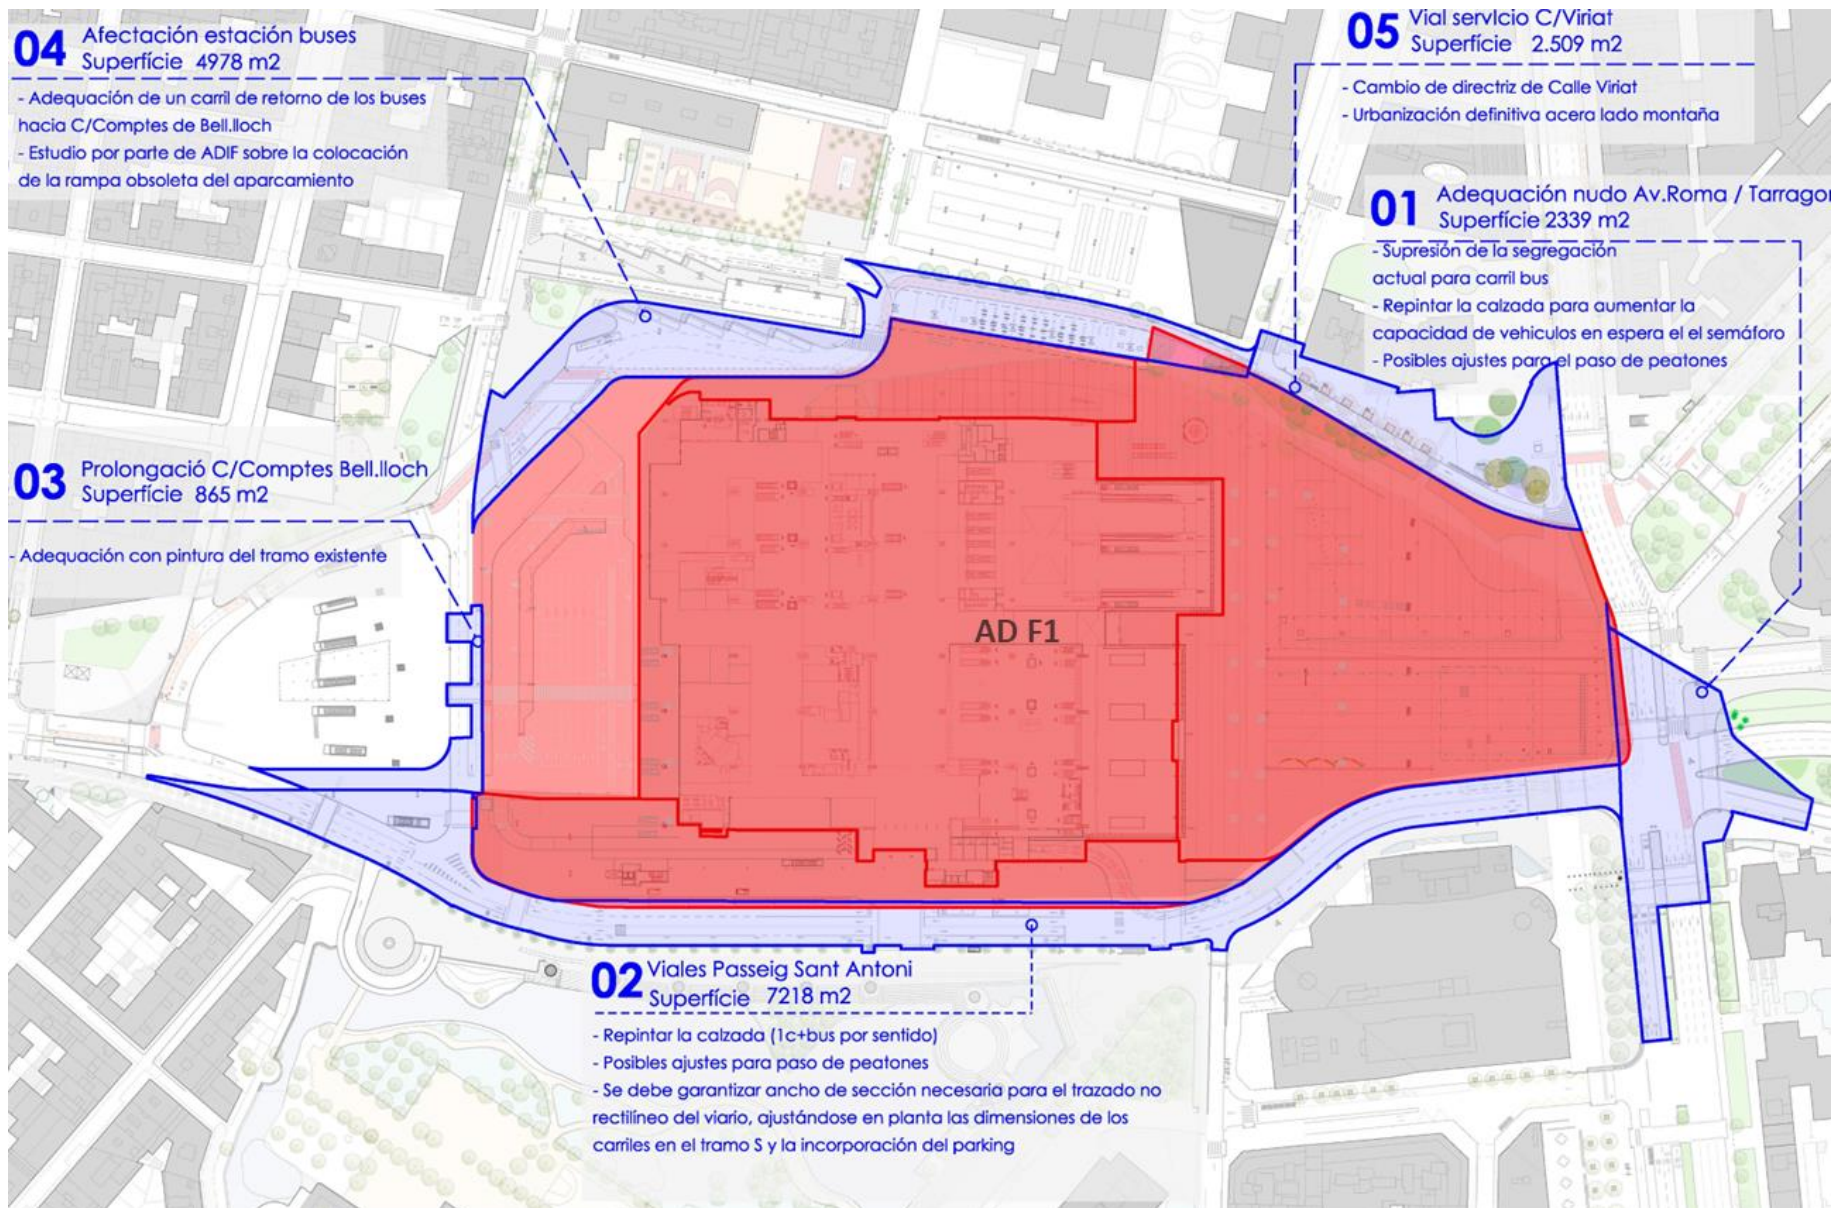

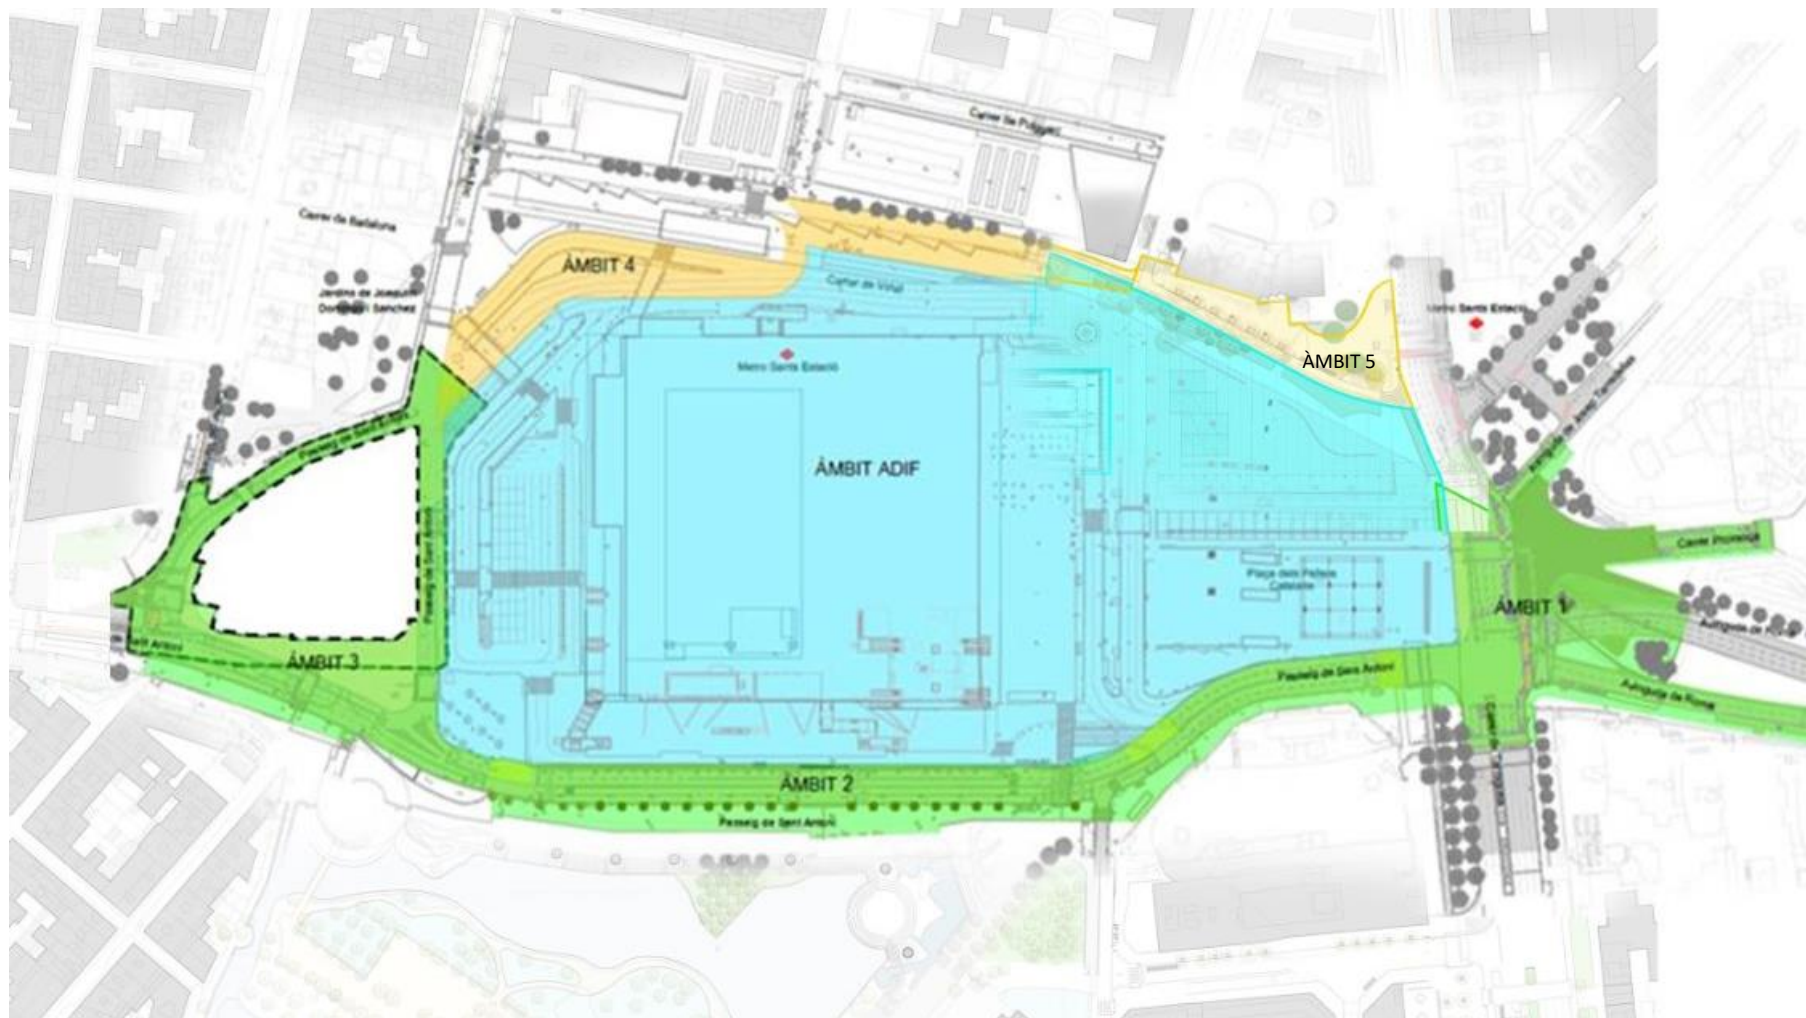


## AJ. BCN/BIMSA (EN PROJETE)

### ADIF (FASE 1 EN OBRES)




**AJ. BCN/BIMSA (OBRA FINALITZADA 21/2/2025)**

## ADEQUACIÓ DE LA MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS PRÈVIA A FASE 1 D'ADIF

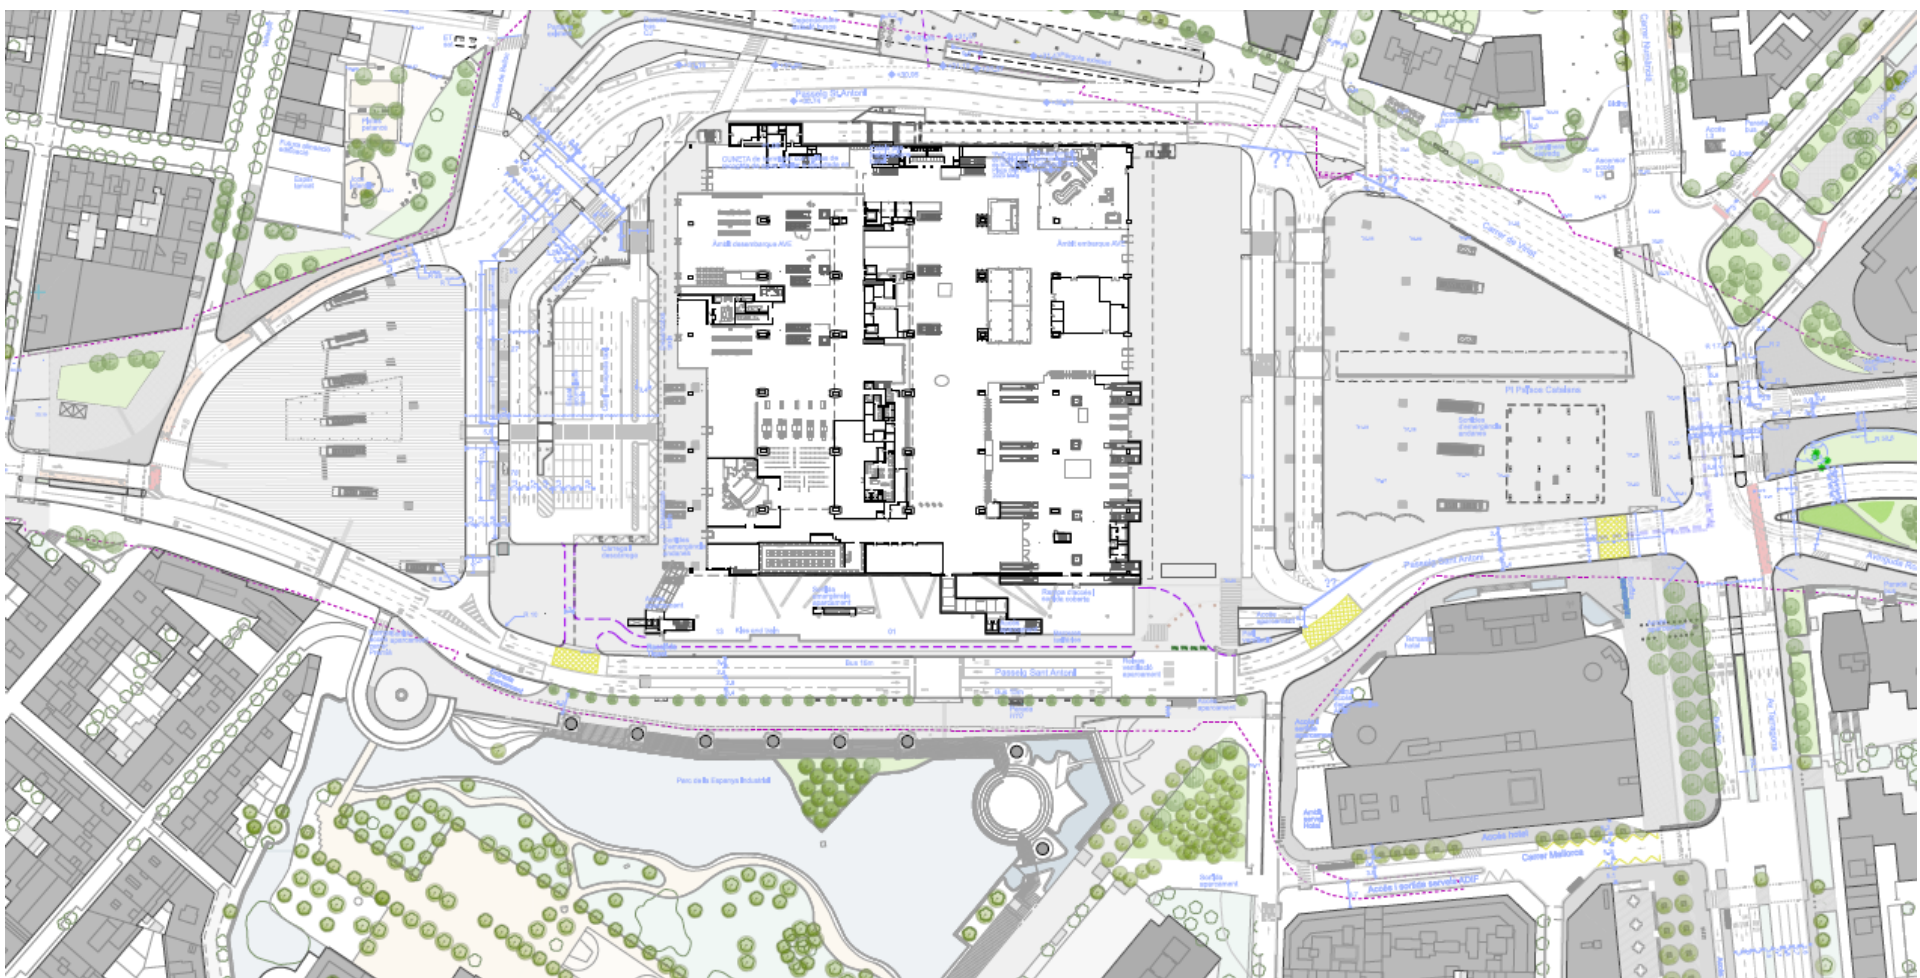


## MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ESTAT FI OBRES ÀMBITS 1, 2 I 3.-

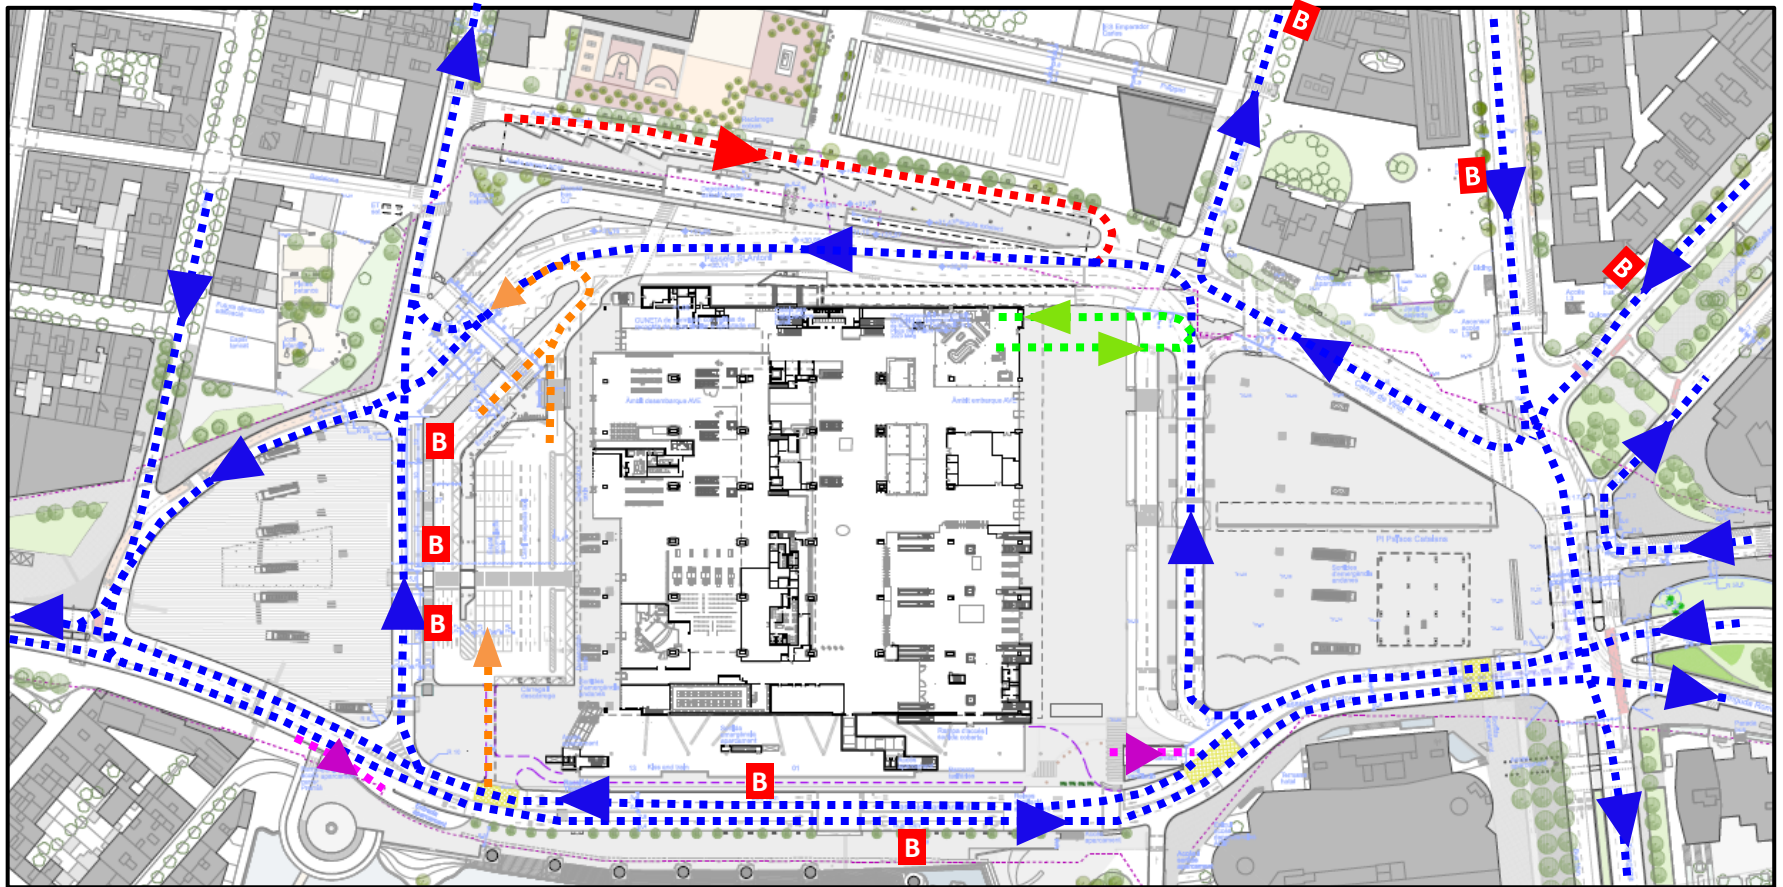

- Flux de vehicles entre costats Llobregat i Besós a través del vial mar
- Accés Estació autobusos: Entrada per Comtes Bell-Lloc i Sortida per vial muntanya
- Accés aparcament teulada Estació: Entrada i Sortida per plaça PC
- Accés aparcament Taxis: Entrada per vial mar i Sortida per vial muntanya
- Accés aparcament soterrat Estació: No es modifica


- Vehicles particulars
- Autocars. Estació autobusos
- Accessos aparcament teulada Estació
- Taxis. Accessos aparcament Taxis
- Accessos aparcament soterrat Estació

**MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ESTAT BUSOS FI OBRES ÀMBITS 1, 2 I 3.-**

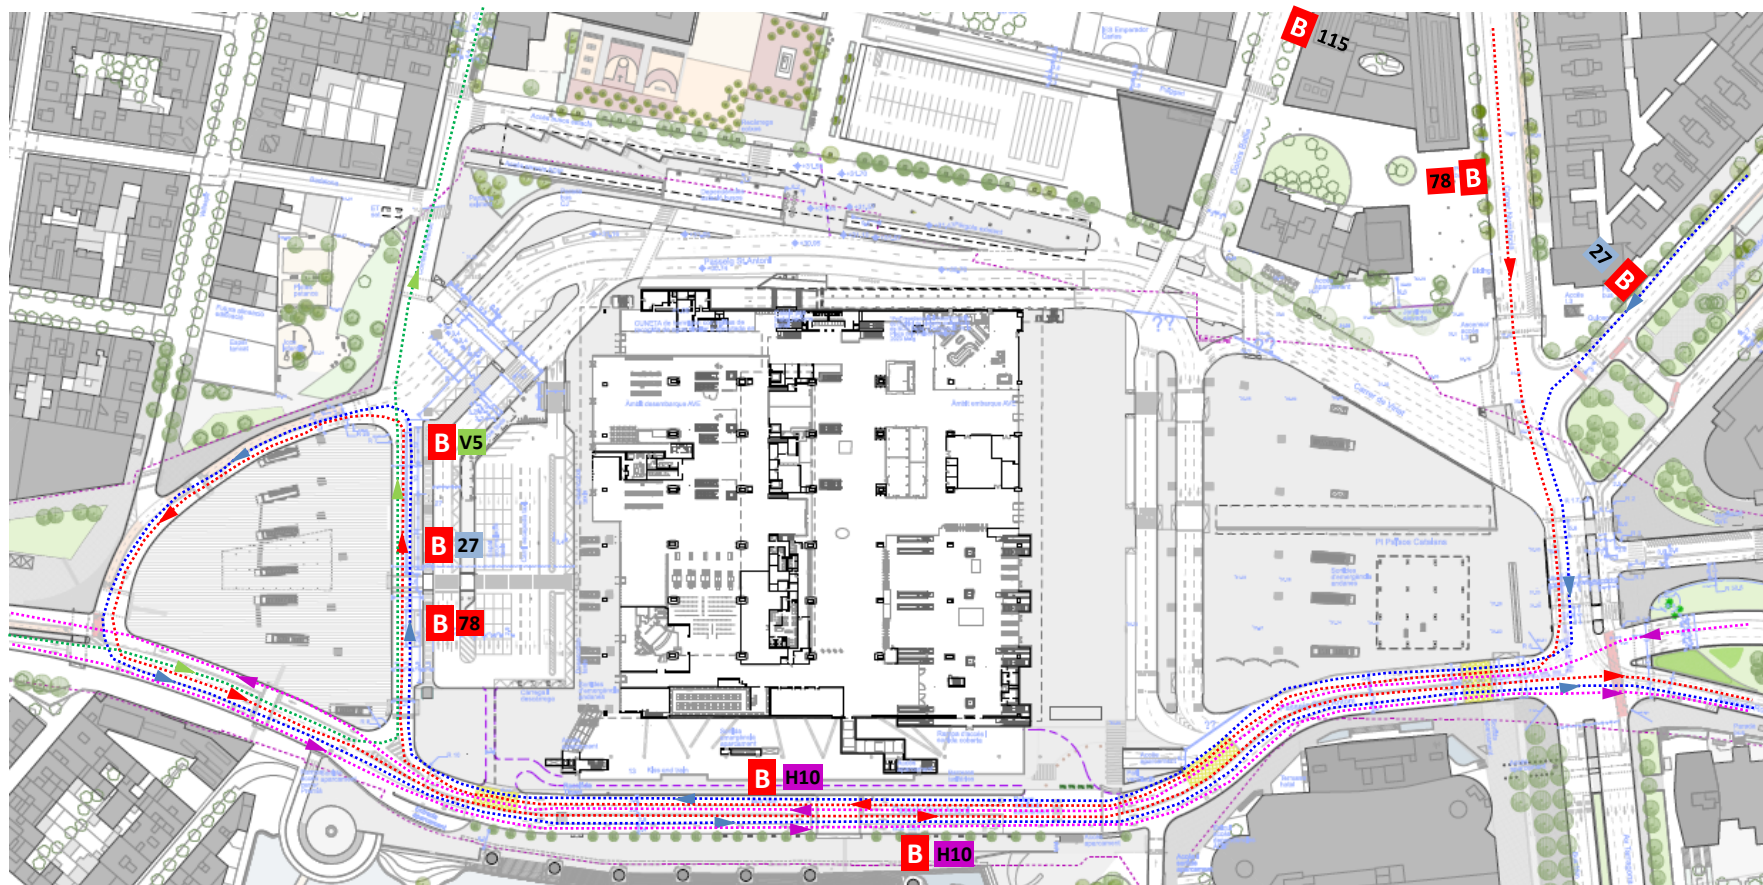

- ■ ■ ■ ■ 27
- ■ ■ ■ ■ 78
- ■ ■ ■ ■ V5
- ■ ■ ■ ■ H10


**MOBILITAT ALS ENTORNS DE L'ESTACIÓ DE SANTS. ESTAT BUSOS FI OBRES ÀMBITS 1, 2 I 3.-**

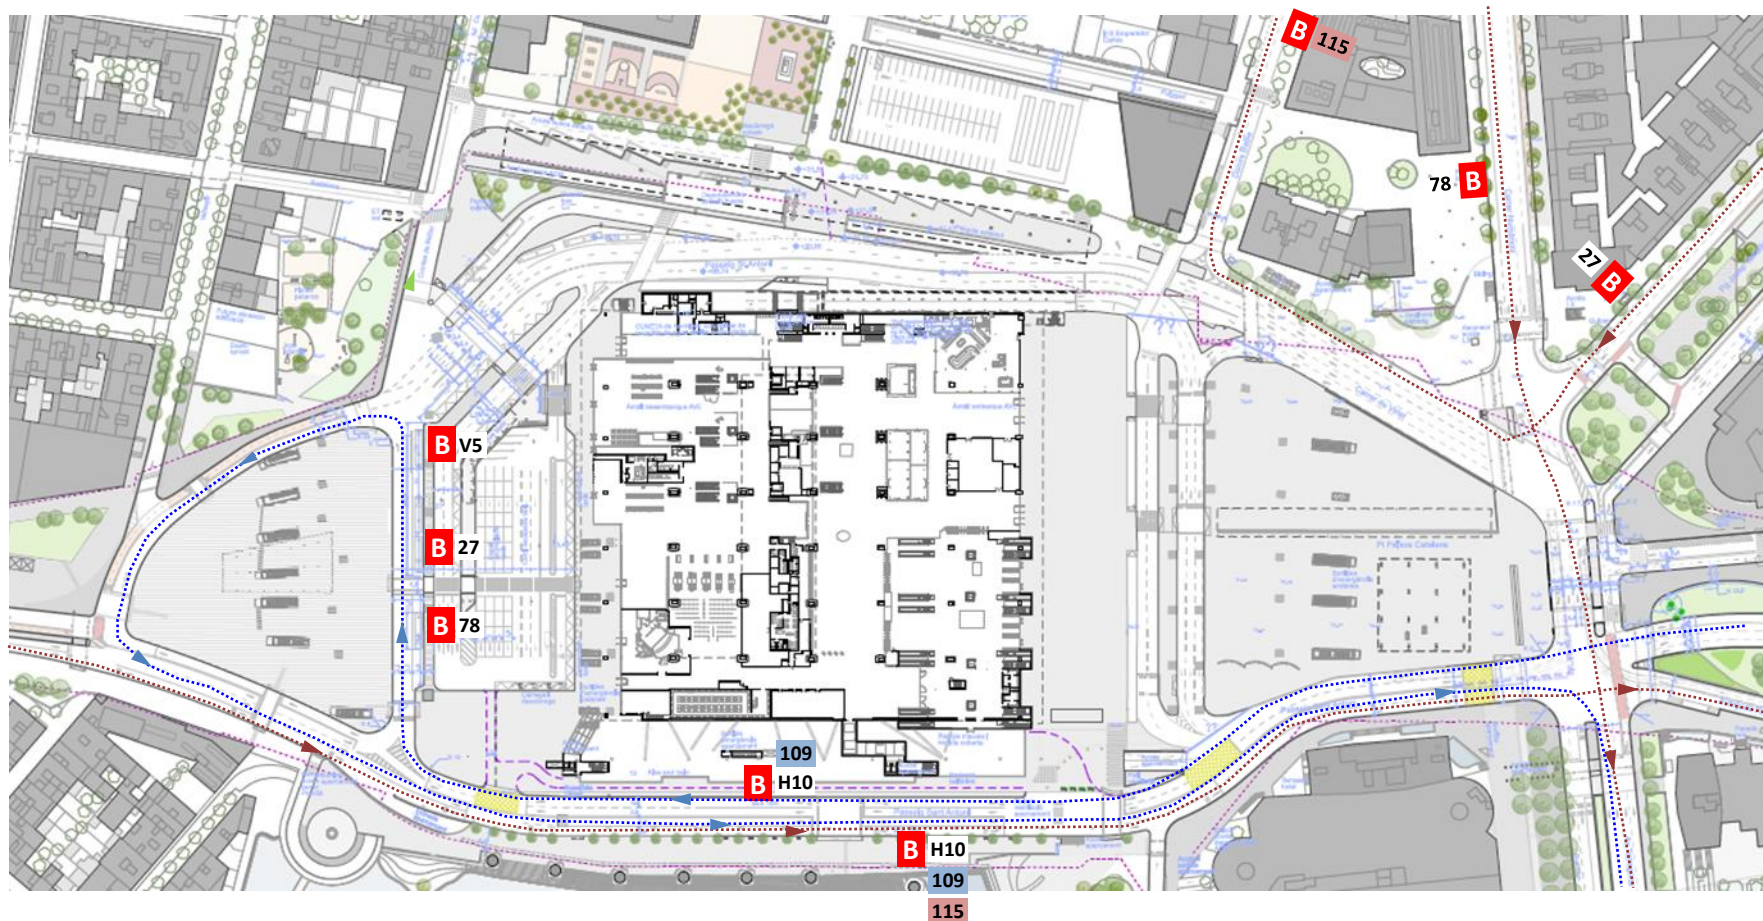



■■■■■ 109  
■■■■■ 115

# 03

**Nou encaix de les actuacions i  
properes fases Municipals**

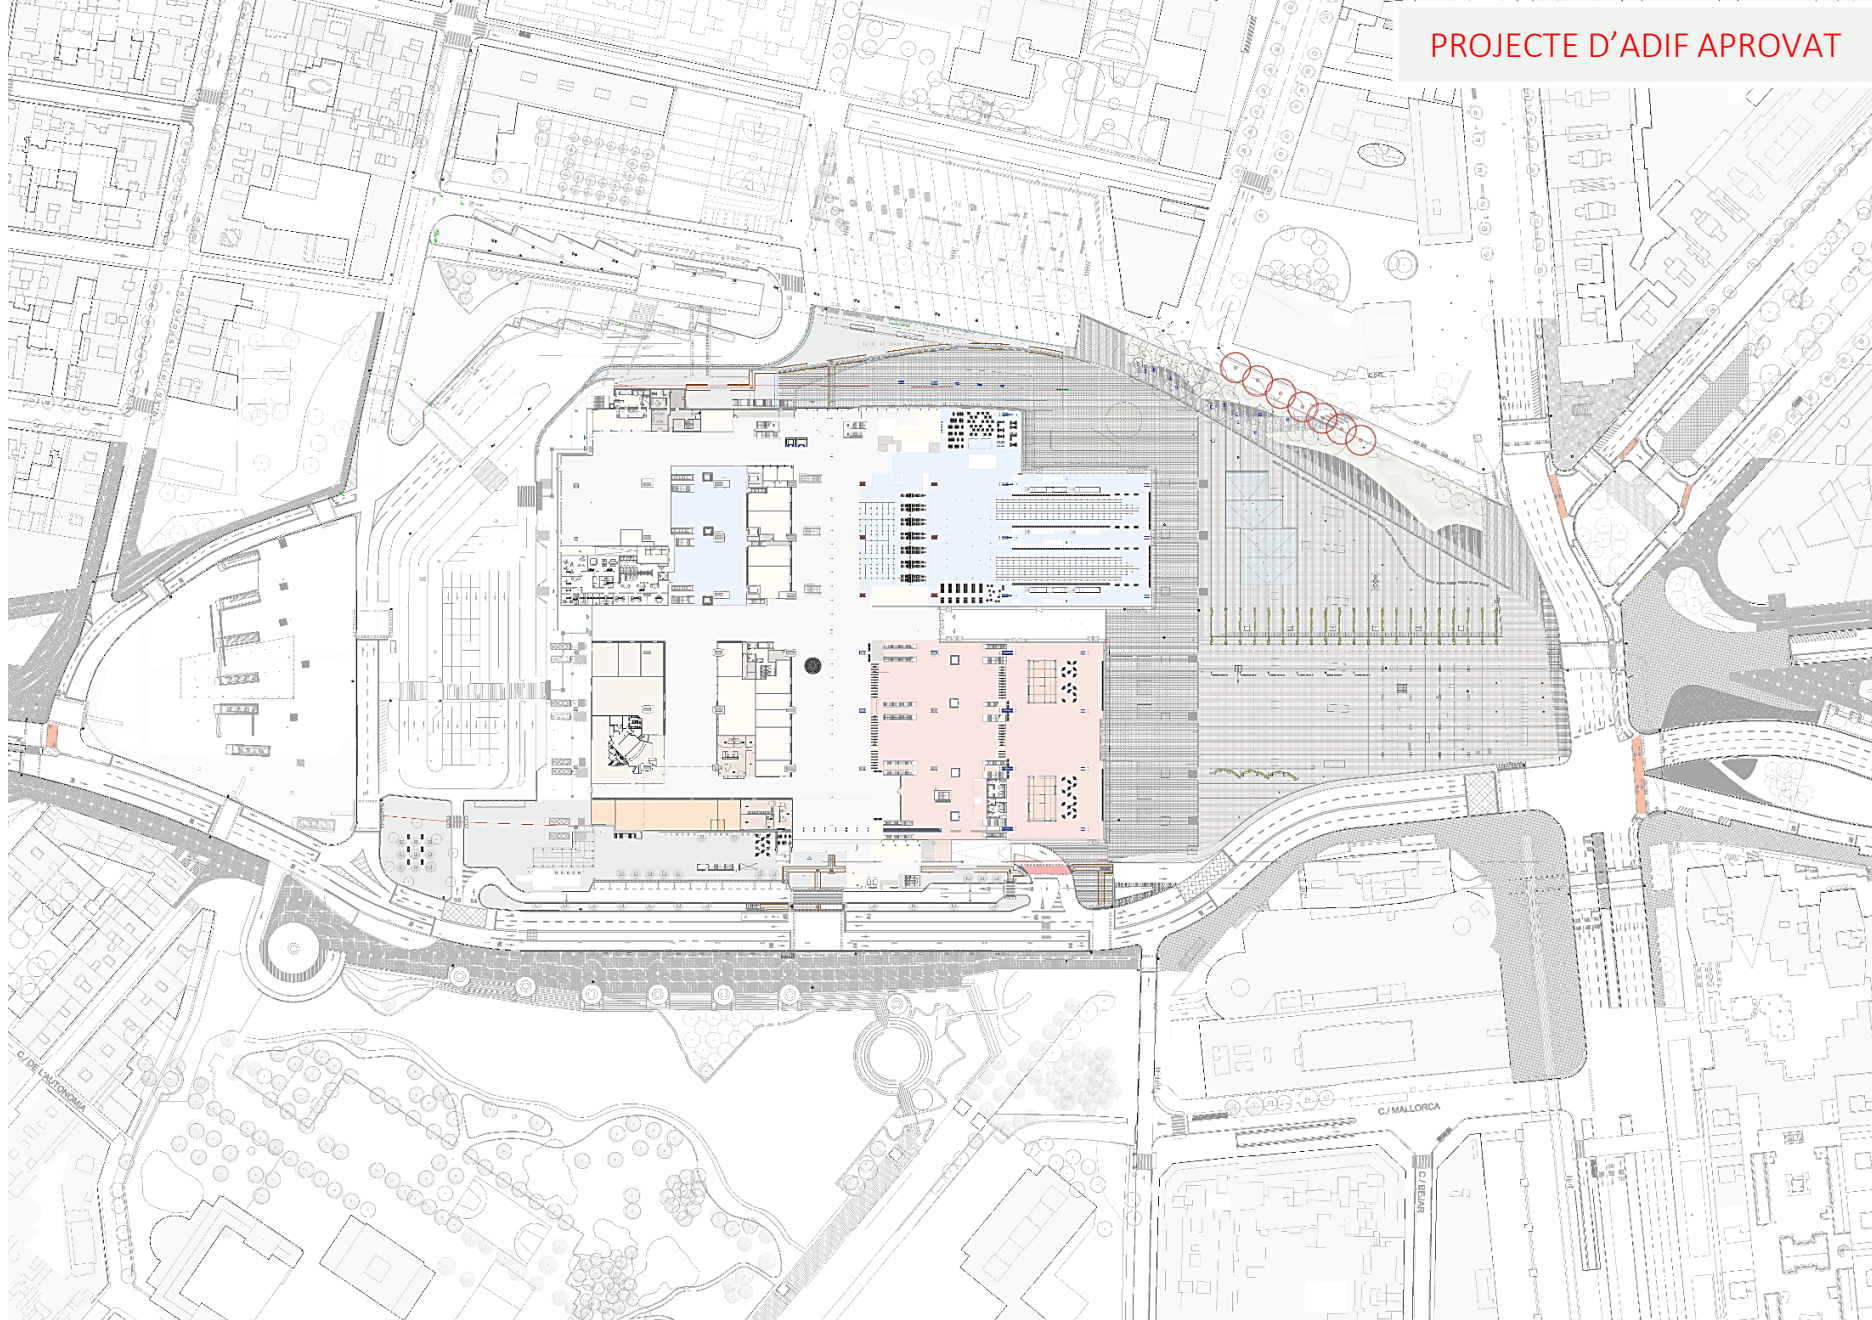

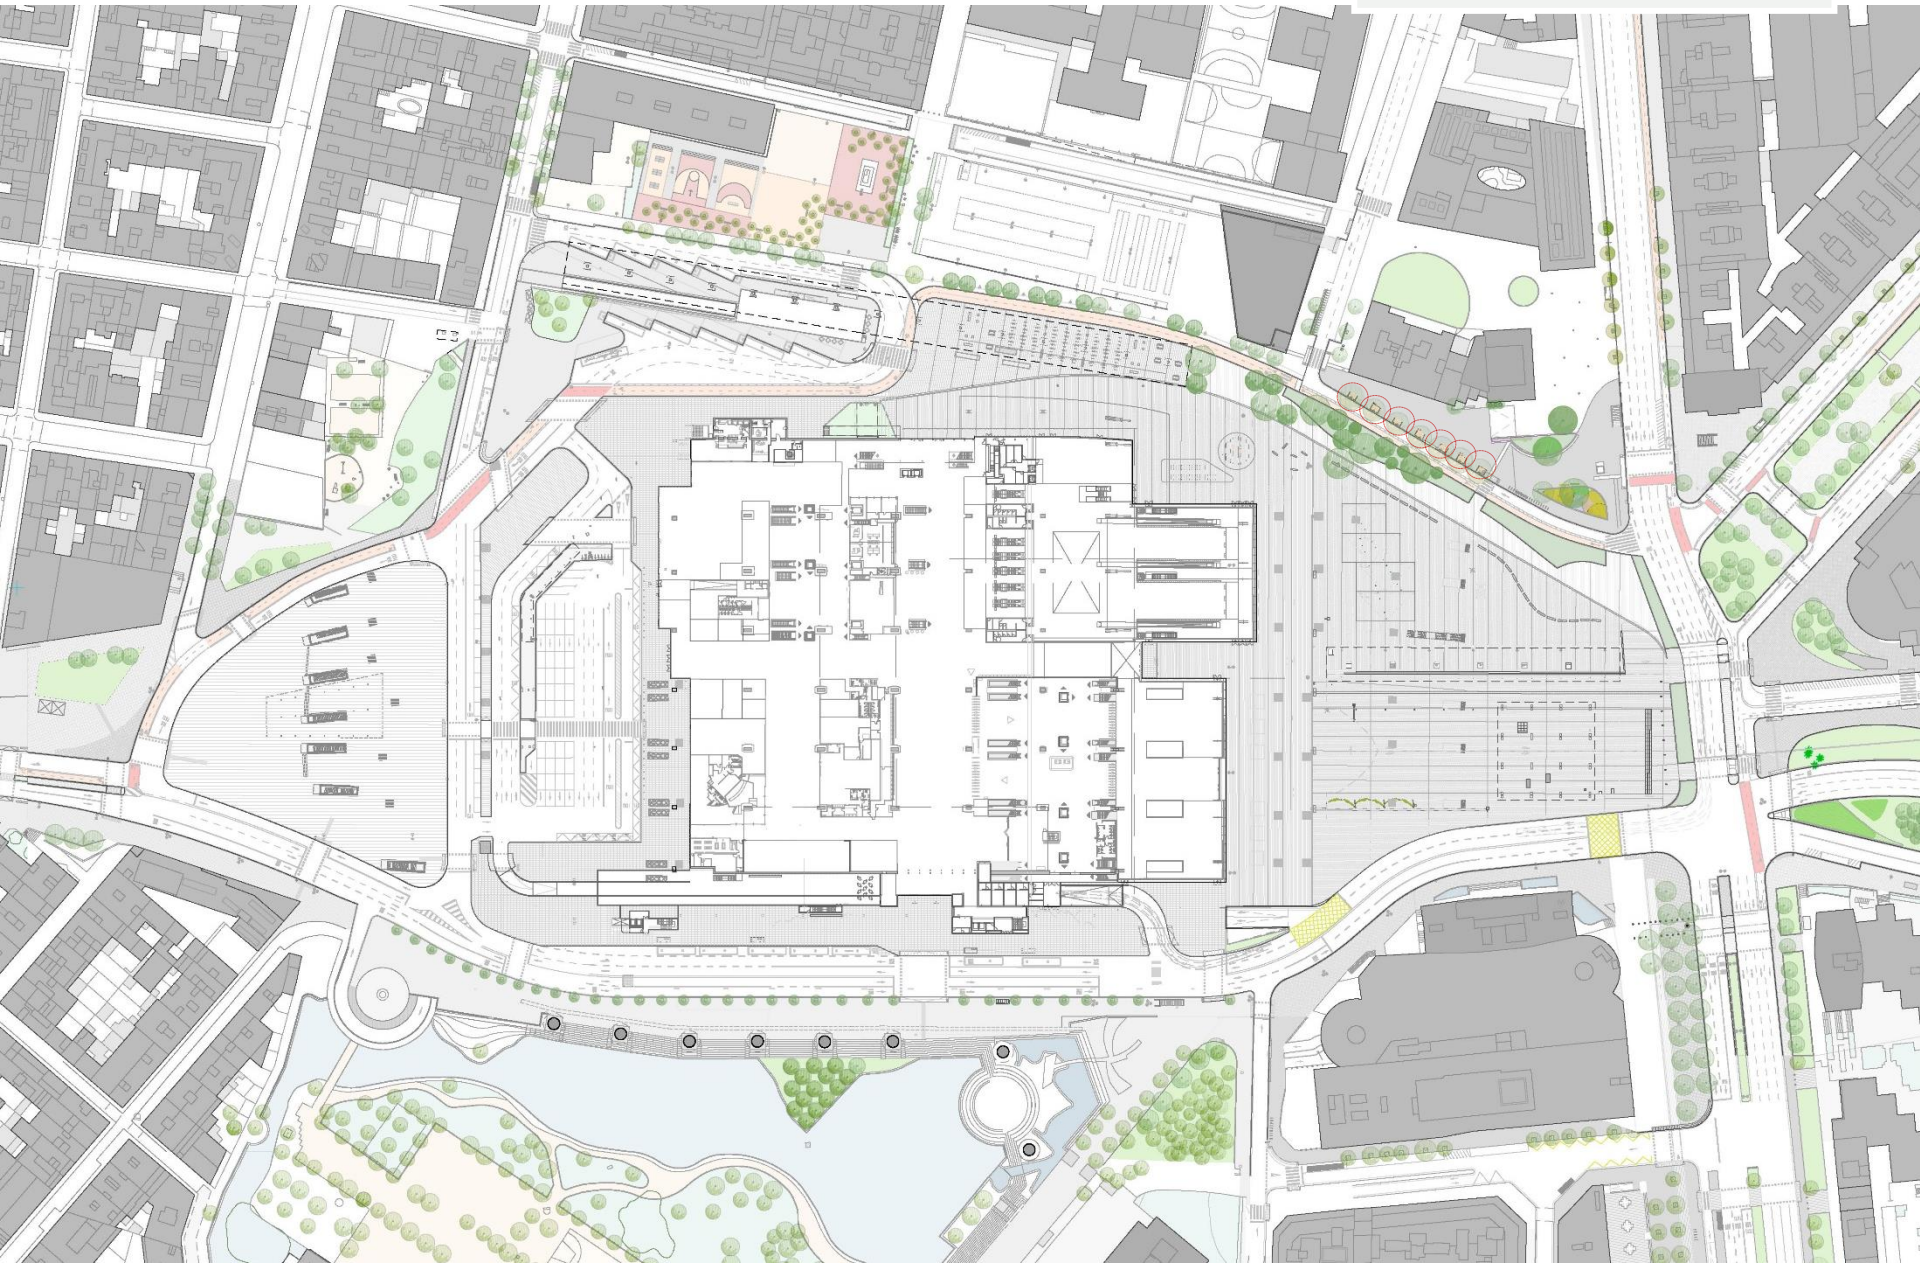

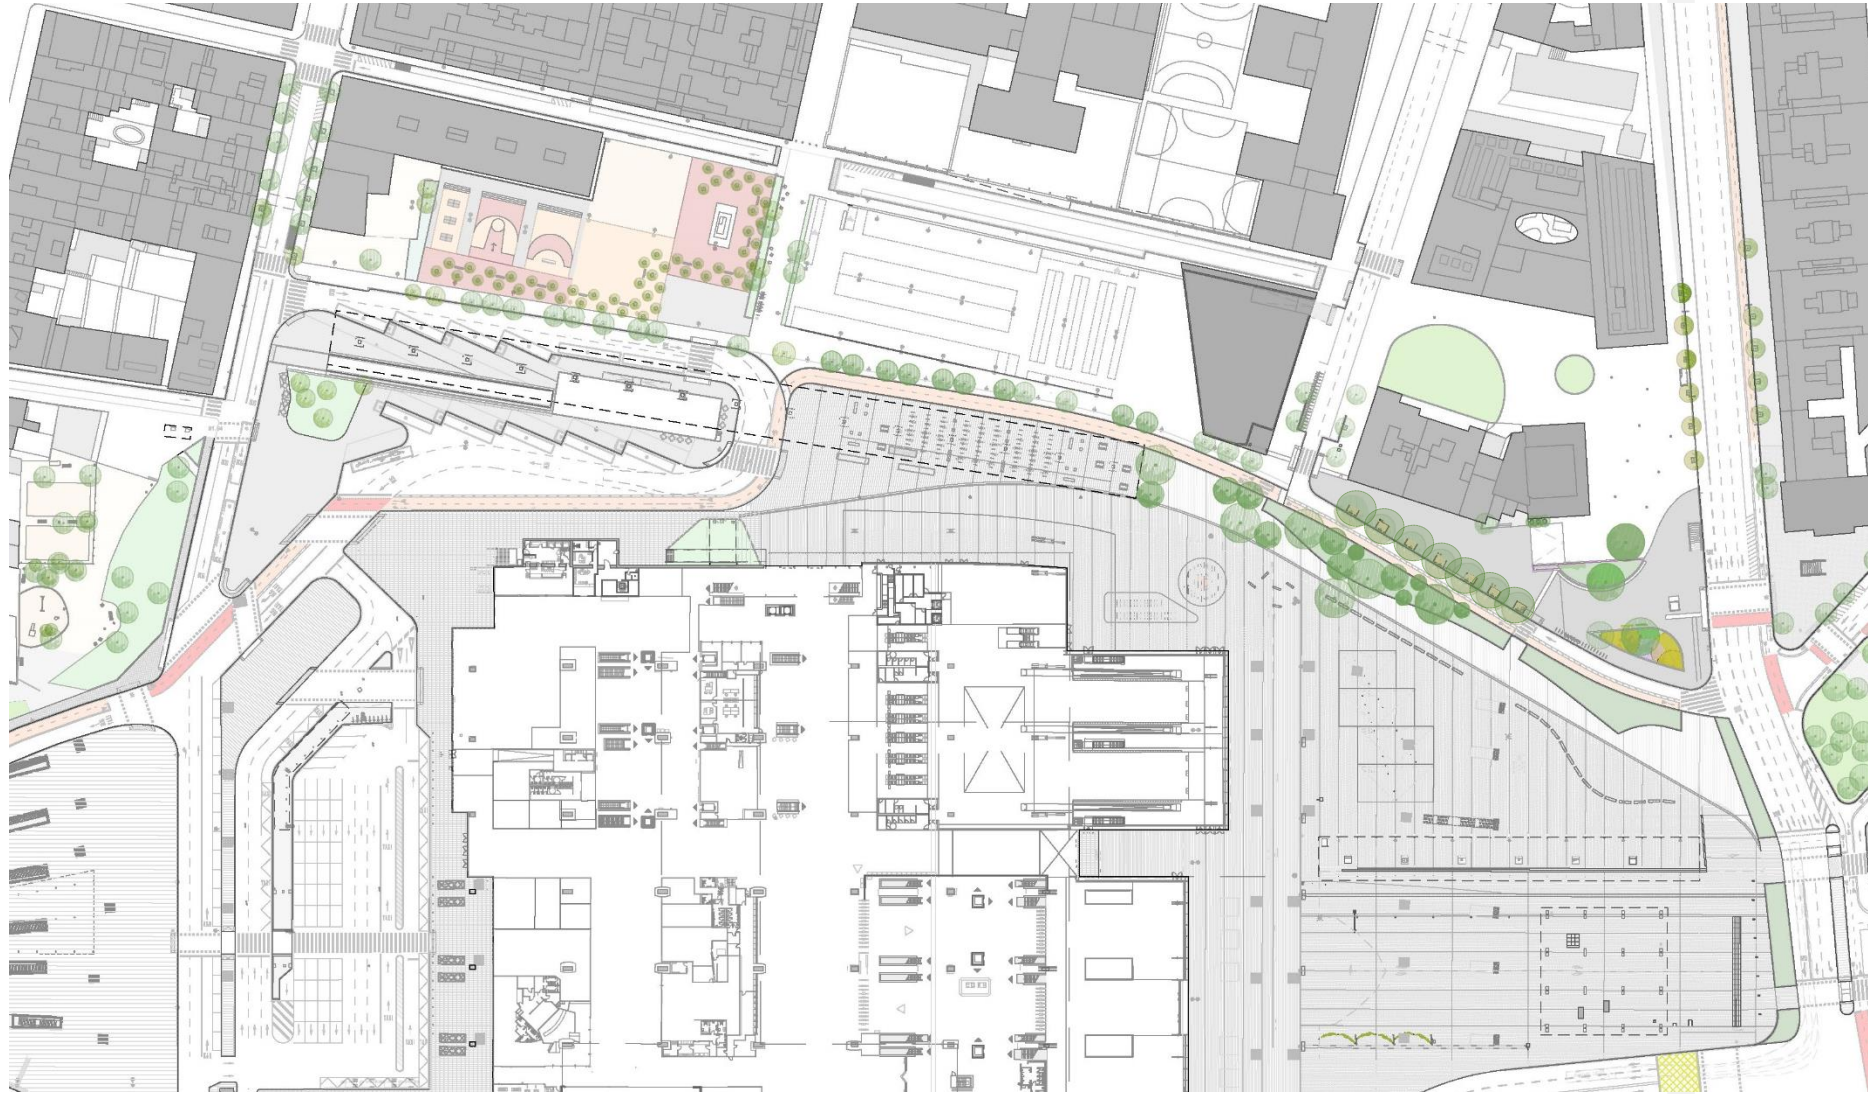

# 04

## **Seguiment de les obres d'Adif: Fase 1**



**OBRAS DE REORDENACIÓN Y TRANSFORMACIÓN:**

**1. EDIFICIO DE VIAJES DE LA ESTACIÓN DE BARCELONA SANTS. FASE 1**

**2. PLAZA PAÏSOS CATALANS**

**3. ENTORNOS**

**COMISIÓN DE SEGUIMIENTO OCTUBRE 2025**




# INDICE

1. Introducción
2. Plan de obra original
3. Nuevo Plan de obra
4. Estado a partir de octubre

# 1. INTRODUCCIÓN

OBRAS DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REORDENACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL EDIFICIO DE VIAJEROS DE LA ESTACIÓN DE BARCELONA SANTS

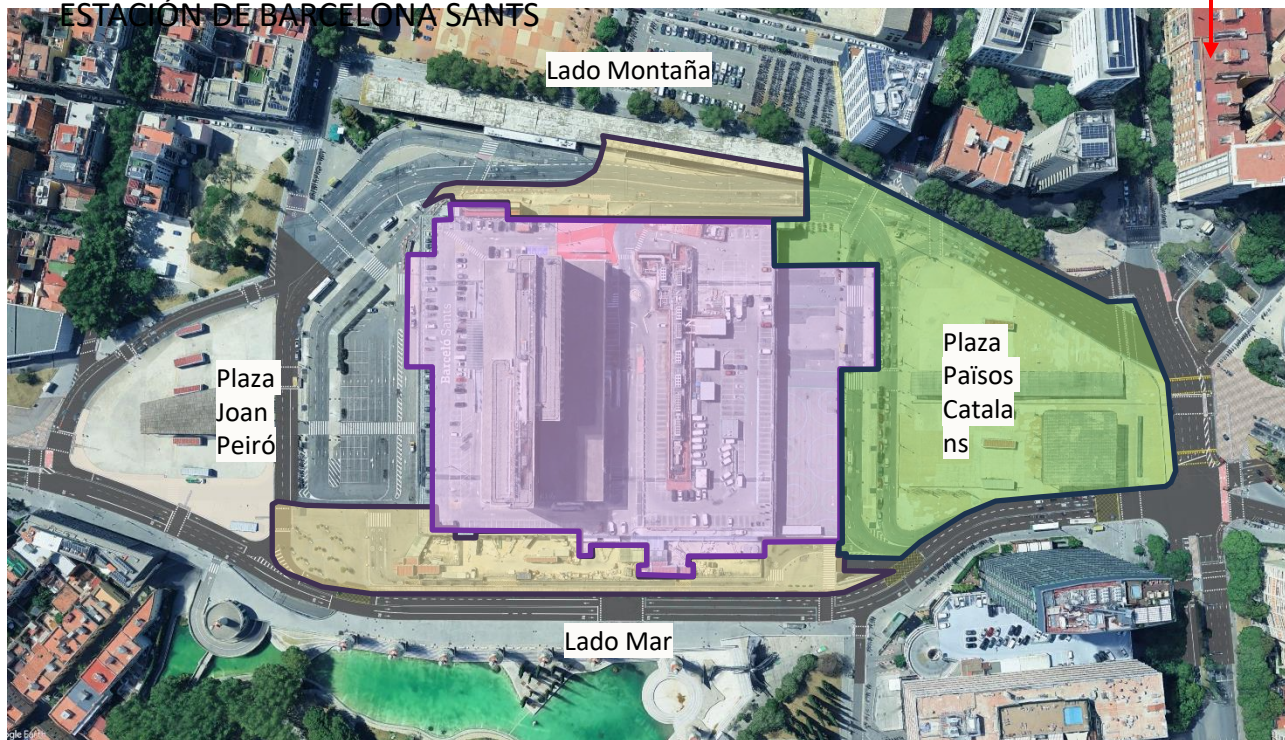

-  PROYECTO Nº1: FASE 1
-  PROYECTO Nº2: PLAZA PAÏSOS CATALANS
-  PROYECTO Nº3: ENTORNOS

# 1. INTRODUCCIÓN

## Fase 1

- Ampliación de vestíbulos
  - Alta Velocidad
  - Rodalies
- Nuevos niveles zona Alta Velocidad
- Nuevos accesos a la estación:  
Apertura eje Mar-Montaña



# 1. INTRODUCCIÓN

## Plaza Països Catalans

- Urbanización de la Plaza
- Recuperación del Proyecto Original



# 1. INTRODUCCIÓN

## Entornos

- Urbanización lado montaña
- Kiss and train lado mar




# 1. INTRODUCCIÓN

|                              | ene-25 | feb-25 | mar-25 | abr-25 | may-25 | jun-25 | jul-25 | ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--|------|--|------|
| <b>FASE 1</b>                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |      |  |      |
| <b>NUEVOS ACCESOS</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |      |  |      |
| <b>AMPLIACIÓN VESTÍBULOS</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |      |  |      |  |      |


|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>PLAZA PAÏSOS CATALANS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ENTORNOS</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# 1. INTRODUCCIÓN

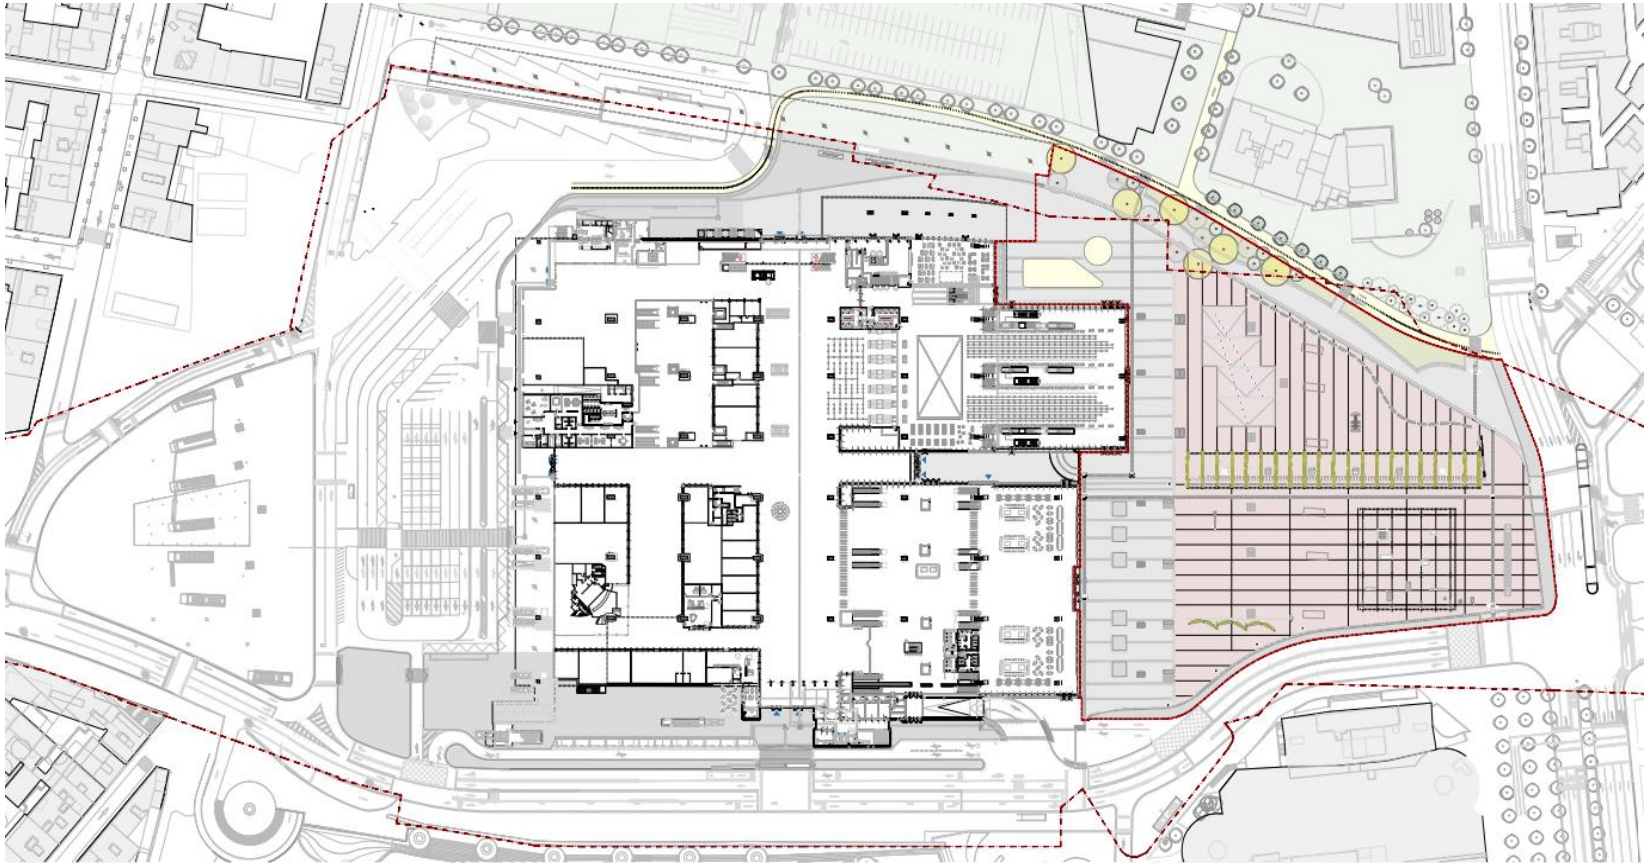

## 2. PLAN DE OBRA ORIGINAL

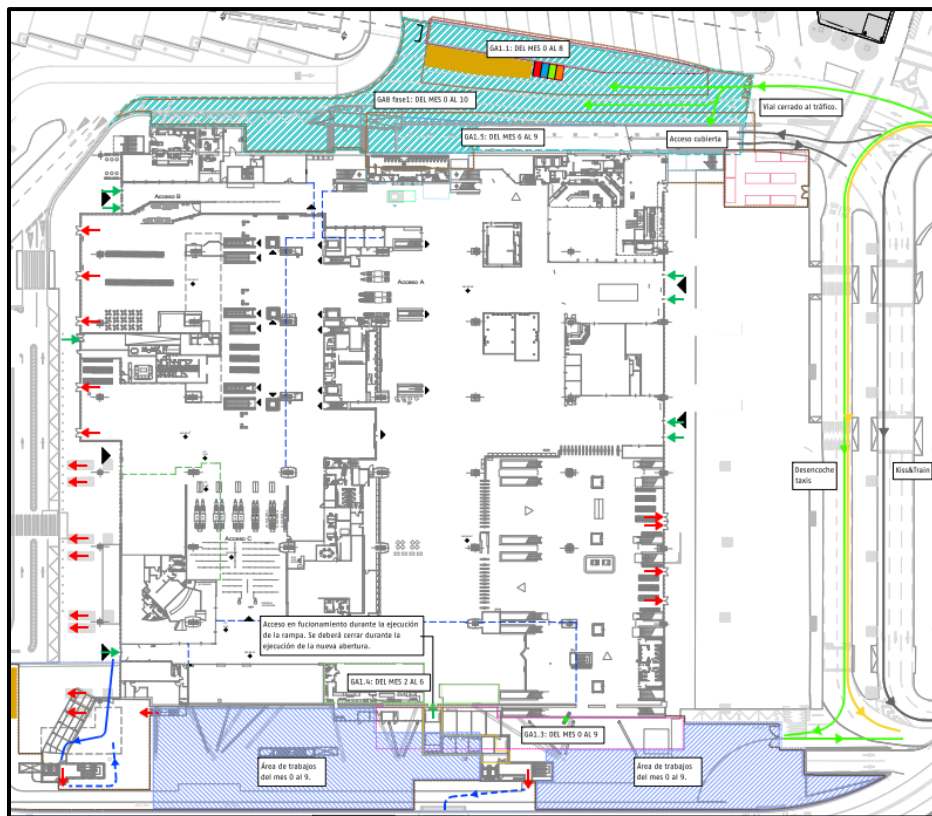

### Enero 2025-Septiembre 2025

- Trabajos en el Edificio:
  - Traslado del personal afectado a Joan Peiró
- Avance de los trabajos en la Plaza:
  - Demoliciones e impermeabilización
  - Sustitución de salidas de emergencia
  - Recuperación de las estructuras originales
- Avance en las obras de entornos:
  - Demoliciones e impermeabilización lado montaña
  - Inicio de la construcción del kiss and train


### 3. NUEVO PLAN DE OBRA



**Octubre 2025- Julio 2026**

- Adelanto ampliación vestíbulo Rodalies
- Mantener acceso peatonal desde Plaça Països
- Ocupación del espacio total de la futura Plaça Països
- Kiss and train provisional en el vial fachada Països
- Avance del resto de la obra:
  - Construcción rampa mar
  - Demolición rampa montaña
  - Apertura de accesos

### 3. ESTADO A PARTIR DE OCTUBRE: OCUPACIONES DE OBRA

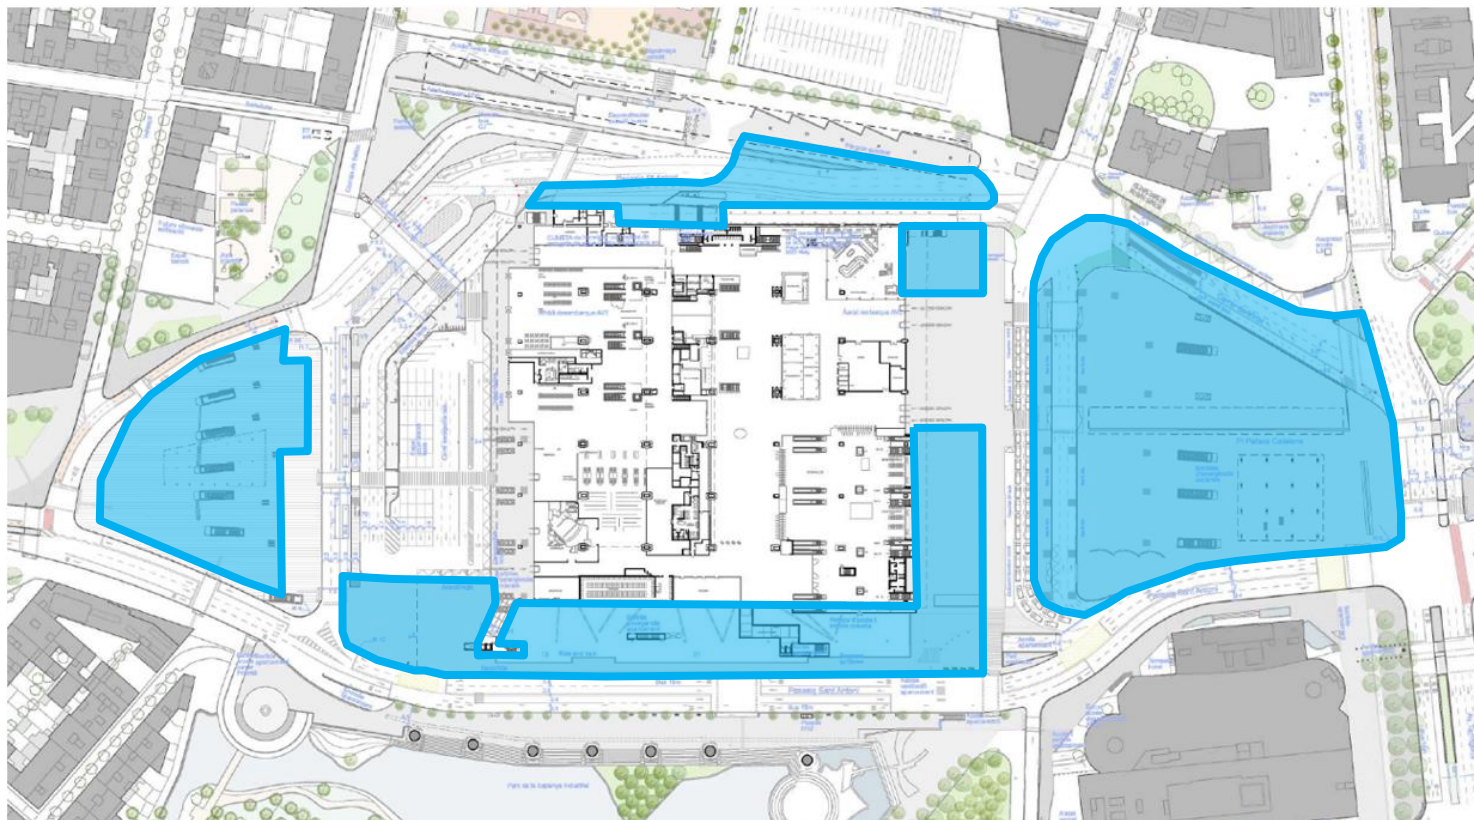

### 3. ESTADO A PARTIR DE OCTUBRE: OCUPACIONES DE OBRA



### 3. ESTADO A PARTIR DE OCTUBRE: CIRCULACIÓN PEATONES



### 3. ESTADO A PARTIR DE OCTUBRE: CIRCULACIÓN VEHÍCULOS



### 3. ESTADO A PARTIR DE OCTUBRE: CIRCULACIÓN AUTOBUSES



### 3. ESTADO A PARTIR DE OCTUBRE: CIRCULACIÓN TAXIS



### 3. ESTADO A PARTIR DE OCTUBRE: CIRCULACIÓN HOTEL



